



# **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**



---

## **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

**PLANES 2017-2024**

AGOSTO DE 2023

---

**SEGEP**



---

## 1 INTRODUÇÃO

---

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do Estado-Maior-Geral (SEGEP) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações a execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da SEGEP/EMG, como uma ferramenta de apoio para fornecimento de subsídios aos ajustes necessários à execução do Plano Estratégico, bem como para melhoria dos processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com gerenciamento de projetos, por intermédio dos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.



## 2 MAPA ESTRATÉGICO



O Mapa Estratégico é uma representação estruturada de forma resumida e visual do PLANES 2017-2024. Tem como principal objetivo criar um fluxo de entendimento de como atingir os objetivos nele descritos. Tendo como premissa a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), apresenta também a construção de nossa cadeia de valor em função das perspectivas do BSC, tendo como cliente a população do DF.





### 3 PROJETOS ESTRATÉGICOS


#### 3.1 Projetos por Tema

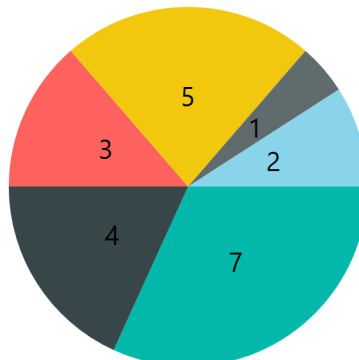

#### 3.2 Projetos por Objetivos



#### 3.3 Projetos por OBM's

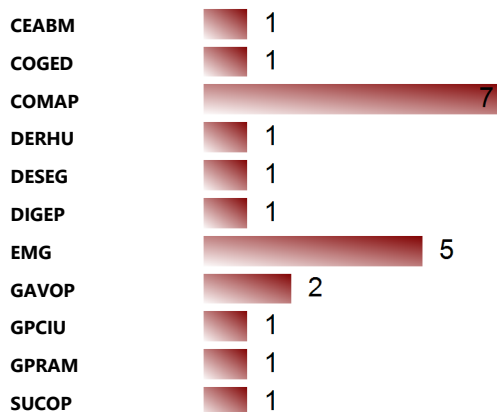




## 4 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os Projetos Estratégicos obtiveram uma execução total de 74.73%. O valor representa a média dos resultados obtidos na execução dos 22 projetos estratégicos. O painel abaixo expõe a realização até 2023, comparada as faixas de avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 80%). Os Projetos Estratégicos do CBMDF, para os anos 2017-2024 estão na faixa amarela, na medição realizada em 9 de Agosto de 2023.

A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está disposto no painel abaixo.

### EXECUÇÃO DOS PROJETOS


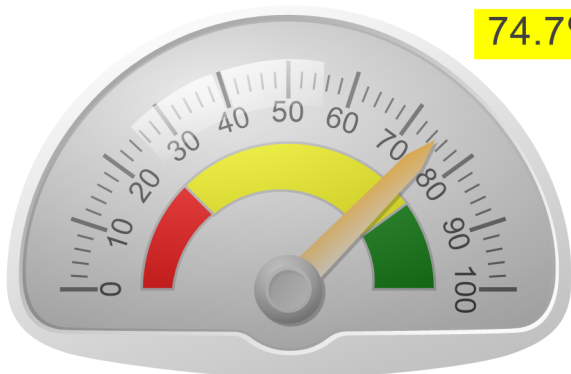


| STATUS DOS PROJETOS |              | TOTAL |
|---------------------|--------------|-------|
| ▶                   | A iniciar    | 1     |
| !                   | Atrasado     | 7     |
| ✓                   | Concluído    | 10    |
| ▶                   | Em andamento | 1     |
|                     | Paralisado   | 3     |
| TOTAL               |              | 22    |




## 4.1 Desempenho dos Projetos Estratégicos por Setor



### 4.1.1 Apoio




### 4.1.2 Assessoramento



### 4.1.3 Direção Geral




### 4.1.4 Direção Setorial






#### 4.1.5 Execução


##### GPCIU - 100.0%




##### GAVOP - 54.1%



##### GPRAM - 90.7%




##### SUCOP - 82.8%



#### 4.1.7 Planejamento

##### EMG - 100.0%



## 4.2 Resultados dos Projetos Estratégicos

Os resultados referentes a cada projeto estratégico estão demonstrados na tabela abaixo.

| PROJETO                                                                                                           | OBM   | ADESÃO À METODOLOGIA | STATUS DO PROJETO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|
| Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate                                                                  | GAVOP | 80.00%               | ⚠ Atrasado (24.40%)     |
| Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal                                                | GPRAM | 60.00%               | ▶ Em andamento (90.71%) |
| Aquisição de um avião de transporte de tropa                                                                      | GAVOP | 40.00%               | ⚠ Atrasado (83.72%)     |
| Atualização do PLANES 2017-2024                                                                                   | EMG   | 100.00%              | ✓ Concluído (100.00%)   |
| Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos | EMG   | 100.00%              | ✓ Concluído (100.00%)   |
| Conscientização contra violência doméstica                                                                        | COGED | 100.00%              | ✓ Concluído (100.00%)   |
| Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente                                                   | COMAP | 100.00%              | ⚠ Atrasado (31.82%)     |
| Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia                                                 | COMAP | 100.00%              | ⚠ Atrasado (86.31%)     |



|                                                                               |       |         |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---------------------|
| Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães                       | COMAP | 80.00%  |   | Paralisado (68.21%) |
| Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede           | COMAP | 80.00%  | ! | Atrasado (0.00%)    |
| Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM                        | COMAP | 80.00%  |   | Paralisado (78.55%) |
| Criação da Fundação 193                                                       | EMG   | 100.00% | ✓ | Concluído (100.00%) |
| Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho      | CEABM | 75.00%  | ▶ | A iniciar (0.00%)   |
| Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa            | EMG   | 100.00% | ✓ | Concluído (100.00%) |
| Implementar a Política de Saúde                                               | DERHU | F2%     | ✓ | Concluído (100.00%) |
| Implementar a Política de Segurança contra Incêndio                           | DESEG | 100.00% | ✓ | Concluído (100.00%) |
| Publicação da Portaria da PTTC                                                | EMG   | 100.00% | ✓ | Concluído (100.00%) |
| Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação | DIGEP | 100.00% | ✓ | Concluído (100.00%) |
| Realizar eventos técnico-científicos                                          | GPCIU | 100.00% | ✓ | Concluído (100.00%) |
| Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências                     | SUCOP | 75.00%  | ! | Atrasado (82.82%)   |
| Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - Gama                             | COMAP | 80.00%  | ! | Atrasado (44.46%)   |
| Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro Militar - Vila Planalto         | COMAP | 80.00%  |   | Paralisado (53.13%) |



---

## **5 DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS**

---

Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a SEGEP /EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 22 projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 completa-se este ciclo estratégico e o percentual máximo atingível é 100% dos projetos realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a data de início e término.



## 5.1 Detalhamento dos Projetos Estratégicos



24.40%

**PROJETO:**

ATRASADO

**Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate**

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's              |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | GAVOP                                                                                  |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/Comb EDUARDO                                                              |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00082852/2019-64                                                                 |

| ETAPAS                                                                                                                        | ATIVIDADES                                                                                                                    | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| DOD                                                                                                                           | DOD                                                                                                                           | CONCLUÍDA | 8/3/2022       | 8/3/2022        |
| ETP                                                                                                                           | ETP                                                                                                                           | CONCLUÍDA | 8/3/2022       | 8/3/2022        |
| PAM                                                                                                                           | PAM                                                                                                                           | CONCLUÍDA | 8/3/2022       | 8/3/2022        |
| Plano de negócios                                                                                                             | Plano de negócios                                                                                                             | CONCLUÍDA | 8/3/2022       | 8/3/2022        |
| Pesquisa de preços                                                                                                            | Pesquisa de preços                                                                                                            | CONCLUÍDA | 10/3/2022      | 10/3/2022       |
| Termo de Referência                                                                                                           | Termo de Referência                                                                                                           | CONCLUÍDA | 11/29/2022     | 11/29/2022      |
| Intrusão processual pela SULIC                                                                                                | Intrusão processual pela SULIC                                                                                                | ATRASADA  | 1/30/2023      | 1/30/2023       |
| Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário                                                                       | Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário                                                                       | ATRASADA  | 2/6/2023       | 2/6/2023        |
| Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI | Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI | ATRASADA  | 2/13/2023      | 2/13/2023       |
| Elaboração da minuta de edital pelo pregoeiro, encaminhando para ASJUR                                                        | Elaboração da minuta de edital pelo pregoeiro, encaminhando para ASJUR                                                        | ATRASADA  | 4/13/2023      | 4/13/2023       |
| Avaliação da minuta de edital pela ASJUR para encaminhamento a Procuradoria Geral do DF                                       | Avaliação da minuta de edital pela ASJUR para encaminhamento a Procuradoria Geral do DF                                       | ATRASADA  | 4/27/2023      | 4/27/2023       |
| Análise da PGDF                                                                                                               | Análise da PGDF                                                                                                               | ATRASADA  | 7/24/2023      | 7/24/2023       |
| Despacho do Comando Geral e encaminhamento a COPLI para prosseguimento                                                        | Despacho do Comando Geral e encaminhamento a COPLI para prosseguimento                                                        | ATRASADA  | 7/31/2023      | 7/31/2023       |
| Elaboração do edital pelo pregoeiro                                                                                           | Elaboração do edital pelo pregoeiro                                                                                           | ATRASADA  | 8/7/2023       | 8/7/2023        |
| Envio do extrato de publicação do aviso de abertura de licitação                                                              | Envio do extrato de publicação do aviso de abertura de licitação                                                              | A INICIAR | 8/21/2023      | 8/21/2023       |
| Abertura do certame                                                                                                           | Abertura do certame                                                                                                           | A INICIAR | 9/21/2023      | 9/21/2023       |
| Adjudicação e homologação do Pregão                                                                                           | Adjudicação e homologação do Pregão                                                                                           | A INICIAR | 9/26/2023      | 9/26/2023       |
| Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)                                                                       | Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)                                                                       | A INICIAR | 9/28/2023      | 9/28/2023       |



| ETAPAS                                                                                                                                                                             | ATIVIDADES                                                                                                                                                                         | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)                                                                        | Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)                                                                        | A INICIAR | 10/10/2023     | 10/10/2023      |
| Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP                                                                                                       | Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP                                                                                                       | A INICIAR | 10/24/2023     | 10/24/2023      |
| Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP                                                                                                                   | Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP                                                                                                                   | A INICIAR | 11/7/2023      | 11/7/2023       |
| Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)                                                                                  | Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)                                                                                  | A INICIAR | 11/14/2023     | 11/14/2023      |
| Nomeação da comissão executora de contrato                                                                                                                                         | Nomeação da comissão executora de contrato                                                                                                                                         | A INICIAR | 11/16/2023     | 11/16/2023      |
| Adoção dos atos necessários para a abertura de carta de crédito internacional (ou para a antecipação de pagamento pelo CBMDF, mediante a apresentação de de garantia de pagamento) | Adoção dos atos necessários para a abertura de carta de crédito internacional (ou para a antecipação de pagamento pelo CBMDF, mediante a apresentação de de garantia de pagamento) | A INICIAR | 12/14/2023     | 12/14/2023      |
| Entrega do equipamento/material/equipamento                                                                                                                                        | Entrega do equipamento/material/equipamento                                                                                                                                        | A INICIAR | 12/14/2024     | 12/16/2024      |

## ADESÃO À METODOLOGIA

| <div></div> <div>80.00%</div> <div>(8/8/2023)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ITEM           |  | STATUS | ITEM                |  | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|--|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe Gerente |  | ✓      | Existe TAP          |  | ✓      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe EAP     |  | ✓      | PLASE publicado     |  | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Custo estimado |  | ✓      | Reports atualizados |  | ✗      |
| <div><div><div></div><div>SIM</div></div><div><div></div><div>NÃO</div></div><div><div></div><div>NÃO SE APLICA</div></div><div><div></div><div>NÃO APURADO</div></div></div> |                |  |        |                     |  |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/08/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo o referido Projeto passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 095/2020 e foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Eduardo Furquim Freire da Silva.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente, que não efetuou nenhum report.

REPORT DO GERENTE: O gerente anterior efetuou seu último report em 29/11/2022 associado ao terno de referência.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



90.71%

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal**

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's              |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | GPRAM                                                                                  |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | CAP QOBM/Comb MARTINS DA SILVA                                                         |
| <b>PROCESSO SEI</b>           |                                                                                        |

| ETAPAS                                  | ATIVIDADES      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| Compra de Correa laminada para abafador | DOD             | CONCLUÍDA | 3/8/2017       | 4/3/2017        |
|                                         | DFD             | CONCLUÍDA | 4/3/2017       | 6/20/2017       |
|                                         | PAM             | CONCLUÍDA | 6/20/2017      | 10/2/2017       |
| DOD                                     | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 3/8/2017       | 3/11/2017       |
|                                         | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 3/11/2017      | 4/3/2017        |
| DFD                                     | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 4/3/2017       | 5/30/2017       |
|                                         | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 5/30/2017      | 6/20/2017       |
| PAM                                     | Produção de PAM | CONCLUÍDA | 6/20/2017      | 7/10/2017       |
|                                         | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA | 7/10/2017      | 10/2/2017       |
| Compra de Motosserra média              | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                                         | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                                         | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| Compra de Perfurador de Solo            | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                                         | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                                         | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| DOD                                     | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                         | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                                     | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                         | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                                     | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                         | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                                     | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                         | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                                     | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                         | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |



| ETAPAS                          | ATIVIDADES      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| DOD                             | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                 | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                             | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                 | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                             | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                 | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                             | Produção de DOD | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                 | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| DOD                             | Produção DOD    | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/5/2019        |
|                                 | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA | 2/5/2019       | 2/25/2019       |
| Compra de Motopoda              | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                                 | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                                 | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| Compra de Soprador Kawashima    | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                                 | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                                 | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| Compra de Mochila de hidratação | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                                 | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                                 | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| DFD                             | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                                 | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                             | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                                 | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                             | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                                 | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                             | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                                 | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                             | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                                 | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                             | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                                 | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                             | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                                 | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |



| ETAPAS                       | ATIVIDADES      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| DFD                          | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                              | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                          | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                              | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| DFD                          | Produção de DFD | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 4/23/2019       |
|                              | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA | 4/23/2019      | 5/14/2019       |
| Compra de Roupa de Apicultor | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                              | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                              | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| Compra de Motosserra pequena | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                              | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                              | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| Compra de Motosserra grande  | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                              | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                              | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| Compra de Roçadeira          | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                              | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                              | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| Compra de Mangueira Mark3    | DOD             | CONCLUÍDA | 2/1/2019       | 2/25/2019       |
|                              | DFD             | CONCLUÍDA | 2/25/2019      | 5/14/2019       |
|                              | PAM             | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 8/26/2019       |
| PAM                          | Produção de PAM | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                              | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| PAM                          | Produção de PAM | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                              | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| PAM                          | Produção de PAM | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                              | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| PAM                          | Produção de PAM | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                              | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| PAM                          | Produção de PAM | CONCLUÍDA | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                              | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA | 6/3/2019       | 8/26/2019       |



| ETAPAS           | ATIVIDADES      | STATUS       | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| PAM              | Produção de PAM | CONCLUÍDA    | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                  | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA    | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| PAM              | Produção de PAM | CONCLUÍDA    | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                  | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA    | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| PAM              | Produção de PAM | CONCLUÍDA    | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                  | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA    | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| PAM              | Produção de PAM | CONCLUÍDA    | 5/14/2019      | 6/3/2019        |
|                  | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA    | 6/3/2019       | 8/26/2019       |
| DOD              | Produção de DOD | CONCLUÍDA    | 2/1/2020       | 2/5/2020        |
|                  | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA    | 2/5/2020       | 2/26/2020       |
| DFD              | Produção de DFD | CONCLUÍDA    | 2/25/2020      | 4/22/2020       |
|                  | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA    | 4/23/2020      | 5/14/2020       |
| Compra de Facção | DOD             | CONCLUÍDA    | 2/1/2020       | 2/26/2020       |
|                  | DFD             | CONCLUÍDA    | 2/25/2020      | 5/14/2020       |
|                  | PAM             | CONCLUÍDA    | 5/14/2020      | 8/26/2020       |
| PAM              | Produção de PAM | CONCLUÍDA    | 5/14/2020      | 6/3/2020        |
|                  | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA    | 6/3/2020       | 8/26/2020       |
| DOD              | Produção de DOD | CONCLUÍDA    | 2/1/2021       | 2/3/2021        |
|                  | Tramitação DOD  | CONCLUÍDA    | 2/5/2021       | 2/26/2021       |
| Compra de GPS    | DOD             | CONCLUÍDA    | 2/1/2021       | 2/26/2021       |
|                  | DFD             | CONCLUÍDA    | 2/26/2021      | 5/14/2021       |
|                  | PAM             | CONCLUÍDA    | 5/13/2021      | 8/23/2021       |
| DFD              | Produção de DFD | CONCLUÍDA    | 2/26/2021      | 4/26/2021       |
|                  | Tramitação DFD  | CONCLUÍDA    | 4/26/2021      | 5/14/2021       |
| PAM              | Produção de PAM | CONCLUÍDA    | 5/13/2021      | 6/2/2021        |
|                  | Tramitação PAM  | CONCLUÍDA    | 5/31/2021      | 8/23/2021       |
| EPIs Florestal   | EPIs Florestal  | EM ANDAMENTO | 9/12/2022      | 12/31/2024      |



## ADESÃO À METODOLOGIA

| <br>60.00%<br>(8/8/2023) | ITEM           | STATUS             | ITEM                | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                           | Existe Gerente | ✓                  | Existe TAP          | ✗      |
|                                                                                                           | Existe EAP     | ✓                  | PLASE publicado     | —      |
|                                                                                                           | Custo estimado | ✓                  | Reports atualizados | ✗      |
|                                                                                                           |                |                    |                     |        |
| ✓<br>SIM                                                                                                  | ✗<br>NÃO       | —<br>NÃO SE APLICA | !<br>NÃO APURADO    |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/08/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal , inserido no PLANES 2017-2024 e foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 18/06/2022, foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Comb. Neil Martins da Silva.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em andamento conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report ainda remete a 15/06/2023, sem mais atualizações.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, além de estar em conformidade com sua EAP e cronograma. Contudo, não há atualizações por parte do gerente de projeto.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



83.72%

**PROJETO:****ATRASADO****Aquisição de um avião de transporte de tropa**

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's              |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | GAVOP                                                                                  |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/Comb Pimentel                                                             |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00036529/2019-19                                                                 |

| ETAPAS                                                                                                      | ATIVIDADES                                                                                                  | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Plano de Negócio                                                                                            | Plano de Negócio                                                                                            | CONCLUÍDA | 5/14/2020      | 5/14/2020       |
| Termo de Referência                                                                                         | Termo de Referência                                                                                         | CONCLUÍDA | 10/27/2020     | 10/27/2020      |
| Termo de Conferência                                                                                        | Termo de Conferência                                                                                        | CONCLUÍDA | 6/29/2021      | 6/29/2021       |
| Acordo de Cooperação Técnica                                                                                | Acordo de Cooperação Técnica                                                                                | CONCLUÍDA | 12/2/2021      | 12/2/2021       |
| Pesquisa de Preços                                                                                          | Pesquisa de Preços                                                                                          | CONCLUÍDA | 3/29/2022      | 3/30/2022       |
| PAM                                                                                                         | PAM                                                                                                         | CONCLUÍDA | 4/4/2022       | 4/4/2022        |
| Declaração de Orçamento                                                                                     | Declaração de Orçamento                                                                                     | CONCLUÍDA | 6/10/2022      | 6/10/2022       |
| Publicação do Edital                                                                                        | Publicação do Edital                                                                                        | CONCLUÍDA | 8/31/2022      | 8/31/2022       |
| Abertura do certame                                                                                         | Abertura do certame                                                                                         | CONCLUÍDA | 9/1/2022       | 3/31/2023       |
| Inserção do código PARF 2023 pelo EMG                                                                       | Inserção do código PARF 2023 pelo EMG                                                                       | CONCLUÍDA | 2/6/2023       | 2/6/2023        |
| Prazo de 30 dias de publicidade do edital (licitação internacional)                                         | Prazo de 30 dias de publicidade do edital (licitação internacional)                                         | CONCLUÍDA | 2/22/2023      | 3/24/2023       |
| Adjudicação e homologação do Pregão                                                                         | Adjudicação e homologação do Pregão                                                                         | CONCLUÍDA | 3/24/2023      | 3/31/2023       |
| Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)                                                     | Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)                                                     | CONCLUÍDA | 4/3/2023       | 4/7/2023        |
| Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP) | Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP) | CONCLUÍDA | 4/10/2023      | 4/21/2023       |
| Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP                                | Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP                                | CONCLUÍDA | 4/24/2023      | 5/4/2023        |
| Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP                                            | Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP                                            | ATRASADA  | 5/8/2023       | 7/13/2023       |
| Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)           | Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)           | ATRASADA  | 7/14/2023      | 7/25/2023       |
| Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário                                                     | Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário                                                     | ATRASADA  | 7/21/2023      | 7/25/2023       |
| Nomeação da comissão executora de contrato                                                                  | Nomeação da comissão executora de contrato                                                                  | ATRASADA  | 7/26/2023      | 7/28/2023       |
| Entrega do equipamento/material/equipamento                                                                 | Entrega do equipamento/material/equipamento                                                                 | A INICIAR | 11/1/2024      | 11/27/2024      |



## ADESÃO À METODOLOGIA

| <br>40.00%<br>(8/8/2023) | ITEM           | STATUS             | ITEM                | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                           | Existe Gerente | ✓                  | Existe TAP          | ✗      |
|                                                                                                           | Existe EAP     | ✓                  | PLASE publicado     | —      |
|                                                                                                           | Custo estimado | ✗                  | Reports atualizados | ✗      |
|                                                                                                           |                |                    |                     |        |
| ✓<br>SIM                                                                                                  | ✗<br>NÃO       | —<br>NÃO SE APLICA | !<br>NÃO APURADO    |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/08/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de um avião de transporte de tropa , inserido no PLANES 2017-2024 e não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo o referido Projeto passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 195/2020 e foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Noberto Magno Marins Pimentel.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. Contudo, o projeto encontra-se com status ATRASADO em conformidade com suas tarefas e cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 26/06/2023 o gerente de projeto relata a publicado no DODF 36 de 22/02/23 pg 43 e no DOU 37 23/02/23, pg 90.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, porém encontrasse em atraso em conformidade com sua EAP e cronograma.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status ATRASADO.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Atualização do PLANES 2017-2024**

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 04. Consolidar a governança corporativa.                  |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 04.03 Definir política e diretrizes da gestão estratégica |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | EMG                                                       |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | 1º TEN QOBM/Comb DA CÃ,MARA LINHARES                      |
| <b>PROCESSO SEI</b>           |                                                           |

| ETAPAS                                                                                                        | ATIVIDADES                                                                                                    | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Diagnóstico estratégico externo e interno                                                                     | Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários         | CONCLUÍDA | 3/3/2022       | 9/10/2022       |
|                                                                                                               | Elaboração de Matriz SWOT Cruzada                                                                             | CONCLUÍDA | 10/7/2022      | 10/7/2022       |
|                                                                                                               | Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários - COMOP | CONCLUÍDA | 10/7/2022      | 1/13/2023       |
| Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários         | Organização e compilação das matrizes SWOTs elaboradas no CBMDF                                               | CONCLUÍDA | 3/3/2022       | 3/9/2022        |
|                                                                                                               | Elaboração do questionário digital de atualização do PLANES 2017-2024                                         | CONCLUÍDA | 3/12/2022      | 4/18/2022       |
|                                                                                                               | Elaboração e identificação de todas as seções e unidades do CBMDF onde o questionário será respondido         | CONCLUÍDA | 4/19/2022      | 5/24/2022       |
|                                                                                                               | Distribuição do processo para resposta do Questionário Digital                                                | CONCLUÍDA | 5/27/2022      | 7/8/2022        |
|                                                                                                               | Tabulação e consolidação dos dados                                                                            | CONCLUÍDA | 7/25/2022      | 9/10/2022       |
| Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários - COMOP | Organização e compilação das matrizes SWOTs elaboradas no CBMDF                                               | CONCLUÍDA | 10/7/2022      | 1/13/2023       |
| Atualização do PLANES                                                                                         | Proposta de ações para Retirar e/ou substituir iniciativas obsoletas                                          | CONCLUÍDA | 3/11/2023      | 3/13/2023       |
|                                                                                                               | Validar da 12ª Reunião de Governança                                                                          | CONCLUÍDA | 3/15/2023      | 3/15/2023       |
|                                                                                                               | Realizar as alterações no documento word do PLANES                                                            | CONCLUÍDA | 3/23/2023      | 3/23/2023       |
| Publicação da Atualização                                                                                     | Elaboração de Minuta da Nota de Boletim e Envio ao Gabinete                                                   | CONCLUÍDA | 3/23/2023      | 4/6/2023        |
|                                                                                                               | Publicação em BG                                                                                              | CONCLUÍDA | 4/12/2023      | 4/26/2023       |



| ADESÃO À METODOLOGIA                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>100.00%<br>(1/4/2023) | ITEM                                                                                     | STATUS                                                                                             |                                                                                                    |
|                                                                                                            | Existe Gerente                                                                           | ✓                                                                                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                            | Existe EAP                                                                               | ✓                                                                                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                            | Custo estimado                                                                           | —                                                                                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                            | ITEM                                                                                     | STATUS                                                                                             |                                                                                                    |
|                                                                                                            | Existe TAP                                                                               | ✓                                                                                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                            | PLASE publicado                                                                          | —                                                                                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                            | Reports atualizados                                                                      | ✓                                                                                                  |                                                                                                    |
| <br>SIM                   | <br>NÃO | <br>NÃO SE APLICA | <br>NÃO APURADO |

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

18/04/2023  
Atualização publicada no Boletim Geral 073, de 18 de abril de 2023.

Foi feito um questionário com todas as seções do CBMDF o que possibilitou a detecção das iniciativas obsoletas presentes no planejamento estratégico. Aliado a isso, verificou-se quais as iniciativas estratégicas que não possuíam nenhum projeto estratégico, o qua também a tornava obsoleta. Após essa etapa, foi realizada a validação das sugestões do PLANES 2017-2024 pela SEGEF na 12ª Reunião de Governança. Em seguida, foi enviada a versão final para publicação



100.00%

## PROJETO:

CONCLUÍDO

**Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos**

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | 04. Consolidar a governança corporativa.                                                               |
| INICIATIVA ESTRATÉGICA | 04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o desenvolvimento corporativo |
| SETOR RESPONSÁVEL      | EMG                                                                                                    |
| GERENTE RESPONSÁVEL    | TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO                                                            |
| PROCESSO SEI           |                                                                                                        |

| ETAPAS                                                                                                                                          | ATIVIDADES                                                                                | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos nos cursos de formação, especialização e preparatório para oficiais da Corporação | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAO adm                  | CONCLUÍDA | 7/25/2017      | 8/16/2018       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CHO                      | CONCLUÍDA | 3/22/2018      | 4/27/2018       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAEO                     | CONCLUÍDA | 6/20/2018      | 4/17/2023       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CFO                      | CONCLUÍDA | 2/3/2020       | 4/14/2023       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos para o CAO combatente       | CONCLUÍDA | 12/10/2020     | 9/6/2021        |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CPO                      | CONCLUÍDA | 3/23/2022      | 3/21/2023       |
| Elaboração de Videoaulas                                                                                                                        | Elaboração de videoaulas de Gerenciamento de Projetos                                     | CONCLUÍDA | 4/1/2018       | 12/10/2020      |
|                                                                                                                                                 | Elaboração de videoaulas de Gestão de Riscos                                              | CONCLUÍDA | 2/1/2021       | 6/30/2021       |
|                                                                                                                                                 | Elaboração de videoaula de Gestão de Processos                                            | CONCLUÍDA | 3/1/2021       | 3/12/2021       |
|                                                                                                                                                 | Elaboração e publicação de videoaulas a respeito das boas práticas de Governança e Gestão | CONCLUÍDA | 5/20/2021      | 12/19/2022      |
|                                                                                                                                                 | Elaboração de videoaulas de Estratégia                                                    | CONCLUÍDA | 6/21/2021      | 7/9/2021        |

## ADESÃO À METODOLOGIA

|                            |                |                   |                     |        |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------|
| <br>100.00%<br>(5/16/2023) | ITEM           | STATUS            | ITEM                | STATUS |
|                            | Existe Gerente | ✓                 | Existe TAP          | ✓      |
|                            | Existe EAP     | ✓                 | PLASE publicado     | —      |
|                            | Custo estimado | —                 | Reports atualizados | ✓      |
| <br>SIM                    | <br>NÃO        | <br>NÃO SE APLICA | <br>NÃO APURADO     |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



16/05/2023

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o desenvolvimento corporativo

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** Ten-Cel. RRM. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

**REPORT DO SUPERVISOR:** Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de capacitação os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos deve continuar de forma ininterrupta, assim o presente projeto se transforma em processos testados e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Somente por meio de constantes esforços de capacitação nos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios será possível implementar na cultura organizacional do CBMDF os conceitos, legislações e boas práticas relacionadas aos temas estratégicos, conferindo aos nossos militares habilidades e capacidades para atuarem na Administração Pública, instrumentalizando-os para o atual contexto desse segmento, considerando a estrutura do CBMDF e, principalmente, os atores envolvidos no processo de Gestão e Governança.

Status do projeto: concluído.



100.00%

## PROJETO:

CONCLUÍDO

## Conscientização contra violência doméstica

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.                   |
| INICIATIVA ESTRATÉGICA | 09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho |
| SETOR RESPONSÁVEL      | COGED                                                            |
| GERENTE RESPONSÁVEL    | CEL QOBM/Comb CRISTIANE                                          |
| PROCESSO SEI           | N/A                                                              |

| ETAPAS                                           | ATIVIDADES                                                                                                   | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar (GAEPH) | POP sobre atendimento a mulheres vítimas de violência                                                        | CONCLUÍDA | 2/1/2021       | 5/31/2021       |
|                                                  | I Ciclo de Palestras de APH - Violência Doméstica                                                            | CONCLUÍDA | 5/24/2023      | 5/24/2023       |
| Centro de Comunicação Social - CECOM             | Divulgação de vídeo institucional nas redes sociais                                                          | CONCLUÍDA | 2/6/2023       | 2/28/2023       |
| Corregedoria - COGED                             | Palestra sobre os aspectos legais da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e as consequências correcionais | CONCLUÍDA | 5/15/2023      | 5/15/2023       |
|                                                  | Palestra sobre os aspectos sócio-culturais da violência doméstica                                            | CONCLUÍDA | 5/15/2023      | 5/15/2023       |
| Centro de Assistência Bombeiro Militar - CEABM   | Palestra sobre os aspectos psicossociais da violência doméstica: impactos e possibilidades de intervenção    | CONCLUÍDA | 5/15/2023      | 5/15/2023       |

## ADESÃO À METODOLOGIA

| <br>100.00%<br>(5/17/2023) | ITEM           | STATUS            | ITEM                | STATUS |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------|
|                            | Existe Gerente | ✓                 | Existe TAP          | ✓      |
|                            | Existe EAP     | ✓                 | PLASE publicado     | —      |
|                            | Custo estimado | —                 | Reports atualizados | ✓      |
| <br>SIM                    | <br>NÃO        | <br>NÃO SE APLICA | <br>NÃO APURADO     |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



01/06/2023

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Conscientização contra violência doméstica, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.04: Implementar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** Cel. QOBM/Comb. Cristiane Fernandes Simões, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

**REPORT DO SUPERVISOR:** 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Todas as etapas foram concluídas por meio de eventos relevantes e efetivos no combate à violência doméstica cumprindo os prazos estabelecidos no cronograma. Essas atividades relacionadas ao combate da violência doméstica se tornarão uma rotina no CBMDF, assim o tema não está exaurido pela conclusão deste projeto que foi um esforço temporário para a criação de uma cultura voltada ao combate da violência doméstica.

Status do projeto: Concluído.



31.82%

**PROJETO:****ATRASADO****Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente**

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais                 |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | COMAP                                                               |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/RRm GOMES DA SILVA                                     |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00023776/2020-99                                              |

| ETAPAS                                       | ATIVIDADES                               | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Cessão do terreno para construção da unidade | Solicitação aos órgãos do GDF            | CONCLUÍDA | 3/3/2020       | 3/17/2020       |
|                                              | Trâmite processual no GDF                | CONCLUÍDA | 3/17/2020      | 8/31/2020       |
|                                              | Incorporação do terreno à carga do CBMDF | ATRASADA  | 8/31/2020      | 9/30/2020       |
| Início do projeto                            | Abertura de processo administrativo      | CONCLUÍDA | 3/3/2020       | 3/3/2020        |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira       | - PARF                                   | CONCLUÍDA | 3/3/2020       | 5/12/2021       |
|                                              | - Previsão orçamentária                  | CONCLUÍDA | 5/27/2020      | 8/4/2021        |
| 2.4 - Levantamento Arquitetônico             | Levantamento As Built in loco            | CONCLUÍDA | 4/9/2020       | 4/25/2020       |
|                                              | Digitalização de As Built                | CONCLUÍDA | 4/25/2020      | 5/10/2020       |
|                                              | Correções As Built                       | CONCLUÍDA | 5/10/2020      | 5/24/2020       |
| 3 - PN - Programa de Necessidades            | 3.1 - Entrevistas                        | CONCLUÍDA | 4/10/2020      | 11/22/2020      |
|                                              | 3.2 - Levantamento de Demandas           | CONCLUÍDA | 4/11/2020      | 11/25/2020      |
| 4 - EP - Estudo Preliminar                   | Proposta inicial                         | CONCLUÍDA | 4/10/2020      | 5/9/2020        |
|                                              | Nova proposta                            | CONCLUÍDA | 5/10/2020      | 5/31/2020       |
|                                              | Desenvolvimento                          | CONCLUÍDA | 5/31/2020      | 7/1/2020        |
|                                              | Aprovação da proposta                    | CONCLUÍDA | 7/16/2020      | 7/17/2020       |
|                                              | Fechamento da proposta                   | CONCLUÍDA | 7/17/2020      | 8/1/2020        |
|                                              | Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt  | CONCLUÍDA | 8/1/2020       | 8/5/2020        |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira       | - PARF                                   | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
|                                              | - Previsão Orçamentária                  | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira       | - PARF                                   | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
|                                              | - Previsão Orçamentária                  | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
| Início de projetos                           | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira   | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
| Início de projetos                           | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira   | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
| 2 - LV - Levantamentos                       | 2.4 - Levantamento Arquitetônico         | CONCLUÍDA | 4/9/2020       | 5/24/2020       |



| ETAPAS                                                 | ATIVIDADES                                                         | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2 - LV - Levantamentos                                 | 2.1 - TOP - Topografia                                             | CONCLUÍDA | 4/11/2020      | 4/25/2021       |
|                                                        | 2.2 - SDG - Sondagem                                               | CONCLUÍDA | 3/26/2021      | 7/25/2021       |
|                                                        | 2.3 - Concessionárias                                              | ATRASADA  | 5/26/2021      | 8/25/2021       |
| 5 - AP - Anteprojeto                                   | 5.1 - 1º Apresentação                                              | CONCLUÍDA | 4/11/2020      | 9/16/2020       |
|                                                        | 5.2 - 2ª Apresentação                                              | CONCLUÍDA | 9/16/2020      | 3/4/2021        |
|                                                        | Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades                         | CONCLUÍDA | 3/4/2021       | 3/5/2021        |
| - PARF                                                 | Início de projetos                                                 | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
| - PARF                                                 | Início de projetos                                                 | ATRASADA  | 4/11/2020      | 11/25/2021      |
| 5.1 - 1º Apresentação                                  | Revisão                                                            | CONCLUÍDA | 4/11/2020      | 8/20/2020       |
|                                                        | Atendimento                                                        | CONCLUÍDA | 8/20/2020      | 9/16/2020       |
| Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento | Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura    | CONCLUÍDA | 4/17/2020      | 5/16/2020       |
|                                                        | Designação da Comissão Executora do Contrato                       | CONCLUÍDA | 5/17/2020      | 6/13/2020       |
|                                                        | Aprovação dos projetos                                             | ATRASADA  | 6/14/2020      | 4/27/2021       |
|                                                        | Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno            | ATRASADA  | 4/30/2021      | 8/16/2021       |
|                                                        | Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento | ATRASADA  | 8/17/2021      | 12/14/2021      |
| 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica                    | - Legislação urbanística                                           | CONCLUÍDA | 6/2/2020       | 10/30/2021      |
|                                                        | Normas Técnicas e demais aplicáveis                                | CONCLUÍDA | 6/2/2020       | 10/31/2021      |
|                                                        | - Documentação Cadastral o imóvel                                  | ATRASADA  | 6/12/2020      | 1/26/2022       |
| 1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira       | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira                             | CONCLUÍDA | 3/3/2020       | 8/4/2021        |
|                                                        | 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica                                | ATRASADA  | 6/2/2020       | 1/26/2022       |
| 5.2 - 2ª Apresentação                                  | Revisão                                                            | CONCLUÍDA | 9/16/2020      | 9/19/2020       |
|                                                        | Atendimento                                                        | CONCLUÍDA | 9/19/2020      | 3/4/2021        |
| 6 - PL - Projeto Legal                                 | 6.2 - CBMDF - Consulta Prévia                                      | ATRASADA  | 11/27/2020     | 4/18/2021       |
|                                                        | 6.3 - SEGETH / CAP                                                 | ATRASADA  | 4/7/2021       | 10/19/2021      |
|                                                        | COMAER/CINDACTA                                                    | ATRASADA  | 5/28/2021      | 5/28/2021       |
|                                                        | 6.4 - NOVACAP                                                      | ATRASADA  | 6/27/2021      | 11/25/2021      |
|                                                        | 6.5 - CEB                                                          | ATRASADA  | 6/27/2021      | 11/25/2021      |
|                                                        | 6.6 - CAESB                                                        | ATRASADA  | 6/27/2021      | 11/25/2021      |
| INF - Infraestrutura                                   | Captação de Águas de Pluviais                                      | ATRASADA  | 4/28/2021      | 11/25/2021      |
|                                                        | Pavimentação                                                       | ATRASADA  | 4/28/2021      | 11/25/2021      |
| HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias             | HID - Instalações Hidráulicas                                      | ATRASADA  | 4/28/2021      | 9/25/2021       |
|                                                        | SAN - Instalações Sanitárias                                       | ATRASADA  | 4/28/2021      | 8/19/2021       |



| ETAPAS                                     | ATIVIDADES                                      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias | IMP - Impermeabilização                         | ATRASADA  | 7/28/2021      | 9/26/2021       |
| HID - Instalações Hidráulicas              | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 4/28/2021      | 5/26/2021       |
|                                            | Dimensionamento do projeto                      | ATRASADA  | 5/26/2021      | 7/18/2021       |
|                                            | Detalhamento                                    | ATRASADA  | 7/18/2021      | 7/25/2021       |
|                                            | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA  | 7/25/2021      | 8/8/2021        |
|                                            | Implantação (área externa) - edificação no lote | ATRASADA  | 7/31/2021      | 8/19/2021       |
|                                            | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 8/8/2021       | 9/25/2021       |
| MEC - Instalações Mecânicas                | Elevadores                                      | ATRASADA  | 4/28/2021      | 11/25/2021      |
|                                            | ARC - Ar Condicionado                           | ATRASADA  | 4/28/2021      | 9/26/2021       |
| 7 - PE - Projeto Executivo                 | ARQ - Arquitetura e Urbanismo                   | ATRASADA  | 11/27/2020     | 11/25/2021      |
|                                            | INC - Incêndio                                  | ATRASADA  | 2/24/2021      | 1/19/2022       |
|                                            | INF - Infraestrutura                            | ATRASADA  | 4/28/2021      | 11/25/2021      |
|                                            | MEC - Instalações Mecânicas                     | ATRASADA  | 4/28/2021      | 11/25/2021      |
|                                            | HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias      | ATRASADA  | 4/28/2021      | 9/26/2021       |
|                                            | ELE - Instalações Elétricas                     | ATRASADA  | 4/28/2021      | 1/12/2022       |
|                                            | EST - Estrutura                                 | ATRASADA  | 4/28/2021      | 11/7/2021       |
|                                            | FND - Fundações                                 | ATRASADA  | 7/28/2021      | 10/17/2021      |
|                                            | 8.9 - PLO - Planilha Orçamentária               | ATRASADA  | 9/1/2021       | 10/10/2021      |
|                                            | 8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro       | ATRASADA  | 10/10/2021     | 10/24/2021      |
|                                            | 8.13 - MDE - Memorial Descritivo                | ATRASADA  | 10/11/2021     | 11/25/2021      |
|                                            | 8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas | ATRASADA  | 10/12/2021     | 11/25/2021      |
|                                            | 8.12 - MEC - Memória de Cálculo                 | ATRASADA  | 10/13/2021     | 11/25/2021      |
|                                            | 8.14 - Projeto Básico de Licitação              | ATRASADA  | 10/24/2021     | 11/14/2021      |
| EST - Estrutura                            | Estrutura de Concreto Armado                    | ATRASADA  | 4/28/2021      | 11/7/2021       |
|                                            | Estrutura Metálica                              | ATRASADA  | 4/28/2021      | 7/25/2021       |
| Estrutura Metálica                         | Lançamento do sistema                           | ATRASADA  | 4/28/2021      | 7/25/2021       |
| RDL - Rede de Dados Lógicos                | Lançamento do sistema                           | ATRASADA  | 4/28/2021      | 7/25/2021       |
|                                            | Dimensionamento do projeto                      | ATRASADA  | 7/25/2021      | 8/25/2021       |
|                                            | Implantação (área externa) - edificação no lote | ATRASADA  | 7/31/2021      | 8/19/2021       |
|                                            | Detalhamento                                    | ATRASADA  | 8/25/2021      | 9/25/2021       |
|                                            | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA  | 9/25/2021      | 10/17/2021      |
|                                            | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 10/17/2021     | 10/31/2021      |
|                                            | Memoriais                                       | ATRASADA  | 11/10/2021     | 11/17/2021      |



| ETAPAS                        | ATIVIDADES                                      | STATUS     | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ELE - Instalações Elétricas   | RDL - Rede de Dados Lógicos                     | ATRASADA   | 4/28/2021      | 11/17/2021      |
|                               | SON - Sonorização e CFTV                        | ATRASADA   | 4/28/2021      | 10/27/2021      |
|                               | ELE -Sistema Elétrico                           | ATRASADA   | 7/31/2021      | 1/12/2022       |
| ARQ - Arquitetura e Urbanismo | ARQ - Arquitetura                               | ATRASADA   | 11/27/2020     | 11/18/2021      |
|                               | ACE - Acessibilidade                            | ATRASADA   | 4/28/2021      | 11/25/2021      |
|                               | PAI - Paisagismo                                | ATRASADA   | 5/26/2021      | 8/25/2021       |
|                               | Comunicação Visual                              | ATRASADA   | 8/25/2021      | 11/25/2021      |
| INC - Incêndio                | Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico         | ATRASADA   | 2/24/2021      | 1/19/2022       |
|                               | SPDA                                            | ATRASADA   | 7/1/2021       | 11/25/2021      |
| SPDA                          | Dimensionamento SPDA                            | PARALIZADA | 7/1/2021       | 9/30/2021       |
|                               | Caderno de especificações                       | ATRASADA   | 7/7/2021       | 11/25/2021      |
|                               | Quantitativo                                    | ATRASADA   | 9/30/2021      | 11/25/2021      |
| 8 - ART's e RRT's             | Emissão de ART's e RRT's                        | CONCLUÍDA  | 7/10/2021      | 8/10/2021       |
|                               | Pagamento                                       | ATRASADA   | 8/10/2021      | 9/9/2021        |
|                               | Emissão de ART's e RRT's registrada             | ATRASADA   | 9/9/2021       | 9/14/2021       |
| SAN - Instalações Sanitárias  | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA  | 4/28/2021      | 5/9/2021        |
|                               | Dimensionamento do projeto                      | ATRASADA   | 5/9/2021       | 7/18/2021       |
|                               | Detalhamento                                    | ATRASADA   | 7/18/2021      | 7/25/2021       |
|                               | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA   | 7/25/2021      | 8/8/2021        |
|                               | Implantação (área externa) - edificação no lote | ATRASADA   | 7/31/2021      | 8/19/2021       |
|                               | Caderno de especificações                       | ATRASADA   | 8/8/2021       | 8/8/2021        |
| ARC - Ar Condicionado         | Lançamento do sistema                           | PARALIZADA | 4/28/2021      | 5/23/2021       |
|                               | Dimensionamento do projeto                      | ATRASADA   | 5/23/2021      | 7/24/2021       |
|                               | Detalhamento                                    | ATRASADA   | 7/24/2021      | 8/13/2021       |
|                               | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA   | 8/13/2021      | 8/28/2021       |
|                               | Caderno de especificações                       | ATRASADA   | 8/28/2021      | 9/11/2021       |
|                               | Memoriais                                       | ATRASADA   | 9/11/2021      | 9/26/2021       |
| FND - Fundações               | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA  | 7/28/2021      | 8/4/2021        |
|                               | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA  | 8/4/2021       | 8/25/2021       |
|                               | Detalhamento                                    | ATRASADA   | 8/25/2021      | 9/8/2021        |
|                               | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA   | 9/8/2021       | 9/25/2021       |
|                               | Caderno de especificações                       | ATRASADA   | 9/25/2021      | 10/3/2021       |
|                               | Memoriais                                       | ATRASADA   | 10/3/2021      | 10/17/2021      |



| ETAPAS                   | ATIVIDADES                                                             | STATUS     | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ELE - Sistema Elétrico   | Implantação (área externa) - edificação no lote                        | ATRASADA   | 7/31/2021      | 8/19/2021       |
|                          | Lançamento do sistema                                                  | ATRASADA   | 8/12/2021      | 9/25/2021       |
|                          | Dimensionamento do projeto                                             | ATRASADA   | 9/25/2021      | 11/29/2021      |
|                          | Detalhamento                                                           | ATRASADA   | 11/29/2021     | 12/13/2021      |
|                          | Quantitativo do projeto                                                | ATRASADA   | 12/13/2021     | 12/28/2021      |
|                          | Caderno de especificações                                              | ATRASADA   | 12/28/2021     | 1/5/2022        |
|                          | Memoriais                                                              | ATRASADA   | 1/5/2022       | 1/12/2022       |
| PAI - Paisagismo         | Projeto Executivo                                                      | ATRASADA   | 5/26/2021      | 7/25/2021       |
|                          | Caderno de Especificações                                              | ATRASADA   | 7/25/2021      | 8/15/2021       |
|                          | Implantação (área externa) - edificação no lote                        | ATRASADA   | 7/31/2021      | 8/16/2021       |
|                          | Quantitativos                                                          | ATRASADA   | 8/15/2021      | 8/25/2021       |
| ARQ - Arquitetura        | Projeto Executivo                                                      | ATRASADA   | 11/27/2020     | 9/22/2021       |
|                          | Implantação (área externa) - edificação no lote                        | ATRASADA   | 7/31/2021      | 8/16/2021       |
|                          | Detalhamentos                                                          | ATRASADA   | 9/22/2021      | 10/10/2021      |
|                          | Quantitativos                                                          | ATRASADA   | 10/10/2021     | 10/24/2021      |
|                          | Memorial Descritivo                                                    | ATRASADA   | 10/24/2021     | 10/31/2021      |
|                          | Caderno de Especificações                                              | ATRASADA   | 10/31/2021     | 11/18/2021      |
| Lançamento do sistema    | Lançamento do sistema - luminotécnico                                  | CONCLUÍDA  | 8/12/2021      | 9/25/2021       |
|                          | Lançamento do sistema - tomadas gerais                                 | CONCLUÍDA  | 8/12/2021      | 9/25/2021       |
|                          | Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais) | PARALIZADA | 8/12/2021      | 9/25/2021       |
| SON - Sonorização e CFTV | Lançamento do sistema                                                  | ATRASADA   | 4/28/2021      | 7/25/2021       |
|                          | Dimensionamento do projeto                                             | ATRASADA   | 7/25/2021      | 8/25/2021       |
|                          | Detalhamento                                                           | ATRASADA   | 8/25/2021      | 9/25/2021       |
|                          | Quantitativo do projeto                                                | ATRASADA   | 9/25/2021      | 10/6/2021       |
|                          | Caderno de especificações                                              | ATRASADA   | 10/6/2021      | 10/24/2021      |
|                          | Memoriais                                                              | ATRASADA   | 10/24/2021     | 10/27/2021      |
| 9 - PB - Projeto Básico  | Elaboração do PES                                                      | ATRASADA   | 9/1/2021       | 2/11/2022       |
|                          | Encaminhamento para DIMAT                                              | CONCLUÍDA  | 2/12/2022      | 2/13/2022       |
|                          | Acompanhamento do processo                                             | ATRASADA   | 2/13/2022      | 8/6/2022        |
| IMP - Impermeabilização  | Projeto Executivo                                                      | ATRASADA   | 7/28/2021      | 8/25/2021       |
|                          | Quantitativo                                                           | ATRASADA   | 8/25/2021      | 9/12/2021       |
|                          | Caderno de Especificações                                              | ATRASADA   | 9/12/2021      | 9/26/2021       |



| ETAPAS                                  | ATIVIDADES                               | STATUS     | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Estrutura de Concreto Armado            | Lançamento do sistema                    | CONCLUÍDA  | 4/28/2021      | 7/11/2021       |
|                                         | Dimensionamento do projeto               | CONCLUÍDA  | 7/11/2021      | 8/25/2021       |
|                                         | Detalhamento                             | ATRASADA   | 8/25/2021      | 9/25/2021       |
|                                         | Quantitativo do projeto                  | ATRASADA   | 9/25/2021      | 10/10/2021      |
|                                         | Caderno de especificações                | ATRASADA   | 10/10/2021     | 10/24/2021      |
|                                         | Memoriais                                | ATRASADA   | 10/24/2021     | 11/7/2021       |
| Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico | Dimensionamento e Mapa de rota de fuga   | ATRASADA   | 2/24/2021      | 1/19/2022       |
|                                         | Caderno de especificações                | ATRASADA   | 11/18/2021     | 1/19/2022       |
|                                         | Quantitativo                             | ATRASADA   | 11/18/2021     | 1/19/2022       |
| Plano de Recursos                       | Captação                                 | ATRASADA   | 12/17/2021     | 3/15/2022       |
|                                         | Contrapartida                            | ATRASADA   | 3/18/2022      | 3/29/2022       |
| Emissão do alvará de construção         | Emissão do alvará de construção          | PARALIZADA | 2/11/2022      | 5/9/2022        |
| Preparação para edital                  | Pedido de Execução de Serviços - Envio   | CONCLUÍDA  | 2/12/2022      | 3/14/2022       |
|                                         | Projeto Básico                           | ATRASADA   | 3/14/2022      | 3/19/2022       |
|                                         | Projeto Básico - Aprovação               | ATRASADA   | 3/16/2022      | 3/16/2022       |
| Processo Licitatório                    | Elaboração do Edital                     | ATRASADA   | 4/1/2022       | 7/16/2022       |
|                                         | Edital de Licitação publicado            | ATRASADA   | 7/17/2022      | 7/26/2022       |
|                                         | Divulgação do edital de Licitação        | ATRASADA   | 7/29/2022      | 8/29/2022       |
|                                         | Habilitação dos Licitantes               | ATRASADA   | 8/30/2022      | 9/29/2022       |
|                                         | Julgamento da proposta                   | ATRASADA   | 9/30/2022      | 10/16/2022      |
|                                         | Homologação e Adjudicação ao vencedor    | ATRASADA   | 10/17/2022     | 10/24/2022      |
|                                         | Contratação da empresa executora da obra | ATRASADA   | 10/25/2022     | 11/15/2022      |
| Processo Licitatório                    | Abertura de processo licitatório         | ATRASADA   | 4/5/2022       | 4/5/2022        |
|                                         | Edital                                   | ATRASADA   | 4/9/2022       | 4/9/2022        |
|                                         | Definição da modalidade de licitação     | ATRASADA   | 4/13/2022      | 4/13/2022       |
|                                         | Aprovação do setor jurídico              | ATRASADA   | 5/1/2022       | 5/1/2022        |
|                                         | Edital - Publicação                      | ATRASADA   | 5/11/2022      | 5/11/2022       |
|                                         | Julgamento das propostas                 | ATRASADA   | 6/11/2022      | 6/11/2022       |
|                                         | Adjudicação do vencedor da licitação     | ATRASADA   | 6/13/2022      | 6/13/2022       |
| Ritos iniciais - Execução Contratual    | Assinatura do Contrato                   | ATRASADA   | 6/21/2022      | 6/21/2022       |
|                                         | Comissão Executora - Publicação          | ATRASADA   | 7/1/2022       | 7/2/2022        |
|                                         | Ordem de serviço inicial                 | ATRASADA   | 7/3/2022       | 7/3/2022        |
| Execução da obra                        | Serviços complementares                  | ATRASADA   | 7/13/2022      | 7/13/2023       |



| ETAPAS              | ATIVIDADES                            | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Execução da obra    | Serviços auxiliares e administrativos | ATRASADA  | 7/13/2022      | 7/13/2023       |
|                     | Serviços preliminares                 | ATRASADA  | 7/13/2022      | 3/12/2023       |
|                     | Fundações e estruturas                | ATRASADA  | 7/13/2022      | 2/10/2023       |
|                     | Impermeabilizações                    | ATRASADA  | 10/12/2022     | 5/12/2023       |
|                     | Arquitetura e elementos de urbanismo  | ATRASADA  | 10/12/2022     | 7/13/2023       |
|                     | Instalações hidráulicas e sanitárias  | ATRASADA  | 10/12/2022     | 7/13/2023       |
|                     | Instalações elétricas e eletrônicas   | ATRASADA  | 10/12/2022     | 7/13/2023       |
|                     | Instalações mecânicas e de utilidades | ATRASADA  | 1/10/2023      | 6/12/2023       |
|                     | Proteção contra incêndio e pânico     | ATRASADA  | 1/10/2023      | 6/12/2023       |
|                     | Equipamentos                          | ATRASADA  | 4/27/2023      | 7/13/2023       |
| Licenças Prévias    | Licença ambiental                     | ATRASADA  | 11/18/2022     | 12/16/2022      |
|                     | Licença edilícia                      | ATRASADA  | 12/17/2022     | 1/15/2023       |
| Recebimento da obra | Recebimento provisório                | ATRASADA  | 7/13/2023      | 8/12/2023       |
|                     | Recebimento definitivo                | A INICIAR | 8/12/2023      | 9/12/2023       |
|                     | Habite-se                             | A INICIAR | 9/13/2023      | 11/13/2023      |

## ADESÃO À METODOLOGIA

  
100.00%  
(8/8/2023)

| ITEM           | STATUS | ITEM                | STATUS |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      | Existe TAP          | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      | PLASE publicado     | —      |
| Custo estimado | ✓      | Reports atualizados | ✓      |

|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SIM |  NÃO |  NÃO SE APLICA |  NÃO APURADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/08/2023

Dados de Oficialização do Projeto: Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG N.º 098/20. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial conforme BG n.º 111/2023.

Dados do Gerente Atual: Publicado em BG N.º 228/20 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva em substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes.

Dados de Execução do Projeto: TAP aprovado e publicada no BG N.º 098/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado em conformidade com suas tarefas e cronograma.

Report do Gerente: Último report em 02/08/2023 o gerente de projeto fez seu último report no GPWeb onde é informado a conclusão da tarefa "Trâmite processual no GDF" entre outros.

Análise do Supervisor: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, novos reports foram realizados no GPWeb.

Status do Projeto: ATRASADO no GPWeb.



86.31%

**PROJETO:****ATRASADO****Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia**

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   |                                           |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> |                                           |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | COMAP                                     |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00047244/2019-11                    |

| ETAPAS                                           | ATIVIDADES                              | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Início do projeto                                | Abertura de processo administrativo     | CONCLUÍDA | 5/3/2018       | 5/3/2018        |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                  | CONCLUÍDA | 5/3/2018       | 7/12/2019       |
|                                                  | - Previsão orçamentária                 | CONCLUÍDA | 7/27/2018      | 10/4/2019       |
| 1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira  | CONCLUÍDA | 5/3/2018       | 10/4/2019       |
|                                                  | 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica     | CONCLUÍDA | 8/2/2018       | 3/27/2020       |
| 2.4 - Levantamento Arquitetônico                 | Levantamento As Built in loco           | CONCLUÍDA | 6/9/2018       | 6/25/2018       |
|                                                  | Digitalização de As Built               | CONCLUÍDA | 6/25/2018      | 7/10/2018       |
|                                                  | Correções As Built                      | CONCLUÍDA | 7/10/2018      | 7/24/2018       |
| 3 - PN - Programa de Necessidades                | 3.1 - Entrevistas                       | CONCLUÍDA | 6/10/2018      | 1/22/2019       |
|                                                  | 3.2 - Levantamento de Demandas          | CONCLUÍDA | 6/11/2018      | 1/25/2019       |
| 4 - EP - Estudo Preliminar                       | Proposta inicial                        | CONCLUÍDA | 6/10/2018      | 7/9/2018        |
|                                                  | Nova proposta                           | CONCLUÍDA | 7/10/2018      | 7/31/2018       |
|                                                  | Desenvolvimento                         | CONCLUÍDA | 7/31/2018      | 8/31/2018       |
|                                                  | Aprovação da proposta                   | CONCLUÍDA | 9/15/2018      | 9/16/2018       |
|                                                  | Fechamento da proposta                  | CONCLUÍDA | 9/16/2018      | 10/1/2018       |
|                                                  | Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt | CONCLUÍDA | 10/1/2018      | 10/5/2018       |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                  | ATRASADA  | 6/11/2018      | 1/25/2020       |
|                                                  | - Previsão Orçamentária                 | ATRASADA  | 6/11/2018      | 1/25/2020       |
| Início de projetos                               | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira  | ATRASADA  | 6/11/2018      | 1/25/2020       |
| 2 - LV - Levantamentos                           | 2.4 - Levantamento Arquitetônico        | CONCLUÍDA | 6/9/2018       | 7/24/2018       |
|                                                  | 2.1 - TOP - Topografia                  | CONCLUÍDA | 6/11/2018      | 6/25/2019       |
|                                                  | 2.2 - SDG - Sondagem                    | CONCLUÍDA | 5/26/2019      | 9/24/2019       |
|                                                  | 2.3 - Concessionárias                   | CONCLUÍDA | 7/26/2019      | 10/25/2019      |
| - PARF                                           | Início de projetos                      | ATRASADA  | 6/11/2018      | 1/25/2020       |



| ETAPAS                                     | ATIVIDADES                                      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 5.1 - 1º Apresentação                      | Revisão                                         | CONCLUÍDA | 6/11/2018      | 10/20/2018      |
|                                            | Atendimento                                     | CONCLUÍDA | 10/20/2018     | 11/16/2018      |
| 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica        | - Legislação urbanística                        | CONCLUÍDA | 8/2/2018       | 12/30/2019      |
|                                            | Normas Técnicas e demais aplicáveis             | CONCLUÍDA | 8/2/2018       | 12/31/2019      |
|                                            | - Documentação Cadastral o imóvel               | CONCLUÍDA | 8/12/2018      | 3/27/2020       |
| 5.2 - 2ª Apresentação                      | Revisão                                         | CONCLUÍDA | 11/16/2018     | 11/19/2018      |
|                                            | Atendimento                                     | CONCLUÍDA | 11/19/2018     | 5/4/2019        |
| 6 - PL - Projeto Legal                     | 6.2 - CBMDF - Consulta Prévia                   | CONCLUÍDA | 1/27/2019      | 6/18/2019       |
|                                            | 6.3 - SEGETH / CAP                              | CONCLUÍDA | 6/7/2019       | 12/19/2019      |
|                                            | COMAER/CINDACTA                                 | CONCLUÍDA | 7/28/2019      | 9/6/2019        |
|                                            | CEB                                             | CONCLUÍDA | 5/22/2020      | 7/3/2020        |
| 7 - PE - Projeto Executivo                 | ARQ - Arquitetura e Urbanismo                   | CONCLUÍDA | 1/27/2019      | 1/25/2020       |
|                                            | INC - Incêndio                                  | CONCLUÍDA | 4/26/2019      | 3/20/2020       |
|                                            | INF - Infraestrutura                            | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/25/2020       |
|                                            | MEC - Instalações Mecânicas                     | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/25/2020       |
|                                            | HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias      | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 11/26/2019      |
|                                            | ELE - Instalações Elétricas                     | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 3/13/2020       |
|                                            | EST - Estrutura                                 | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/7/2020        |
|                                            | FND - Fundações                                 | CONCLUÍDA | 9/27/2019      | 12/17/2019      |
|                                            | 8.9 - PLO - Planilha Orçamentária               | CONCLUÍDA | 11/1/2019      | 12/10/2019      |
|                                            | 8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro       | CONCLUÍDA | 12/10/2019     | 12/24/2019      |
|                                            | 8.13 - MDE - Memorial Descritivo                | CONCLUÍDA | 12/11/2019     | 1/25/2020       |
|                                            | 8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas | CONCLUÍDA | 12/12/2019     | 1/25/2020       |
|                                            | 8.12 - MEC - Memória de Cálculo                 | CONCLUÍDA | 12/13/2019     | 1/25/2020       |
|                                            | 8.14 - Projeto Básico de Licitação              | CONCLUÍDA | 12/24/2019     | 1/14/2020       |
| 5 - AP - Anteprojeto                       | 5.1 - 1º Apresentação                           | CONCLUÍDA | 6/11/2018      | 11/16/2018      |
|                                            | 5.2 - 2ª Apresentação                           | CONCLUÍDA | 11/16/2018     | 5/4/2019        |
|                                            | Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades      | CONCLUÍDA | 5/4/2019       | 5/5/2019        |
| INF - Infraestrutura                       | Captação de Águas de Pluviais                   | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/25/2020       |
|                                            | Pavimentação                                    | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/25/2020       |
| HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias | HID - Instalações Hidráulicas                   | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 11/25/2019      |
|                                            | SAN - Instalações Sanitárias                    | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 10/19/2019      |
|                                            | IMP - Impermeabilização                         | CONCLUÍDA | 9/27/2019      | 11/26/2019      |



| ETAPAS                        | ATIVIDADES                                      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| HID - Instalações Hidráulicas | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 7/26/2019       |
|                               | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 7/26/2019      | 9/17/2019       |
|                               | Detalhamento                                    | CONCLUÍDA | 9/17/2019      | 9/24/2019       |
|                               | Quantitativo do projeto                         | CONCLUÍDA | 9/24/2019      | 10/8/2019       |
|                               | Implantação (área externa) - edificação no lote | CONCLUÍDA | 9/30/2019      | 10/19/2019      |
|                               | Caderno de especificações                       | CONCLUÍDA | 10/8/2019      | 11/25/2019      |
| MEC - Instalações Mecânicas   | Elevadores                                      | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/25/2020       |
|                               | ARC - Ar Condicionado                           | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 11/26/2019      |
| EST - Estrutura               | Estrutura de Concreto Armado                    | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/7/2020        |
|                               | Estrutura Metálica                              | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 9/24/2019       |
| Estrutura Metálica            | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 9/24/2019       |
| RDL - Rede de Dados Lógicos   | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 9/24/2019       |
|                               | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 9/24/2019      | 10/25/2019      |
|                               | Implantação (área externa) - edificação no lote | CONCLUÍDA | 9/30/2019      | 10/19/2019      |
|                               | Detalhamento                                    | CONCLUÍDA | 10/25/2019     | 11/25/2019      |
|                               | Quantitativo do projeto                         | CONCLUÍDA | 11/25/2019     | 12/17/2019      |
|                               | Caderno de especificações                       | CONCLUÍDA | 12/17/2019     | 12/31/2019      |
|                               | Memoriais                                       | CONCLUÍDA | 1/10/2020      | 1/17/2020       |
| ELE - Instalações Elétricas   | RDL - Rede de Dados Lógicos                     | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/17/2020       |
|                               | SON - Sonorização e CFTV                        | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 12/27/2019      |
|                               | ELE - Sistema Elétrico                          | CONCLUÍDA | 9/30/2019      | 3/13/2020       |
| ARQ - Arquitetura e Urbanismo | ARQ - Arquitetura                               | CONCLUÍDA | 1/27/2019      | 1/18/2020       |
|                               | ACE - Acessibilidade                            | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 1/25/2020       |
|                               | PAI - Paisagismo                                | CONCLUÍDA | 7/26/2019      | 10/25/2019      |
|                               | Comunicação Visual                              | CONCLUÍDA | 10/25/2019     | 1/25/2020       |
| PAI - Paisagismo              | Projeto Executivo                               | CONCLUÍDA | 7/26/2019      | 9/24/2019       |
|                               | Caderno de Especificações                       | CONCLUÍDA | 9/24/2019      | 10/15/2019      |
|                               | Implantação (área externa) - edificação no lote | CONCLUÍDA | 9/30/2019      | 10/16/2019      |
|                               | Quantitativos                                   | CONCLUÍDA | 10/15/2019     | 10/25/2019      |
| INC - Incêndio                | Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico         | CONCLUÍDA | 4/26/2019      | 3/20/2020       |
|                               | SPDA                                            | CONCLUÍDA | 8/31/2019      | 1/25/2020       |
| SPDA                          | Dimensionamento SPDA                            | CONCLUÍDA | 8/31/2019      | 11/30/2019      |
|                               | Caderno de especificações                       | CONCLUÍDA | 9/6/2019       | 1/25/2020       |



| ETAPAS                       | ATIVIDADES                                      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| SPDA                         | Quantitativo                                    | CONCLUÍDA | 11/30/2019     | 1/25/2020       |
| 8 - ART's e RRT's            | Emissão de ART's e RRT's                        | CONCLUÍDA | 9/9/2019       | 10/10/2019      |
|                              | Pagamento                                       | CONCLUÍDA | 10/10/2019     | 11/9/2019       |
|                              | Emissão de ART's e RRT's registrada             | CONCLUÍDA | 11/9/2019      | 11/14/2019      |
| SAN - Instalações Sanitárias | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 7/9/2019        |
|                              | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 7/9/2019       | 9/17/2019       |
|                              | Detalhamento                                    | CONCLUÍDA | 9/17/2019      | 9/24/2019       |
|                              | Quantitativo do projeto                         | CONCLUÍDA | 9/24/2019      | 10/8/2019       |
|                              | Implantação (área externa) - edificação no lote | CONCLUÍDA | 9/30/2019      | 10/19/2019      |
|                              | Caderno de especificações                       | CONCLUÍDA | 10/8/2019      | 10/8/2019       |
| ARC - Ar Condicionado        | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 7/23/2019       |
|                              | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 7/23/2019      | 9/23/2019       |
|                              | Detalhamento                                    | CONCLUÍDA | 9/23/2019      | 10/13/2019      |
|                              | Quantitativo do projeto                         | CONCLUÍDA | 10/13/2019     | 10/28/2019      |
|                              | Caderno de especificações                       | CONCLUÍDA | 10/28/2019     | 11/11/2019      |
|                              | Memoriais                                       | CONCLUÍDA | 11/11/2019     | 11/26/2019      |
| FND - Fundações              | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 9/27/2019      | 10/4/2019       |
|                              | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 10/4/2019      | 10/25/2019      |
|                              | Detalhamento                                    | CONCLUÍDA | 10/25/2019     | 11/8/2019       |
|                              | Quantitativo do projeto                         | CONCLUÍDA | 11/8/2019      | 11/25/2019      |
|                              | Caderno de especificações                       | CONCLUÍDA | 11/25/2019     | 12/3/2019       |
|                              | Memoriais                                       | CONCLUÍDA | 12/3/2019      | 12/17/2019      |
| ARQ - Arquitetura            | Projeto Executivo                               | CONCLUÍDA | 1/27/2019      | 11/22/2019      |
|                              | Implantação (área externa) - edificação no lote | CONCLUÍDA | 9/30/2019      | 10/16/2019      |
|                              | Detalhamentos                                   | CONCLUÍDA | 11/22/2019     | 12/10/2019      |
|                              | Quantitativos                                   | CONCLUÍDA | 12/10/2019     | 12/24/2019      |
|                              | Memorial Descritivo                             | CONCLUÍDA | 12/24/2019     | 12/31/2019      |
|                              | Caderno de Especificações                       | CONCLUÍDA | 12/31/2019     | 1/18/2020       |
| ELE -Sistema Elétrico        | Implantação (área externa) - edificação no lote | CONCLUÍDA | 9/30/2019      | 10/19/2019      |
|                              | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 10/12/2019     | 11/25/2019      |
|                              | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 11/25/2019     | 1/29/2020       |
|                              | Detalhamento                                    | CONCLUÍDA | 1/29/2020      | 2/12/2020       |
|                              | Quantitativo do projeto                         | CONCLUÍDA | 2/12/2020      | 2/27/2020       |



| ETAPAS                                  | ATIVIDADES                                                             | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| ELE -Sistema Elétrico                   | Caderno de especificações                                              | CONCLUÍDA | 2/27/2020      | 3/6/2020        |
|                                         | Memoriais                                                              | CONCLUÍDA | 3/6/2020       | 3/13/2020       |
| Lançamento do sistema                   | Lançamento do sistema - luminotécnico                                  | CONCLUÍDA | 10/12/2019     | 11/25/2019      |
|                                         | Lançamento do sistema - tomadas gerais                                 | CONCLUÍDA | 10/12/2019     | 11/25/2019      |
|                                         | Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais) | CONCLUÍDA | 10/12/2019     | 11/25/2019      |
| SON - Sonorização e CFTV                | Lançamento do sistema                                                  | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 9/24/2019       |
|                                         | Dimensionamento do projeto                                             | CONCLUÍDA | 9/24/2019      | 10/25/2019      |
|                                         | Detalhamento                                                           | CONCLUÍDA | 10/25/2019     | 11/25/2019      |
|                                         | Quantitativo do projeto                                                | CONCLUÍDA | 11/25/2019     | 12/6/2019       |
|                                         | Caderno de especificações                                              | CONCLUÍDA | 12/6/2019      | 12/24/2019      |
|                                         | Memoriais                                                              | CONCLUÍDA | 12/24/2019     | 12/27/2019      |
| 9 - PB - Projeto Básico                 | Elaboração do PES                                                      | CONCLUÍDA | 11/1/2019      | 4/12/2020       |
|                                         | Encaminhamento para DIMAT                                              | CONCLUÍDA | 4/13/2020      | 4/14/2020       |
|                                         | Acompanhamento do processo                                             | CONCLUÍDA | 4/14/2020      | 10/5/2020       |
| IMP - Impermeabilização                 | Projeto Executivo                                                      | CONCLUÍDA | 9/27/2019      | 10/25/2019      |
|                                         | Quantitativo                                                           | CONCLUÍDA | 10/25/2019     | 11/12/2019      |
|                                         | Caderno de Especificações                                              | CONCLUÍDA | 11/12/2019     | 11/26/2019      |
| Estrutura de Concreto Armado            | Lançamento do sistema                                                  | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 9/10/2019       |
|                                         | Dimensionamento do projeto                                             | CONCLUÍDA | 9/10/2019      | 10/25/2019      |
|                                         | Detalhamento                                                           | CONCLUÍDA | 10/25/2019     | 11/25/2019      |
|                                         | Quantitativo do projeto                                                | CONCLUÍDA | 11/25/2019     | 12/10/2019      |
|                                         | Caderno de especificações                                              | CONCLUÍDA | 12/10/2019     | 12/24/2019      |
|                                         | Memoriais                                                              | CONCLUÍDA | 12/24/2019     | 1/7/2020        |
| Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico | Dimensionamento e Mapa de rota de fuga                                 | CONCLUÍDA | 4/26/2019      | 3/20/2020       |
|                                         | Caderno de especificações                                              | CONCLUÍDA | 1/18/2020      | 3/20/2020       |
|                                         | Quantitativo                                                           | CONCLUÍDA | 1/18/2020      | 3/20/2020       |
| Preparação para edital                  | Pedido de Execução de Serviços - Envio                                 | CONCLUÍDA | 4/13/2020      | 5/13/2020       |
|                                         | Projeto Básico                                                         | CONCLUÍDA | 5/13/2020      | 5/18/2020       |
|                                         | Projeto Básico - Aprovação                                             | CONCLUÍDA | 5/15/2020      | 5/15/2020       |
| Processo Licitatório                    | Abertura de processo licitatório                                       | CONCLUÍDA | 6/8/2020       | 6/8/2020        |
|                                         | Edital                                                                 | CONCLUÍDA | 6/8/2020       | 7/10/2020       |
|                                         | Aprovação do setor jurídico                                            | CONCLUÍDA | 6/25/2020      | 7/9/2020        |



| ETAPAS                               | ATIVIDADES                            | STATUS       | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Processo Licitatório                 | Definição da modalidade de licitação  | CONCLUÍDA    | 6/25/2020      | 6/25/2020       |
|                                      | Edital - Publicação                   | CONCLUÍDA    | 7/15/2020      | 7/15/2020       |
|                                      | Adjudicação do vencedor da licitação  | CONCLUÍDA    | 8/15/2020      | 8/17/2020       |
|                                      | Julgamento das propostas              | CONCLUÍDA    | 8/15/2020      | 8/17/2020       |
| Aprovação de projeto na CEB          | Aprovação de projeto na CEB           | CONCLUÍDA    | 7/22/2020      | 7/22/2020       |
| Ritos iniciais - Execução Contratual | Assinatura do Contrato                | CONCLUÍDA    | 8/20/2020      | 8/20/2020       |
|                                      | Comissão Executora - Publicação       | CONCLUÍDA    | 8/30/2020      | 8/31/2020       |
|                                      | Alvará de Construção - Emissão        | CONCLUÍDA    | 9/1/2020       | 9/1/2020        |
|                                      | Ordem de serviço inicial              | CONCLUÍDA    | 9/3/2020       | 9/3/2020        |
| Execução da obra                     | Serviços preliminares                 | CONCLUÍDA    | 9/6/2020       | 5/6/2021        |
|                                      | Serviços auxiliares e administrativos | ATRASADA     | 9/11/2020      | 9/11/2021       |
|                                      | Fundações e estruturas                | ATRASADA     | 9/11/2020      | 4/11/2021       |
|                                      | Arquitetura e elementos de urbanismo  | ATRASADA     | 12/11/2020     | 9/11/2021       |
|                                      | Instalações mecânicas e de utilidades | ATRASADA     | 3/11/2021      | 8/11/2021       |
|                                      | Proteção contra incêndio e pânico     | ATRASADA     | 3/11/2021      | 8/11/2021       |
|                                      | Equipamentos                          | ATRASADA     | 6/26/2021      | 9/11/2021       |
|                                      | Impermeabilizações                    | ATRASADA     | 1/6/2023       | 4/17/2023       |
|                                      | Instalações elétricas e eletrônicas   | EM ANDAMENTO | 6/2/2023       | 8/31/2023       |
|                                      | Instalações hidráulicas e sanitárias  | EM ANDAMENTO | 6/15/2023      | 8/31/2023       |
|                                      | Serviços complementares               | EM ANDAMENTO | 6/16/2023      | 9/22/2023       |
| Recebimento da obra                  | Recebimento provisório                | ATRASADA     | 9/11/2021      | 10/11/2021      |
|                                      | Recebimento definitivo                | ATRASADA     | 10/11/2021     | 11/11/2021      |
|                                      | Habite-se                             | ATRASADA     | 11/12/2021     | 1/12/2022       |

## ADESÃO À METODOLOGIA

  
100.00%  
(8/8/2023)

| ITEM           | STATUS |
|----------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      |
| Custo estimado | ✓      |

| ITEM                | STATUS |
|---------------------|--------|
| Existe TAP          | ✓      |
| PLASE publicado     | —      |
| Reports atualizados | ✓      |

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SIM | <br>NÃO | <br>NÃO SE APLICA | <br>NÃO APURADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



08/08/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20. Este projeto encontra-se em acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva em substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 137/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado em conformidade com suas tarefas e cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 26/07/2023 informado sobre o andamento das "Instalações elétricas e eletrônicas".

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e de acompanhamento especial.

STATUS DO PROJETO: ATRASADO no GPWeb.



68.21%

**PROJETO:**

PARALISADO

**Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães**

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais                 |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | COMAP                                                               |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda                           |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00094716/2019-17                                              |

| ETAPAS                              | ATIVIDADES                                                                  | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Início dos trabalhos                | Início dos trabalhos                                                        | CONCLUÍDA | 8/10/2017      | 11/15/2019      |
| Projeto Legal                       | Análise e Cumprimento de Exigências - CAP                                   | CONCLUÍDA | 10/31/2017     | 7/20/2018       |
|                                     | Emissão de ART pelo COMAP                                                   | CONCLUÍDA | 5/25/2018      | 6/4/2018        |
|                                     | Emitir ART para pagamento pelo CBMDF                                        | CONCLUÍDA | 7/17/2018      | 7/23/2018       |
|                                     | Enviar ART e Projeto Legal aprovado para receber Carimbo - CAP              | CONCLUÍDA | 7/17/2018      | 7/24/2018       |
|                                     | ANVISA/VISA                                                                 | CONCLUÍDA | 4/30/2019      | 4/30/2019       |
| Levantamento Preliminar             | Cadastro protocolo CAP                                                      | CONCLUÍDA | 10/31/2017     | 3/20/2018       |
| Contratação de Sondagem             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAAGEM | CONCLUÍDA | 1/11/2018      | 10/31/2018      |
| FASE II - PROJETOS DE ENGENHARIA    | 1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias                         | CONCLUÍDA | 7/18/2018      | 8/15/2018       |
|                                     | 2) ELE - Instalações Elétricas                                              | CONCLUÍDA | 8/15/2018      | 9/3/2018        |
|                                     | 4) ARC - Ar Condicionado                                                    | CONCLUÍDA | 8/28/2018      | 9/3/2018        |
|                                     | 8) INC - Incêndio                                                           | CONCLUÍDA | 8/28/2018      | 8/28/2018       |
|                                     | 3) RDL - Rede de Dados Lógicos                                              | CONCLUÍDA | 9/3/2018       | 9/5/2018        |
|                                     | 5) INF - Infraestruturas                                                    | CONCLUÍDA | 9/5/2018       | 9/10/2018       |
|                                     | 6) EST - Estrutural                                                         | CONCLUÍDA | 9/10/2018      | 10/1/2018       |
| FASE I - ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO | 7) FND - Fundações                                                          | CONCLUÍDA | 10/1/2018      | 10/8/2018       |
|                                     | 1) Projeto executivo                                                        | CONCLUÍDA | 7/18/2018      | 8/14/2018       |
|                                     | 3) MDE - Memorial Descritivo                                                | CONCLUÍDA | 7/19/2018      | 7/27/2018       |
| FASE III - ORÇAMENTO                | 2) CET - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas                      | CONCLUÍDA | 8/13/2018      | 8/31/2018       |
|                                     | 1) Planilha Orçamentária                                                    | CONCLUÍDA | 8/1/2018       | 11/15/2018      |
|                                     | 2) Orçamento                                                                | CONCLUÍDA | 10/1/2018      | 10/10/2018      |
|                                     | 3) Curva ABC                                                                | CONCLUÍDA | 10/10/2018     | 10/10/2018      |
|                                     | 4) BDI - Benefícios e Despesas Indiretas                                    | CONCLUÍDA | 10/10/2018     | 10/10/2018      |



| ETAPAS                                              | ATIVIDADES                            | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| FASE III - ORÇAMENTO                                | 5) CRO - Cronograma Físico Financeiro | CONCLUÍDA | 10/22/2018     | 7/26/2019       |
| 1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias | Projeto HID                           | CONCLUÍDA | 7/18/2018      | 7/31/2018       |
|                                                     | Projeto SAN                           | CONCLUÍDA | 7/30/2018      | 8/7/2018        |
|                                                     | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 8/7/2018       | 8/15/2018       |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 8/7/2018       | 8/15/2018       |
| 2) ELE - Instalações Elétricas                      | Projeto ELE                           | CONCLUÍDA | 8/15/2018      | 8/28/2018       |
|                                                     | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 8/28/2018      | 9/3/2018        |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 8/28/2018      | 9/3/2018        |
| 8) INC - Incêndio                                   | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 8/28/2018      | 8/28/2018       |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 8/28/2018      | 8/28/2018       |
| 4) ARC - Ar Condicionado                            | Projeto ARC                           | CONCLUÍDA | 8/28/2018      | 9/3/2018        |
|                                                     | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 8/30/2018      | 8/31/2018       |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 8/30/2018      | 8/31/2018       |
| 3) RDL - Rede de Dados Lógicos                      | Projeto RDL                           | CONCLUÍDA | 9/3/2018       | 9/5/2018        |
|                                                     | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 9/5/2018       | 9/5/2018        |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 9/5/2018       | 9/5/2018        |
| 5) INF - Infraestruturas                            | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 9/5/2018       | 9/6/2018        |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 9/5/2018       | 9/6/2018        |
|                                                     | Projeto INF                           | CONCLUÍDA | 9/5/2018       | 9/10/2018       |
| 6) EST - Estrutural                                 | Projeto EST                           | CONCLUÍDA | 9/10/2018      | 9/28/2018       |
|                                                     | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 9/27/2018      | 9/28/2018       |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 9/27/2018      | 10/1/2018       |
| 2) Orçamento                                        | - CPU                                 | CONCLUÍDA | 10/1/2018      | 10/1/2018       |
|                                                     | - Planilha (Analítico Sintético)      | CONCLUÍDA | 10/10/2018     | 10/10/2018      |
| 7) FND - Fundações                                  | Projeto FND                           | CONCLUÍDA | 10/1/2018      | 10/5/2018       |
|                                                     | MDE - Memorial Descritivo             | CONCLUÍDA | 10/5/2018      | 10/8/2018       |
|                                                     | MEC - Memória de Cálculo              | CONCLUÍDA | 10/5/2018      | 10/8/2018       |
| FASE IV - LICITAÇÃO                                 | PES - Envio                           | CONCLUÍDA | 8/13/2019      | 9/4/2019        |
|                                                     | Projeto Básico                        | CONCLUÍDA | 9/5/2019       | 9/8/2019        |
|                                                     | Aval da SELOF/EMG                     | CONCLUÍDA | 9/9/2019       | 9/10/2019       |
|                                                     | Projeto Básico - Aprovação            | CONCLUÍDA | 9/11/2019      | 9/22/2019       |
|                                                     | Edital - Juntada de documentação      | CONCLUÍDA | 10/23/2019     | 11/5/2019       |
|                                                     | Declaração de Orçamento               | CONCLUÍDA | 11/6/2019      | 1/29/2020       |



| ETAPAS                              | ATIVIDADES                                     | STATUS     | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FASE IV - LICITAÇÃO                 | Edital - Aprovação da assessoria jurídica      | CONCLUÍDA  | 1/30/2020      | 2/5/2020        |
|                                     | Distribuição de autos - COPLI                  | CONCLUÍDA  | 2/6/2020       | 3/5/2020        |
|                                     | Edital RDC nº 05/2020 - Publicação DODF/DOU    | CONCLUÍDA  | 3/6/2020       | 4/5/2020        |
|                                     | Publicação - Adjudicação da empresa contratada | CONCLUÍDA  | 4/6/2020       | 4/16/2020       |
|                                     | Nota de Empenho                                | CONCLUÍDA  | 4/17/2020      | 4/22/2020       |
|                                     | Contrato - formalização                        | CONCLUÍDA  | 4/28/2020      | 4/28/2020       |
| FASE V - RITO CONTRATUAL PRELIMINAR | Comissão Executora - Publicação                | CONCLUÍDA  | 5/7/2020       | 5/7/2020        |
|                                     | Termo de responsabilidade do executor          | CONCLUÍDA  | 5/15/2020      | 5/15/2020       |
|                                     | Ordem de Serviço - Emissão                     | CONCLUÍDA  | 5/25/2020      | 5/25/2020       |
|                                     | Emissão do Alvará de Construção                | CONCLUÍDA  | 5/28/2020      | 6/20/2020       |
| FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA          | 1ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 5/20/2020      | 7/16/2020       |
|                                     | 2ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 5/20/2020      | 5/20/2020       |
|                                     | 3ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 5/20/2020      | 5/20/2020       |
|                                     | 4ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 5/20/2020      | 5/20/2020       |
|                                     | 4ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 5/20/2020      | 5/20/2020       |
|                                     | 5ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 5/20/2020      | 5/20/2020       |
|                                     | 6ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 12/1/2020      | 12/30/2020      |
|                                     | 7ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 2/1/2021       | 2/28/2021       |
|                                     | 8ª medição                                     | CONCLUÍDA  | 6/14/2021      | 6/30/2021       |
|                                     | 9ª Medição                                     | PARALIZADA | 2/1/2022       | 3/1/2022        |
|                                     | 10ª Medição                                    | PARALIZADA | 1/23/2023      | 1/23/2023       |
|                                     | 11ª Medição                                    | PARALIZADA | 2/1/2023       | 2/2/2023        |
|                                     | 12ª Medição                                    | PARALIZADA | 3/1/2023       | 3/3/2023        |
|                                     | Expiração de prazo de execução                 | CONCLUÍDA  | 7/19/2023      | 7/20/2023       |
|                                     | Levantamento de remanescente de obra           | ATRASADA   | 7/19/2023      | 9/15/2023       |
| FASE VII - RECEBIMENTO DA OBRA      | Recebimento provisório                         | ATRASADA   | 2/27/2021      | 3/15/2024       |
|                                     | Recebimento definitivo                         | A INICIAR  | 3/15/2024      | 4/10/2024       |
|                                     | Habite-se                                      | A INICIAR  | 1/7/2027       | 1/7/2027        |
| Reunião - retomada da obra          | Reunião - retomada da obra                     | CONCLUÍDA  | 7/28/2023      | 7/29/2023       |
| Pedido e plano de retomada          | Pedido e plano de retomada                     | ATRASADA   | 7/29/2023      | 8/3/2023        |



## ADESÃO À METODOLOGIA

| <br>80.00%<br>(7/5/2023) | ITEM           | STATUS             | ITEM                | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                           | Existe Gerente | ✓                  | Existe TAP          | ✓      |
|                                                                                                           | Existe EAP     | ✓                  | PLASE publicado     | —      |
|                                                                                                           | Custo estimado | ✓                  | Reports atualizados | ✗      |
|                                                                                                           |                |                    |                     |        |
| ✓<br>SIM                                                                                                  | ✗<br>NÃO       | —<br>NÃO SE APLICA | !<br>NÃO APURADO    |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição ao MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kín Lie com a nomeação publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do ex gerente, que não efetuou nenhum report. Contudo, Aguardando análise jurídica quanto à minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2020, conforme documento 72438046, processo SEI 00053-00117765/2021-50. Novo cronograma aprovado pela comissão, aguardando o cálculo do reajuste.

REPORT DO GERENTE: Em 20/10/2021, a ex-gerente de projeto, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi retomado e se encontra em atraso, porém em estado bem avançado de execução. Tão logo cesse o motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 5,21% restante da execução.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



0.00%

**PROJETO:****ATRASADO****Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede****OBJETIVO ESTRATÉGICO**

01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

**INICIATIVA ESTRATÉGICA**

01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

**SETOR RESPONSÁVEL**

COMAP

**GERENTE RESPONSÁVEL**

CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA

**PROCESSO SEI**

| ETAPAS                                     | ATIVIDADES                                 | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| EP - Estudos Preliminares                  | Inclusão no Plano de Obras                 | ATRASADA  | 6/1/2023       | 6/7/2023        |
|                                            | Inclusão no PARF                           | ATRASADA  | 6/7/2023       | 6/15/2023       |
|                                            | Programa de Necessidades                   | ATRASADA  | 6/15/2023      | 7/13/2023       |
| ARQ - Arquitetura                          | Anteprojeto                                | ATRASADA  | 7/13/2023      | 8/10/2023       |
|                                            | Projeto Básico/Legal                       | A INICIAR | 8/10/2023      | 11/7/2023       |
|                                            | Projeto Executivo                          | A INICIAR | 11/7/2023      | 1/5/2024        |
| LV - Levantamentos                         | Documentação do Imóvel                     | ATRASADA  | 7/13/2023      | 7/20/2023       |
|                                            | Levantamento Arquitetônico                 | ATRASADA  | 7/13/2023      | 7/27/2023       |
|                                            | TOP - Topografia                           | ATRASADA  | 7/27/2023      | 8/10/2023       |
|                                            | SDG - Sondagem                             | A INICIAR | 11/7/2023      | 11/22/2023      |
| EST - Estrutura                            | Lançamento                                 | A INICIAR | 11/7/2023      | 1/5/2024        |
|                                            | Detalhamento                               | A INICIAR | 1/5/2024       | 3/4/2024        |
| ARC - Ar Condicionado                      | ARC - Ar Condicionado                      | A INICIAR | 1/5/2024       | 2/2/2024        |
| ELE - Elétrica                             | ELE - Elétrica                             | A INICIAR | 1/5/2024       | 4/2/2024        |
| FND - Fundação                             | FND - Fundação                             | A INICIAR | 1/5/2024       | 3/4/2024        |
| HID - Instalações Hidrossanitária          | HID - Instalações Hidrossanitária          | A INICIAR | 1/5/2024       | 4/2/2024        |
| INF - Infraestrutura                       | INF - Infraestrutura                       | A INICIAR | 1/5/2024       | 3/18/2024       |
| IMP - Impermeabilização                    | IMP - Impermeabilização                    | A INICIAR | 3/18/2024      | 4/16/2024       |
| CAB - Cabeamento Estruturado               | CAB - Cabeamento Estruturado               | A INICIAR | 4/2/2024       | 4/30/2024       |
| SON - Sonorização                          | SON - Sonorização                          | A INICIAR | 4/30/2024      | 5/15/2024       |
| PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica | PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica | A INICIAR | 5/15/2024      | 6/13/2024       |
| INC - Incêndio                             | INC - Incêndio                             | A INICIAR | 6/13/2024      | 7/11/2024       |
| Compatibilização                           | Compatibilização                           | A INICIAR | 7/11/2024      | 8/8/2024        |
| PLO - Planilha Orçamentária                | PLO - Planilha Orçamentária                | A INICIAR | 7/11/2024      | 9/5/2024        |
| SEI - Processo da Licitação                | SEI - Processo da Licitação                | A INICIAR | 9/5/2024       | 5/23/2025       |



| ETAPAS                 | ATIVIDADES | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| Execução da Obra - CEC | Medição 01 | A INICIAR | 5/23/2025      | 6/23/2025       |
|                        | Medição 02 | A INICIAR | 6/23/2025      | 7/21/2025       |
|                        | Medição 03 | A INICIAR | 7/21/2025      | 8/18/2025       |
|                        | Medição 04 | A INICIAR | 8/18/2025      | 9/15/2025       |
|                        | Medição 05 | A INICIAR | 9/15/2025      | 10/13/2025      |
|                        | Medição 06 | A INICIAR | 10/13/2025     | 11/10/2025      |
|                        | Medição 07 | A INICIAR | 11/10/2025     | 12/8/2025       |
|                        | Medição 08 | A INICIAR | 12/8/2025      | 1/7/2026        |
|                        | Medição 09 | A INICIAR | 1/7/2026       | 2/4/2026        |
|                        | Medição 10 | A INICIAR | 2/4/2026       | 3/5/2026        |
|                        | Medição 11 | A INICIAR | 3/5/2026       | 4/2/2026        |
|                        | Medição 12 | A INICIAR | 4/2/2026       | 5/4/2026        |
|                        | Medição 13 | A INICIAR | 5/4/2026       | 6/1/2026        |
|                        | Medição 14 | A INICIAR | 6/1/2026       | 6/30/2026       |
|                        | Medição 15 | A INICIAR | 6/30/2026      | 7/28/2026       |
|                        | Medição 16 | A INICIAR | 7/28/2026      | 8/25/2026       |
|                        | Medição 17 | A INICIAR | 8/25/2026      | 9/23/2026       |
|                        | Medição 18 | A INICIAR | 9/23/2026      | 10/22/2026      |
|                        | Medição 19 | A INICIAR | 10/22/2026     | 11/20/2026      |
|                        | Medição 20 | A INICIAR | 11/20/2026     | 12/18/2026      |



80.00%  
(8/9/2023)

| ITEM           | STATUS |
|----------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      |
| Custo estimado | ✓      |

| ITEM                | STATUS |
|---------------------|--------|
| Existe TAP          | ✓      |
| PLASE publicado     | —      |
| Reports atualizados | ✗      |



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



09/08/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 07/07/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira em substituição a MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR embora se considerar o cronograma estipulado em sua EAP deveria estar EM ATRASO.

REPORT DO GERENTE: O gerente anterior e atual gerente não efetuaram nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



78.55%

**PROJETO:**

PARALISADO

**Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM**

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   |                                           |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> |                                           |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | COMAP                                     |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00067499/2017-21                    |

| ETAPAS               | ATIVIDADES                                   | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Projetos             | Estudos sondagem e topografia do terreno     | CONCLUÍDA | 9/1/2012       | 10/31/2012      |
|                      | Projeto arquitetônico                        | CONCLUÍDA | 6/18/2014      | 12/8/2016       |
|                      | Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio  | CONCLUÍDA | 4/7/2017       | 4/10/2017       |
|                      | Projeto Básico                               | CONCLUÍDA | 9/14/2017      | 9/14/2017       |
|                      | Projetos complementares de engenharia        | CONCLUÍDA | 6/14/2020      | 7/24/2020       |
| Processo Licitatório | Elaboração do Edital                         | CONCLUÍDA | 9/15/2017      | 6/27/2019       |
|                      | Edital de Licitação RDC 01/2019 - Publicação | CONCLUÍDA | 6/28/2019      | 6/28/2019       |
|                      | Republicação de Edital RDC 01/2019           | CONCLUÍDA | 10/3/2019      | 10/3/2019       |
|                      | Fracasso de Licitação                        | CONCLUÍDA | 1/9/2020       | 1/9/2020        |
|                      | Julgamento da proposta                       | CONCLUÍDA | 1/9/2020       | 1/9/2020        |
|                      | Edital RDC 01/2019 - Nova abertura           | CONCLUÍDA | 1/21/2020      | 1/21/2020       |
|                      | Ata de sessão pública                        | CONCLUÍDA | 2/11/2020      | 2/11/2020       |
|                      | Homologação e Adjudicação ao vencedor        | CONCLUÍDA | 3/5/2020       | 3/5/2020        |
|                      | Contratação da empresa executora da obra     | CONCLUÍDA | 4/1/2020       | 4/1/2020        |
|                      | Comissão Executora - Designação              | CONCLUÍDA | 4/1/2020       | 4/1/2020        |
| Execução da Obra     | Emissão de Ordem de Serviço                  | CONCLUÍDA | 4/20/2020      | 4/22/2020       |
|                      | Ordem de Serviço Inicial                     | CONCLUÍDA | 4/22/2020      | 4/22/2020       |
|                      | 1ª Medição                                   | CONCLUÍDA | 6/19/2020      | 7/13/2020       |
|                      | 2ª Medição                                   | CONCLUÍDA | 7/22/2020      | 8/17/2020       |
|                      | 3ª Medição                                   | CONCLUÍDA | 8/21/2020      | 9/9/2020        |
|                      | 4ª Medição                                   | CONCLUÍDA | 9/23/2020      | 9/30/2020       |
|                      | 5ª Medição                                   | CONCLUÍDA | 10/27/2020     | 11/10/2020      |
|                      | 6ª Medição                                   | CONCLUÍDA | 12/10/2020     | 12/30/2020      |
|                      | 7ª Medição                                   | CONCLUÍDA | 1/1/2021       | 1/30/2021       |



| ETAPAS                                | ATIVIDADES       | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Execução da Obra                      | 8ª Medição       | CONCLUÍDA | 2/1/2021       | 2/28/2021       |
|                                       | 9ª Medição       | CONCLUÍDA | 3/1/2021       | 3/31/2021       |
|                                       | 10ª Medição      | CONCLUÍDA | 4/1/2021       | 4/30/2021       |
|                                       | 11ª Medição      | ATRASADA  | 5/1/2021       | 5/31/2021       |
|                                       | 12ª Medição      | ATRASADA  | 10/1/2021      | 11/1/2021       |
| Projetos complementares de engenharia | Projeto elétrico | CONCLUÍDA | 6/14/2020      | 7/24/2020       |
| Recebimento da Obra                   | Definitivo       | ATRASADA  | 12/3/2020      | 1/3/2022        |
|                                       | Provisório       | ATRASADA  | 11/2/2021      | 12/2/2021       |
|                                       | Habite-se        | ATRASADA  | 1/4/2022       | 5/2/2022        |

## ADESÃO À METODOLOGIA

| <div></div> <div>80.00%</div> <div>(7/4/2023)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ITEM           |  | STATUS | ITEM                |  | STATUS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|--|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Existe Gerente |  | ✓      | Existe TAP          |  | ✓      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Existe EAP     |  | ✓      | PLASE publicado     |  | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Custo estimado |  | ✓      | Reports atualizados |  | ✗      |
| <div><div>SIM</div><div>NÃO</div><div>NÃO SE APLICA</div><div>NÃO APURADO</div></div> |                |  |        |                     |  |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

04/07/2023

Dados de Oficialização do Projeto: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

Dados do Gerente Atual: 2º Ten. QOBM/Compl. Rafael Rodrigues Martins de Barros publicado no BG N.º 111/2023 em substituição à MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

Dados de Execução do Projeto: Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto encontra-se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 00053-00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA para reinício, para tanto deve ser concluída a análise dos pedidos de aditivos.

Report do Gerente: A gerente do projeto fez seu último report por parte do Gerente foi realizado em 13/02/2023 em que informa que a obra segue paralisada desde 13/04/2021.

Análise do Supervisor: Projeto paralizado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão logo sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.

Status do Projeto: O projeto apresenta o status PARALISADO.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Criação da Fundação 193**

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 03.01 Implantar a fundação de apoio ao CBMDF                   |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | EMG                                                            |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/Comb JEANN                                        |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00055486/2022-76                                         |

| ETAPAS                                                                           | ATIVIDADES                                                               | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Realização de Benchmarking com corporações que implementaram fundações similares | Pesquisa dos CBMs que possuem fundações similares                        | CONCLUÍDA | 3/10/2022      | 3/24/2022       |
|                                                                                  | Captação de informações sobre a criação e funcionamento dessas fundações | CONCLUÍDA | 3/25/2022      | 4/22/2022       |
|                                                                                  | Visita técnica a locais de referência                                    | CONCLUÍDA | 4/25/2022      | 5/16/2022       |
| Definição do melhor modelo para o CBMDF                                          | Definição do melhor modelo para o CBMDF                                  | CONCLUÍDA | 5/17/2022      | 6/21/2022       |
| Criação de proposta de formalização da Fundação de apoio ao CBMDF                | Criação de proposta de formalização da Fundação de apoio ao CBMDF        | CONCLUÍDA | 6/22/2022      | 8/24/2022       |
| Formalização da criação de Fundação de apoio ao CBMDF                            | Formalização da criação de Fundação de apoio ao CBMDF                    | CONCLUÍDA | 8/25/2022      | 9/30/2022       |
| Lançamento oficial da Fundação de apoio ao CBMDF                                 | Lançamento oficial da Fundação de apoio ao CBMDF                         | CONCLUÍDA | 10/3/2022      | 12/6/2022       |

**ADESÃO À METODOLOGIA**

| <div></div> <div>100.00%</div> <div>(4/26/2023)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ITEM           |  | STATUS | ITEM                |  | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|--|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe Gerente |  | ✓      | Existe TAP          |  | ✓      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe EAP     |  | ✓      | PLASE publicado     |  | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Custo estimado |  | ✓      | Reports atualizados |  | ✓      |
| <div><div><div></div><div>SIM</div></div><div><div></div><div>NÃO</div></div><div><div></div><div>NÃO SE APLICA</div></div><div><div></div><div>NÃO APURADO</div></div></div> |                |  |        |                     |  |        |

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

02/05/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Criação da Fundação 193 inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 03.01. Implantar a fundação de apoio ao CBMDF.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRM. PTTC Jeann Wilson Aguiar Cavalcante, nomeado por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Como todas as atividades constantes na EAP foram executadas, o projeto encontra-se concluído, sem ressalvas.

Status do projeto: concluído.



0.00%

## PROJETO:

À INICIAR

## Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.                   |
| INICIATIVA ESTRATÉGICA | 09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho |
| SETOR RESPONSÁVEL      | CEABM                                                            |
| GERENTE RESPONSÁVEL    | CAP QOBM/Compl FAGUNDES QUEIROZ SCHIRMER                         |
| PROCESSO SEI           |                                                                  |

| ETAPAS                                                                        | ATIVIDADES                                                                    | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Constituição de Comissão para realização dos trabalhos                        | Constituição de Comissão para realização dos trabalhos                        | ATRASADA  | 5/8/2023       | 5/26/2023       |
| Estudo das normas e regulamentos relacionados à qualidade de vida no trabalho | Estudo das normas e regulamentos relacionados à qualidade de vida no trabalho | ATRASADA  | 5/29/2023      | 6/9/2023        |
| Desenvolvimento de Minuta de Política de QVT com base nos normativos          | Desenvolvimento de Minuta de Política de QVT com base nos normativos          | ATRASADA  | 6/7/2023       | 6/30/2023       |
| Aprovação e publicação da Política de QVT pelas autoridades competentes       | Aprovação e publicação da Política de QVT pelas autoridades competentes       | ATRASADA  | 7/3/2023       | 7/14/2023       |
| Compilação dos dados das ações/atividades existentes sobre QVT                | Compilação dos dados das ações/atividades existentes sobre QVT                | ATRASADA  | 7/17/2023      | 9/1/2023        |
| Desenvolvimento de Minuta de Programa de QVT                                  | Desenvolvimento de Minuta de Programa de QVT                                  | A INICIAR | 9/4/2023       | 10/6/2023       |
| Aprovação e publicação do Programa de QVT                                     | Aprovação e publicação do Programa de QVT                                     | A INICIAR | 10/9/2023      | 10/27/2023      |

## ADESÃO À METODOLOGIA

| <div></div> <div>75.00%</div> <div>(8/9/2023)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ITEM           |  | STATUS | ITEM                |  | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------|---------------------|--|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe Gerente |  | ✓      | Existe TAP          |  | ✓      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existe EAP     |  | ✓      | PLASE publicado     |  | —      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Custo estimado |  | —      | Reports atualizados |  | ✗      |
| <div><div><div></div><div>SIM</div></div><div><div></div><div>NÃO</div></div><div><div></div><div>NÃO SE APLICA</div></div><div><div></div><div>NÃO APURADO</div></div></div> |                |  |        |                     |  |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

09/08/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 08/05/2023. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Julia Fagundes Queiroz Schirmer.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente, que não efetuou nenhuma informação complementar.

REPORT DO GERENTE: O gerente atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa**

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 05. Aperfeiçoar a gestão                                                 |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 05.02 Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | EMG                                                                      |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO                              |
| <b>PROCESSO SEI</b>           |                                                                          |

| ETAPAS                                                                                                                                          | ATIVIDADES                                                                                 | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Publicação do PLANES 2017-2024 no Boletim Geral                                                                                                 | Publicação do PLANES 2017-2024 no Boletim Geral                                            | CONCLUÍDA | 4/1/2017       | 5/2/2017        |
| Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos nos cursos de formação, especialização e preparatório para oficiais da Corporação | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAO adm                   | CONCLUÍDA | 7/25/2017      | 8/16/2018       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CHO                       | CONCLUÍDA | 3/22/2018      | 4/29/2018       |
|                                                                                                                                                 | Elaboração de videoaulas de Gerenciamento de Projetos                                      | CONCLUÍDA | 4/1/2018       | 12/10/2020      |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAEO                      | CONCLUÍDA | 6/20/2018      | 4/17/2023       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CFO                       | CONCLUÍDA | 2/3/2020       | 4/14/2023       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos para o CAO combatente        | CONCLUÍDA | 12/10/2020     | 9/6/2021        |
|                                                                                                                                                 | Elaboração de videoaulas de Gestão de Riscos                                               | CONCLUÍDA | 2/1/2021       | 6/30/2021       |
|                                                                                                                                                 | Elaboração de videoaula de Gestão de Processos                                             | CONCLUÍDA | 3/1/2021       | 3/12/2021       |
|                                                                                                                                                 | Elaboração e publicação de videoaulas a respeito das boas práticas de Governança e Gestão  | CONCLUÍDA | 5/20/2021      | 12/19/2022      |
|                                                                                                                                                 | Elaboração de videoaulas de Estratégia                                                     | CONCLUÍDA | 6/21/2021      | 7/10/2021       |
|                                                                                                                                                 | Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CPO                       | CONCLUÍDA | 3/23/2022      | 3/21/2023       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                            |           |                |                 |
| Implantação da Governança no CBMDF                                                                                                              | Publicação da Portaria de Criação do Comitê Interno de Governança                          | CONCLUÍDA | 5/1/2019       | 5/29/2019       |
|                                                                                                                                                 | Atualizações da Portaria de Criação do Comitê Interno de Governança                        | CONCLUÍDA | 5/28/2019      | 7/31/2020       |
|                                                                                                                                                 | Realização das reuniões do Comitê Interno de Governança                                    | CONCLUÍDA | 2/3/2020       | 4/28/2023       |
| Divulgação das boas Práticas de Governança e Gestão do site do CBMDF                                                                            | Publicação das atas das reuniões de Gestão de Riscos e Governança em BG e no Site do CBMDF | CONCLUÍDA | 7/5/2019       | 4/20/2023       |
|                                                                                                                                                 | Produzir a estrutura da ABA Governança e Gestão                                            | CONCLUÍDA | 4/30/2021      | 5/5/2021        |
|                                                                                                                                                 | Enviar para a DITIC a estrutura da ABA Governança e Gestão                                 | CONCLUÍDA | 5/6/2021       | 5/7/2021        |
|                                                                                                                                                 | Publicar no SITE a estrutura da ABA Governança e Gestão                                    | CONCLUÍDA | 5/8/2021       | 5/14/2021       |



| ETAPAS                                                                                                      | ATIVIDADES                                                                                                  | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Divulgação das boas Práticas de Governança e Gestão do site do CBMDF                                        | Fazer upload de documentos na estrutura da ABA Governança e Gestão                                          | CONCLUÍDA | 7/1/2021       | 7/13/2021       |
| Realização de palestras e publicação de livro a respeito das boas práticas de governança e Gestão de Riscos | Capacitação em gerenciamento de projetos conforme as boas práticas do PMBOK para o Estado-Maior-Geral (EMG) | CONCLUÍDA | 3/9/2020       | 3/12/2020       |
|                                                                                                             | Publicação de um livro institucional com boas práticas de Governança e Gestão                               | CONCLUÍDA | 3/3/2021       | 7/13/2021       |
|                                                                                                             | Boas Práticas de Gestão de Riscos no CBMDF - Palestra CGDF                                                  | CONCLUÍDA | 5/11/2021      | 6/9/2021        |
|                                                                                                             | Gestão de Riscos Corporativos - 1º Simpósio de Prevenção à Fraude e à Corrupção - SSPDF                     | CONCLUÍDA | 7/5/2021       | 8/31/2021       |
|                                                                                                             | Boas práticas de gestão de riscos implementadas no Corpo de Bombeiros Militar - Fundação Hemocentro         | CONCLUÍDA | 7/16/2021      | 8/18/2021       |
|                                                                                                             | Webinar de Boas Práticas sobre Empreendedorismo Social e Inovação da LIGABOM - Palestra 1 - CBMDF           | CONCLUÍDA | 1/31/2022      | 2/21/2022       |
|                                                                                                             | Palestras de capacitação em BI para CBMBA                                                                   | CONCLUÍDA | 4/3/2023       | 4/6/2023        |
| Implantação da Gestão de Riscos no CBMDF                                                                    | Publicação da Política de Gestão de Riscos do CBMDF                                                         | CONCLUÍDA | 6/12/2019      | 7/31/2019       |
|                                                                                                             | Publicação da portaria de Criação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF                                    | CONCLUÍDA | 6/12/2019      | 7/31/2019       |
|                                                                                                             | Atualização da portaria de Criação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF                                   | CONCLUÍDA | 7/9/2019       | 8/25/2020       |
|                                                                                                             | Atualização da Política de Gestão de Riscos do CBMDF                                                        | CONCLUÍDA | 7/10/2019      | 12/10/2021      |
|                                                                                                             | Realização das reuniões do Comitê de Gestão de Riscos                                                       | CONCLUÍDA | 9/2/2019       | 4/19/2023       |
|                                                                                                             | Implantação da GR no DEALF                                                                                  | CONCLUÍDA | 9/12/2019      | 12/30/2019      |
|                                                                                                             | Implantação da GR no DESEG                                                                                  | CONCLUÍDA | 3/8/2021       | 8/6/2021        |
|                                                                                                             | Implantação da GR na DITIC                                                                                  | CONCLUÍDA | 8/23/2021      | 12/31/2021      |
|                                                                                                             | Implantação da GR no DERHU                                                                                  | CONCLUÍDA | 2/4/2022       | 12/28/2022      |
|                                                                                                             | Implantação da GR no DEPCT                                                                                  | CONCLUÍDA | 1/19/2023      | 4/19/2023       |

## ADESÃO À METODOLOGIA

  
100.00%  
(5/2/2023)

| ITEM           | STATUS |
|----------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      |
| Custo estimado | —      |

| ITEM                | STATUS |
|---------------------|--------|
| Existe TAP          | ✓      |
| PLASE publicado     | —      |
| Reports atualizados | ✓      |

|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SIM |  NÃO |  NÃO SE APLICA |  NÃO APURADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



02/05/2023

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 5.2) Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** Ten-Cel. RRM. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

**REPORT DO SUPERVISOR:** Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa deve se tornar uma constante, assim o presente projeto se transforma em processos testados e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Para a efetiva implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa deve-se tornar uma constante a execução de processos relacionados ao aprimoramento da maturidade institucional no tema e solidificação na cultura organizacional da Corporação.

Status do projeto: concluído.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Implementar a Política de Saúde**

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 09.01 Implementar a Política de Saúde          |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | DERHU                                          |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | CEL QOBM/Méd Friedman                          |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00066636/2022-77                         |

| ETAPAS                                                              | ATIVIDADES                                                                             | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Confecção da política de Saúde                                      | Identificação das áreas impactadas pela política                                       | CONCLUÍDA | 4/28/2022      | 5/25/2022       |
|                                                                     | Levantamento das melhores evidências em prevenção em Saúde                             | CONCLUÍDA | 5/25/2022      | 6/14/2022       |
|                                                                     | Redação da minuta da política de Saúde                                                 | CONCLUÍDA | 6/14/2022      | 6/28/2022       |
| Publicação da política de Saúde                                     | Aprovação da minuta                                                                    | CONCLUÍDA | 6/29/2022      | 7/28/2022       |
|                                                                     | Envio para publicação                                                                  | CONCLUÍDA | 7/29/2022      | 8/29/2022       |
| Implementação de ações baseadas nas diretrizes da política de Saúde | Projeto piloto multidisciplinar de prevenção em saúde aos militares da ativa no 17ºGBM | CONCLUÍDA | 8/30/2022      | 11/25/2022      |
|                                                                     | Produção do relatório do projeto piloto                                                | CONCLUÍDA | 11/28/2022     | 12/28/2022      |

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



100.00%

## PROJETO:

CONCLUÍDO

## Implementar a Política de Segurança contra Incêndio

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes. |
| INICIATIVA ESTRATÉGICA | 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio                           |
| SETOR RESPONSÁVEL      | DESEG                                                                               |
| GERENTE RESPONSÁVEL    | CEL QOBM/Comb ROGÉRIO DUTRA                                                         |
| PROCESSO SEI           |                                                                                     |

| ETAPAS                                      | ATIVIDADES        | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Aprovação e Publicação                      | Análise da ASJUR  | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
|                                             | Análise da Seleg  | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
|                                             | Publicação        | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
| Resposta à demanda do Chefe do Departamento | DIEAP             | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
|                                             | DINVI             | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
|                                             | DIVIS             | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
| Validação das propostas                     | Apresentação      | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
|                                             | Correção          | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |
|                                             | Redação da Minuta | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/8/2023        |

## ADESÃO À METODOLOGIA

  
100.00%  
(6/14/2023)

| ITEM           | STATUS | ITEM                | STATUS |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      | Existe TAP          | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      | PLASE publicado     | —      |
| Custo estimado | —      | Reports atualizados | ✓      |

|     |     |               |             |
|-----|-----|---------------|-------------|
| SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | NÃO APURADO |
|-----|-----|---------------|-------------|

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Publicação da Portaria da PTTC**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.  |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | EMG                                             |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | MAJ QOBM/Compl LEANDRO CHAVES                   |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00023582/2023-36                          |

| ETAPAS                           | ATIVIDADES                       | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Instituição do Grupo de Trabalho | Instituição do Grupo de Trabalho | CONCLUÍDA | 1/31/2023      | 3/14/2023       |
| Minuta da Portaria               | Minuta da Portaria               | CONCLUÍDA | 2/1/2023       | 4/4/2023        |
| Análise da SELEG/EMG             | Análise da SELEG/EMG             | CONCLUÍDA | 4/5/2023       | 5/19/2023       |
| Análise e aprovação da ASJUR     | Análise e aprovação da ASJUR     | CONCLUÍDA | 5/22/2023      | 6/16/2023       |
| Publicação da nova Portaria      | Publicação da nova Portaria      | CONCLUÍDA | 6/19/2023      | 6/30/2023       |

**ADESÃO À METODOLOGIA**  
100.00%  
(7/5/2023)

| ITEM           | STATUS | ITEM                | STATUS |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      | Existe TAP          | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      | PLASE publicado     | —      |
| Custo estimado | —      | Reports atualizados | ✓      |

|     |     |               |             |
|-----|-----|---------------|-------------|
| SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | NÃO APURADO |
|-----|-----|---------------|-------------|

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

21/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Publicação da Portaria da PTTC, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.02: Implementar a Política de Pessoal Inativo.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM Compl. Leandro Chaves da Silva Batista, nomeado por meio do BG 110, de 14 de junho de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto foi concluído dentro do prazo estabelecido no cronograma.

Status do projeto: concluído.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.  |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 09.01 Implementar a Política de Saúde           |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | DIGEP                                           |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | MAJ QOBM/Comb Carolina de Lima Rick de Oliveira |
| <b>PROCESSO SEI</b>           |                                                 |

| ETAPAS                                                                     | ATIVIDADES                                                                 | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Definição do quantitativo de militares da área da saúde a serem convocados | Definição do quantitativo de militares da área da saúde a serem convocados | CONCLUÍDA | 4/25/2023      | 4/28/2023       |
| Publicação no DODF da convocação para entrega de documentos                | Publicação no DODF da convocação para entrega de documentos                | CONCLUÍDA | 5/2/2023       | 5/5/2023        |
| Inserção dos dados dos novos militares no GECOPE por meio do INOVA         | Inserção dos dados dos novos militares no GECOPE por meio do INOVA         | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/31/2023       |
| Recebimento da documentação dos candidatos                                 | Recebimento da documentação dos candidatos                                 | CONCLUÍDA | 5/8/2023       | 5/31/2023       |
| Publicação em DODF da incorporação no CBMDF                                | Publicação em DODF da incorporação no CBMDF                                | CONCLUÍDA | 6/1/2023       | 6/27/2023       |

**ADESÃO À METODOLOGIA**  
100.00%  
(7/5/2023)

| ITEM           | STATUS | ITEM                | STATUS |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      | Existe TAP          | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      | PLASE publicado     | —      |
| Custo estimado | —      | Reports atualizados | ✓      |

|     |     |               |             |
|-----|-----|---------------|-------------|
| SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | NÃO APURADO |
|-----|-----|---------------|-------------|

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

05/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.01: Implementar a Política de Saúde.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM/Comb. Ana Carolina de Lima Rick de Oliveira, nomeada por meio do BG 111, de 14 de junho de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se em andamento, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: As etapas concluídas.

Status do projeto: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Realizar eventos técnico-científicos**

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 10.03 Realizar eventos técnico-científicos            |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | GPCIU                                                 |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/Comb Leal                                |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | N/A                                                   |

| ETAPAS                                                                                                     | ATIVIDADES                                                                                                 | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Palestra técnica com os concludentes do 9º Curso de Operações em Incêndio                                  | Palestra técnica com os concludentes do 9º Curso de Operações em Incêndio                                  | CONCLUÍDA | 8/8/2022       | 8/8/2022        |
| Palestra sobre incêndios em veículos e painéis fotovoltaicos                                               | Palestra sobre incêndios em veículos e painéis fotovoltaicos                                               | CONCLUÍDA | 10/18/2022     | 10/18/2022      |
| Seminário de prevenção e combate a incêndio urbano - estudos de caso                                       | Seminário de prevenção e combate a incêndio urbano - estudos de caso                                       | CONCLUÍDA | 10/24/2022     | 10/24/2022      |
| Seminário de combate a incêndio em veículos elétricos, veículos elétricos híbridos e painéis fotovoltaicos | Seminário de combate a incêndio em veículos elétricos, veículos elétricos híbridos e painéis fotovoltaicos | CONCLUÍDA | 12/7/2022      | 12/7/2022       |
| Estudo de caso - Incêndio na Boate Kiss                                                                    | Estudo de caso - Incêndio na Boate Kiss                                                                    | CONCLUÍDA | 5/31/2023      | 5/31/2023       |

**ADESÃO À METODOLOGIA**  
100.00%  
(5/11/2023)

| ITEM           | STATUS |
|----------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      |
| Custo estimado | —      |

| ITEM                | STATUS |
|---------------------|--------|
| Existe TAP          | ✓      |
| PLASE publicado     | —      |
| Reports atualizados | ✓      |

|     |     |               |             |
|-----|-----|---------------|-------------|
| SIM | NÃO | NÃO SE APLICA | NÃO APURADO |
|-----|-----|---------------|-------------|

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

01/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar eventos técnico-científicos, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 10.03: Realizar eventos técnico-científicos.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Paulo Fernando Leal de Holanda Cavalcanti, nomeado por meio do BG 048, de 10 de março de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report que trata da Palestra realizada no Auditório da ABMIL sobre a Investigação de incêndio da boate Kiss. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto conforme datas previstas no cronograma.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas foram concluídas no prazo estabelecido no cronograma. Este projeto não exauriu a necessidade de novos eventos na temática, ele foi apenas um esforço temporário para criar uma cultura de promoção a eventos relacionados à temática técnico-científica

Status do projeto: Concluído.



82.82%

**PROJETO:****ATRASADO****Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências**

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas    |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | SUCOP                                                               |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/Comb MUNIZ DA SILVA                                    |
| <b>PROCESSO SEI</b>           |                                                                     |

| ETAPAS                                                                                           | ATIVIDADES                                                                                                                                         | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Estabelecer competências mínimas necessárias para o serviço de tele-atendimento e despacho       | Definir competências                                                                                                                               | CONCLUÍDA | 4/23/2018      | 5/23/2018       |
|                                                                                                  | Definir perfil do atendente e do despachante                                                                                                       | CONCLUÍDA | 4/23/2018      | 5/21/2018       |
|                                                                                                  | Estabelecer prioridades                                                                                                                            | CONCLUÍDA | 4/23/2018      | 5/16/2018       |
|                                                                                                  | Levantar das necessidades de atendimento e despacho                                                                                                | CONCLUÍDA | 4/23/2018      | 5/12/2018       |
| Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.         | Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.                                                           | CONCLUÍDA | 4/23/2018      | 5/23/2018       |
| Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento | Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para a DINVI | CONCLUÍDA | 5/2/2018       | 7/20/2018       |
|                                                                                                  | Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o COMOP | CONCLUÍDA | 5/2/2018       | 7/20/2018       |
|                                                                                                  | Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GAEPH | CONCLUÍDA | 5/2/2018       | 7/20/2018       |
|                                                                                                  | Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GPRAM | CONCLUÍDA | 5/2/2018       | 7/20/2018       |
| Instalar terminais embarcados nas VTRs operacionais                                              | Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento                                                   | CONCLUÍDA | 5/2/2018       | 7/20/2018       |
|                                                                                                  | Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas                                                            | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                  | Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional                                                                                | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                  | Incorporar na carga do CBMDF os terminais                                                                                                          | ATRASADA  | 5/9/2018       | 10/19/2018      |
|                                                                                                  | Levantamento dos equipamentos disponíveis junto ao COMOP                                                                                           | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 5/18/2018       |
|                                                                                                  | Verificar junto ao COMOP quais viaturas receberão os equipamentos                                                                                  | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 5/18/2018       |



| ETAPAS                                                                                                                      | ATIVIDADES                                                                                                                  | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Instalar terminais embarcados nas VTRs operacionais                                                                         | Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação                         | ATRASADA  | 5/25/2018      | 12/20/2018      |
| Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional                                                         | Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso da DINVI                                                              | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                                             | Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do COMOP                                                              | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                                             | Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GAEPH                                                              | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                                             | Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GPRAM                                                              | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
| Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas                                     | Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura da DINVI para carga do Tablet                           | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                                             | Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GAEPH para carga do Tablet                           | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                                             | Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GPRAM para carga do Tablet                           | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
|                                                                                                                             | Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do COMOP para carga do Tablet                           | CONCLUÍDA | 5/9/2018       | 6/29/2018       |
| Revisar os protocolos de acionamento, atendimento e despacho de ocorrências                                                 | Levantar demandas com interessados                                                                                          | CONCLUÍDA | 5/15/2018      | 6/4/2018        |
|                                                                                                                             | Conhecer os protocolos em vigor                                                                                             | CONCLUÍDA | 5/30/2018      | 5/30/2018       |
|                                                                                                                             | Processar as mudanças necessárias                                                                                           | CONCLUÍDA | 6/5/2018       | 6/19/2018       |
|                                                                                                                             | Validar os novos protocolos                                                                                                 | CONCLUÍDA | 6/19/2018      | 7/23/2018       |
| Aplicar a classificação de ocorrências operacionais                                                                         | Validar no Alto Comando a Classificação Existente                                                                           | CONCLUÍDA | 5/15/2018      | 5/18/2018       |
|                                                                                                                             | Alimentar o Sistema com as Classificações validadas                                                                         | CONCLUÍDA | 5/21/2018      | 5/25/2018       |
|                                                                                                                             | Teste de programação                                                                                                        | CONCLUÍDA | 5/28/2018      | 8/21/2018       |
| Aprovar projeto pedagógico de capacitação e avaliação periódica dos tele-atendentes e despachantes                          | Aprovar projeto pedagógico                                                                                                  | CONCLUÍDA | 5/23/2018      | 7/6/2018        |
|                                                                                                                             | Definir instrução de comunicação                                                                                            | CONCLUÍDA | 5/23/2018      | 6/8/2018        |
|                                                                                                                             | Definir instrução de telefonia                                                                                              | CONCLUÍDA | 5/23/2018      | 6/1/2018        |
|                                                                                                                             | Definir instrução para atendimento 193                                                                                      | CONCLUÍDA | 5/23/2018      | 6/22/2018       |
|                                                                                                                             | Definir instrução para o sistema Fênix                                                                                      | CONCLUÍDA | 5/23/2018      | 6/22/2018       |
|                                                                                                                             | Definir instrução para Rádio Comunicador operacional                                                                        | CONCLUÍDA | 5/23/2018      | 6/29/2018       |
| Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação                         | Prover os meios necessários para a comunicação do sistema                                                                   | ATRASADA  | 5/25/2018      | 10/1/2018       |
|                                                                                                                             | Efetuar os testes de conectividade                                                                                          | ATRASADA  | 10/1/2018      | 12/20/2018      |
|                                                                                                                             | Entrega dos equipamentos 100% funcionais                                                                                    | ATRASADA  | 10/19/2018     | 10/19/2018      |
| Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP | Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP | CONCLUÍDA | 8/21/2018      | 9/20/2018       |



## ADESÃO À METODOLOGIA

| <br>75.00%<br>(8/8/2023) | ITEM           | STATUS             | ITEM                | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                           | Existe Gerente | ✓                  | Existe TAP          | ✓      |
|                                                                                                           | Existe EAP     | ✓                  | PLASE publicado     | —      |
|                                                                                                           | Custo estimado | —                  | Reports atualizados | ✗      |
|                                                                                                           |                |                    |                     |        |
| ✓<br>SIM                                                                                                  | ✗<br>NÃO       | —<br>NÃO SE APLICA | !<br>NÃO APURADO    |        |

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/08/2023

Dados de Oficialização do Projeto: Projeto "Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084/18 e retirado do rol de projetos estratégicos a serem executados pelo BG 56, de 24 de março de 2021. Contudo o referido projeto foi reativado por meio de publicação em BG n.º 111/2022.

Dados do Gerente Atual: Ten-Cel. QOBM/Comb. Igor Muniz da Silva em BG n.º 110/2023 em substituição ao TC QOBM/Comb. Abrahão Medeiros de Alencar.

Dados de Execução do Projeto: Apesar do referido projeto ter sido reativado , o mesmo encontrasse com status EM ATRASO.

Report do Gerente: Falta de reports atualizados por parte do gerente.

Análise do Supervisor: Desde a troca de gerente, o referido projeto não sofreu atualizações.

Status: Apesar do referido projeto ter sido reativado , o mesmo encontrasse com status EM ATRASO.



44.46%

**PROJETO:****ATRASADO****Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - Gama**

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais                 |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | COMAP                                                               |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | TEN CEL QOBM/RRm RISSEL                                             |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00044902/2020-49                                              |

| ETAPAS                                           | ATIVIDADES                             | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                 | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
|                                                  | - Previsão Orçamentária                | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                 | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
|                                                  | - Previsão Orçamentária                | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
| Início de projetos                               | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
| Início de projetos                               | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
| - PARF                                           | Início de projetos                     | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
| - PARF                                           | Início de projetos                     | ATRASADA  | 5/26/2020      | 1/9/2022        |
| Início do projeto                                | Abertura de processo administrativo    | CONCLUÍDA | 5/26/2020      | 5/26/2020       |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                 | CONCLUÍDA | 5/26/2020      | 8/4/2021        |
|                                                  | - Previsão orçamentária                | CONCLUÍDA | 8/19/2020      | 10/27/2021      |
| Início do projeto                                | Abertura de processo administrativo    | CONCLUÍDA | 5/29/2020      | 5/29/2020       |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                 | CONCLUÍDA | 5/29/2020      | 8/6/2021        |
|                                                  | - Previsão orçamentária                | CONCLUÍDA | 8/19/2020      | 10/27/2021      |
| 1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira | CONCLUÍDA | 5/29/2020      | 10/27/2021      |
|                                                  | 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica    | CONCLUÍDA | 8/25/2020      | 4/20/2022       |
| 2.4 - Levantamento Arquitetônico                 | Levantamento As Built in loco          | CONCLUÍDA | 6/8/2020       | 6/30/2020       |
|                                                  | Digitalização de As Built              | CONCLUÍDA | 7/18/2020      | 8/2/2020        |
|                                                  | Correções As Built                     | CONCLUÍDA | 8/2/2020       | 8/16/2020       |
| 2.4 - Levantamento Arquitetônico                 | Levantamento As Built in loco          | CONCLUÍDA | 7/2/2020       | 7/18/2020       |
|                                                  | Digitalização de As Built              | CONCLUÍDA | 7/18/2020      | 8/2/2020        |
|                                                  | Correções As Built                     | CONCLUÍDA | 8/2/2020       | 8/16/2020       |
| 3 - PN - Programa de Necessidades                | 3.1 - Entrevistas                      | CONCLUÍDA | 7/3/2020       | 2/14/2021       |
|                                                  | 3.2 - Levantamento de Demandas         | CONCLUÍDA | 7/4/2020       | 2/17/2021       |



| ETAPAS                                           | ATIVIDADES                                 | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                     | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
|                                                  | - Previsão Orçamentária                    | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira           | - PARF                                     | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
|                                                  | - Previsão Orçamentária                    | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
| Início de projetos                               | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira     | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
| Início de projetos                               | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira     | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
| 2 - LV - Levantamentos                           | 2.4 - Levantamento Arquitetônico           | CONCLUÍDA | 6/8/2020       | 8/16/2020       |
|                                                  | 2.1 - TOP - Topografia                     | CONCLUÍDA | 7/4/2020       | 7/18/2021       |
|                                                  | 2.2 - SDG - Sondagem                       | ATRASADA  | 6/18/2021      | 10/17/2021      |
|                                                  | 2.3 - Concessionárias                      | ATRASADA  | 8/18/2021      | 11/17/2021      |
| 2 - LV - Levantamentos                           | 2.4 - Levantamento Arquitetônico           | CONCLUÍDA | 7/2/2020       | 8/16/2020       |
|                                                  | 2.1 - TOP - Topografia                     | ATRASADA  | 7/4/2020       | 7/18/2021       |
|                                                  | 2.3 - Concessionárias                      | ATRASADA  | 8/18/2021      | 11/17/2021      |
| - PARF                                           | Início de projetos                         | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
| - PARF                                           | Início de projetos                         | ATRASADA  | 7/4/2020       | 2/17/2022       |
| 4 - EP - Estudo Preliminar                       | Desenvolvimento                            | CONCLUÍDA | 8/23/2020      | 9/23/2020       |
|                                                  | Aprovação da proposta                      | CONCLUÍDA | 10/8/2020      | 10/9/2020       |
|                                                  | Fechamento da proposta                     | CONCLUÍDA | 10/9/2020      | 10/24/2020      |
|                                                  | Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt    | CONCLUÍDA | 10/24/2020     | 10/28/2020      |
| 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica              | - Legislação urbanística                   | CONCLUÍDA | 8/25/2020      | 1/22/2022       |
|                                                  | Normas Técnicas e demais aplicáveis        | CONCLUÍDA | 8/25/2020      | 1/23/2022       |
|                                                  | - Documentação Cadastral o imóvel          | CONCLUÍDA | 9/4/2020       | 4/20/2022       |
| 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica              | - Legislação urbanística                   | CONCLUÍDA | 8/25/2020      | 1/22/2022       |
|                                                  | Normas Técnicas e demais aplicáveis        | CONCLUÍDA | 8/25/2020      | 1/23/2022       |
|                                                  | - Documentação Cadastral o imóvel          | CONCLUÍDA | 9/4/2020       | 4/20/2022       |
| 1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira     | CONCLUÍDA | 5/26/2020      | 10/27/2021      |
|                                                  | 1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica        | CONCLUÍDA | 8/25/2020      | 4/20/2022       |
| 7 - PE - Projeto Executivo                       | ARQ - Arquitetura e Urbanismo              | ATRASADA  | 2/19/2021      | 2/17/2022       |
|                                                  | INC - Incêndio                             | ATRASADA  | 5/19/2021      | 4/13/2022       |
|                                                  | INF - Infraestrutura                       | ATRASADA  | 7/21/2021      | 2/17/2022       |
|                                                  | MEC - Instalações Mecânicas                | ATRASADA  | 7/21/2021      | 2/17/2022       |
|                                                  | HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias | ATRASADA  | 7/21/2021      | 12/19/2021      |



| ETAPAS                        | ATIVIDADES                                      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 7 - PE - Projeto Executivo    | ELE - Instalações Elétricas                     | ATRASADA  | 7/21/2021      | 4/6/2022        |
|                               | EST - Estrutura                                 | ATRASADA  | 7/21/2021      | 1/30/2022       |
|                               | FND - Fundações                                 | ATRASADA  | 10/20/2021     | 1/9/2022        |
|                               | 8.9 - PLO - Planilha Orçamentária               | ATRASADA  | 11/24/2021     | 1/2/2022        |
|                               | 8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro       | ATRASADA  | 1/2/2022       | 1/16/2022       |
|                               | 8.13 - MDE - Memorial Descritivo                | ATRASADA  | 1/3/2022       | 2/17/2022       |
|                               | 8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas | ATRASADA  | 1/4/2022       | 2/17/2022       |
|                               | 8.12 - MEC - Memória de Cálculo                 | ATRASADA  | 1/5/2022       | 2/17/2022       |
|                               | 8.14 - Projeto Básico de Licitação              | ATRASADA  | 1/16/2022      | 2/6/2022        |
| INF - Infraestrutura          | Captação de Águas de Pluviais                   | ATRASADA  | 7/21/2021      | 2/17/2022       |
|                               | Pavimentação                                    | CONCLUÍDA | 7/21/2021      | 2/17/2022       |
| HID - Instalações Hidráulicas | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 7/21/2021      | 8/18/2021       |
|                               | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 8/18/2021      | 10/10/2021      |
|                               | Detalhamento                                    | ATRASADA  | 10/10/2021     | 10/17/2021      |
|                               | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA  | 10/17/2021     | 10/31/2021      |
|                               | Implantação (área externa) - edificação no lote | ATRASADA  | 10/23/2021     | 11/11/2021      |
|                               | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 10/31/2021     | 12/18/2021      |
| MEC - Instalações Mecânicas   | Elevadores                                      | ATRASADA  | 7/21/2021      | 2/17/2022       |
|                               | ARC - Ar Condicionado                           | ATRASADA  | 7/21/2021      | 12/19/2021      |
| EST - Estrutura               | Estrutura de Concreto Armado                    | ATRASADA  | 7/21/2021      | 1/30/2022       |
|                               | Estrutura Metálica                              | ATRASADA  | 7/21/2021      | 10/17/2021      |
| Estrutura Metálica            | Lançamento do sistema                           | ATRASADA  | 7/21/2021      | 10/17/2021      |
| SON - Sonorização e CFTV      | Lançamento do sistema                           | ATRASADA  | 7/21/2021      | 10/17/2021      |
|                               | Dimensionamento do projeto                      | ATRASADA  | 10/17/2021     | 11/17/2021      |
|                               | Detalhamento                                    | ATRASADA  | 11/17/2021     | 12/18/2021      |
|                               | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA  | 12/18/2021     | 12/29/2021      |
|                               | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 12/29/2021     | 1/16/2022       |
|                               | Memoriais                                       | ATRASADA  | 1/16/2022      | 1/19/2022       |
| 6 - PL - Projeto Legal        | 6.5 - CEB                                       | ATRASADA  | 9/19/2021      | 2/17/2022       |
| INC - Incêndio                | Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico         | ATRASADA  | 5/19/2021      | 4/13/2022       |
|                               | SPDA                                            | ATRASADA  | 9/23/2021      | 2/17/2022       |
| SPDA                          | Dimensionamento SPDA                            | ATRASADA  | 9/23/2021      | 12/23/2021      |
|                               | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 9/29/2021      | 2/17/2022       |



| ETAPAS                                     | ATIVIDADES                                      | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| SPDA                                       | Quantitativo                                    | ATRASADA  | 12/23/2021     | 2/17/2022       |
| 8 - ART's e RRT's                          | Emissão de ART's e RRT's                        | CONCLUÍDA | 10/2/2021      | 11/2/2021       |
|                                            | Pagamento                                       | CONCLUÍDA | 11/2/2021      | 12/2/2021       |
|                                            | Emissão de ART's e RRT's registrada             | CONCLUÍDA | 12/2/2021      | 12/7/2021       |
| ARC - Ar Condicionado                      | Lançamento do sistema                           | ATRASADA  | 7/21/2021      | 8/15/2021       |
|                                            | Dimensionamento do projeto                      | ATRASADA  | 8/15/2021      | 10/16/2021      |
|                                            | Detalhamento                                    | ATRASADA  | 10/16/2021     | 11/5/2021       |
|                                            | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA  | 11/5/2021      | 11/20/2021      |
|                                            | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 11/20/2021     | 12/4/2021       |
|                                            | Memoriais                                       | ATRASADA  | 12/4/2021      | 12/19/2021      |
| SAN - Instalações Sanitárias               | Lançamento do sistema                           | CONCLUÍDA | 7/21/2021      | 8/1/2021        |
|                                            | Dimensionamento do projeto                      | CONCLUÍDA | 8/1/2021       | 10/10/2021      |
|                                            | Detalhamento                                    | ATRASADA  | 10/10/2021     | 10/17/2021      |
|                                            | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA  | 10/17/2021     | 10/31/2021      |
|                                            | Implantação (área externa) - edificação no lote | ATRASADA  | 10/23/2021     | 11/11/2021      |
|                                            | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 10/31/2021     | 10/31/2021      |
| HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias | HID - Instalações Hidráulicas                   | ATRASADA  | 7/21/2021      | 12/18/2021      |
|                                            | SAN - Instalações Sanitárias                    | ATRASADA  | 7/21/2021      | 11/11/2021      |
|                                            | IMP - Impermeabilização                         | ATRASADA  | 10/20/2021     | 12/19/2021      |
| FND - Fundações                            | Lançamento do sistema                           | ATRASADA  | 10/20/2021     | 10/27/2021      |
|                                            | Dimensionamento do projeto                      | ATRASADA  | 10/27/2021     | 11/17/2021      |
|                                            | Detalhamento                                    | ATRASADA  | 11/17/2021     | 12/1/2021       |
|                                            | Quantitativo do projeto                         | ATRASADA  | 12/1/2021      | 12/18/2021      |
|                                            | Caderno de especificações                       | ATRASADA  | 12/18/2021     | 12/26/2021      |
|                                            | Memoriais                                       | ATRASADA  | 12/26/2021     | 1/9/2022        |
| ELE - Instalações Elétricas                | RDL - Rede de Dados Lógicos                     | ATRASADA  | 7/21/2021      | 2/9/2022        |
|                                            | SON - Sonorização e CFTV                        | ATRASADA  | 7/21/2021      | 1/19/2022       |
|                                            | ELE - Sistema Elétrico                          | ATRASADA  | 10/23/2021     | 4/6/2022        |
| ARQ - Arquitetura                          | Projeto Executivo                               | CONCLUÍDA | 2/19/2021      | 12/15/2021      |
|                                            | Implantação (área externa) - edificação no lote | CONCLUÍDA | 10/23/2021     | 11/8/2021       |
|                                            | Detalhamentos                                   | CONCLUÍDA | 12/15/2021     | 1/2/2022        |
|                                            | Quantitativos                                   | CONCLUÍDA | 1/2/2022       | 1/16/2022       |
|                                            | Memorial Descritivo                             | CONCLUÍDA | 1/16/2022      | 1/23/2022       |



| ETAPAS                        | ATIVIDADES                                                             | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| ARQ - Arquitetura             | Caderno de Especificações                                              | CONCLUÍDA | 1/23/2022      | 2/10/2022       |
| ELE - Sistema Elétrico        | Implantação (área externa) - edificação no lote                        | ATRASADA  | 10/23/2021     | 11/11/2021      |
|                               | Lançamento do sistema                                                  | ATRASADA  | 11/4/2021      | 12/18/2021      |
|                               | Dimensionamento do projeto                                             | ATRASADA  | 12/18/2021     | 2/21/2022       |
|                               | Detalhamento                                                           | ATRASADA  | 2/21/2022      | 3/7/2022        |
|                               | Quantitativo do projeto                                                | ATRASADA  | 3/7/2022       | 3/22/2022       |
|                               | Caderno de especificações                                              | ATRASADA  | 3/22/2022      | 3/30/2022       |
|                               | Memoriais                                                              | ATRASADA  | 3/30/2022      | 4/6/2022        |
| Lançamento do sistema         | Lançamento do sistema - luminotécnico                                  | ATRASADA  | 11/4/2021      | 12/18/2021      |
|                               | Lançamento do sistema - tomadas gerais                                 | ATRASADA  | 11/4/2021      | 12/18/2021      |
|                               | Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais) | ATRASADA  | 11/4/2021      | 12/18/2021      |
| ARQ - Arquitetura e Urbanismo | ARQ - Arquitetura                                                      | CONCLUÍDA | 2/19/2021      | 2/10/2022       |
|                               | ACE - Acessibilidade                                                   | CONCLUÍDA | 7/21/2021      | 2/17/2022       |
|                               | PAI - Paisagismo                                                       | ATRASADA  | 11/7/2021      | 11/17/2021      |
|                               | Comunicação Visual                                                     | ATRASADA  | 11/17/2021     | 2/17/2022       |
| RDL - Rede de Dados Lógicos   | Lançamento do sistema                                                  | ATRASADA  | 7/21/2021      | 10/17/2021      |
|                               | Dimensionamento do projeto                                             | ATRASADA  | 10/17/2021     | 11/17/2021      |
|                               | Implantação (área externa) - edificação no lote                        | ATRASADA  | 10/23/2021     | 11/11/2021      |
|                               | Detalhamento                                                           | ATRASADA  | 11/17/2021     | 12/18/2021      |
|                               | Quantitativo do projeto                                                | ATRASADA  | 12/18/2021     | 1/9/2022        |
|                               | Caderno de especificações                                              | ATRASADA  | 1/9/2022       | 1/23/2022       |
|                               | Memoriais                                                              | ATRASADA  | 2/2/2022       | 2/9/2022        |
| 9 - PB - Projeto Básico       | Elaboração do PES                                                      | CONCLUÍDA | 11/24/2021     | 5/6/2022        |
|                               | Encaminhamento para DIMAT                                              | CONCLUÍDA | 5/7/2022       | 5/8/2022        |
|                               | Acompanhamento do processo                                             | ATRASADA  | 5/8/2022       | 10/29/2022      |
| IMP - Impermeabilização       | Projeto Executivo                                                      | ATRASADA  | 10/20/2021     | 11/17/2021      |
|                               | Quantitativo                                                           | ATRASADA  | 11/17/2021     | 12/5/2021       |
|                               | Caderno de Especificações                                              | ATRASADA  | 12/5/2021      | 12/19/2021      |
| Estrutura de Concreto Armado  | Lançamento do sistema                                                  | ATRASADA  | 7/21/2021      | 10/3/2021       |
|                               | Dimensionamento do projeto                                             | ATRASADA  | 10/3/2021      | 11/17/2021      |
|                               | Detalhamento                                                           | ATRASADA  | 11/17/2021     | 12/18/2021      |
|                               | Quantitativo do projeto                                                | ATRASADA  | 12/18/2021     | 1/2/2022        |



| ETAPAS                                  | ATIVIDADES                             | STATUS     | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Estrutura de Concreto Armado            | Caderno de especificações              | ATRASADA   | 1/2/2022       | 1/16/2022       |
|                                         | Memoriais                              | ATRASADA   | 1/16/2022      | 1/30/2022       |
| Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico | Dimensionamento e Mapa de rota de fuga | ATRASADA   | 5/19/2021      | 4/13/2022       |
|                                         | Caderno de especificações              | ATRASADA   | 2/10/2022      | 4/13/2022       |
|                                         | Quantitativo                           | ATRASADA   | 2/10/2022      | 4/13/2022       |
| Emissão do alvará de construção         | Emissão do alvará de construção        | PARALIZADA | 5/6/2022       | 8/1/2022        |
| Preparação para edital                  | Pedido de Execução de Serviços - Envio | ATRASADA   | 5/7/2022       | 6/6/2022        |
|                                         | Projeto Básico                         | ATRASADA   | 6/6/2022       | 6/11/2022       |
|                                         | Projeto Básico - Aprovação             | ATRASADA   | 6/8/2022       | 6/8/2022        |
| Processo Licitatório                    | Abertura de processo licitatório       | ATRASADA   | 6/28/2022      | 6/28/2022       |
|                                         | Edital                                 | ATRASADA   | 7/2/2022       | 7/2/2022        |
|                                         | Definição da modalidade de licitação   | ATRASADA   | 7/6/2022       | 7/6/2022        |
|                                         | Aprovação do setor jurídico            | ATRASADA   | 7/24/2022      | 7/24/2022       |
|                                         | Edital - Publicação                    | ATRASADA   | 8/3/2022       | 8/3/2022        |
|                                         | Julgamento das propostas               | ATRASADA   | 9/3/2022       | 9/3/2022        |
|                                         | Adjudicação do vencedor da licitação   | ATRASADA   | 9/5/2022       | 9/5/2022        |
| Ritos iniciais - Execução Contratual    | Assinatura do Contrato                 | ATRASADA   | 9/13/2022      | 9/13/2022       |
|                                         | Comissão Executora - Publicação        | ATRASADA   | 9/23/2022      | 9/24/2022       |
|                                         | Alvará de Construção - Emissão         | ATRASADA   | 9/25/2022      | 9/25/2022       |
|                                         | Ordem de serviço inicial               | ATRASADA   | 9/27/2022      | 9/27/2022       |
| Execução da obra                        | Serviços preliminares                  | ATRASADA   | 9/30/2022      | 5/30/2023       |
|                                         | Serviços complementares                | ATRASADA   | 10/5/2022      | 10/5/2023       |
|                                         | Serviços auxiliares e administrativos  | ATRASADA   | 10/5/2022      | 10/5/2023       |
|                                         | Fundações e estruturas                 | ATRASADA   | 10/5/2022      | 5/5/2023        |
|                                         | Impermeabilizações                     | ATRASADA   | 1/4/2023       | 8/4/2023        |
|                                         | Arquitetura e elementos de urbanismo   | ATRASADA   | 1/4/2023       | 10/5/2023       |
|                                         | Instalações hidráulicas e sanitárias   | ATRASADA   | 1/4/2023       | 10/5/2023       |
|                                         | Instalações elétricas e eletrônicas    | ATRASADA   | 1/4/2023       | 10/5/2023       |
|                                         | Instalações mecânicas e de utilidades  | ATRASADA   | 4/4/2023       | 9/4/2023        |
|                                         | Proteção contra incêndio e pânico      | ATRASADA   | 4/4/2023       | 9/4/2023        |
|                                         | Equipamentos                           | ATRASADA   | 7/20/2023      | 10/5/2023       |
| Recebimento da obra                     | Recebimento provisório                 | A INICIAR  | 10/5/2023      | 11/4/2023       |
|                                         | Recebimento definitivo                 | A INICIAR  | 2/4/2024       | 3/6/2024        |



| ETAPAS              | ATIVIDADES | STATUS    | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| Recebimento da obra | Habite-se  | A INICIAR | 3/6/2024       | 5/7/2024        |

ADESÃO À METODOLOGIA

| <br>80.00%<br>(8/8/2023) | ITEM           | STATUS | ITEM                | STATUS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------|
|                                                                                                           | Existe Gerente | ✓      | Existe TAP          | ✓      |
|                                                                                                           | Existe EAP     | ✓      | PLASE publicado     | —      |
|                                                                                                           | Custo estimado | ✓      | Reports atualizados | ✗      |

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SIM | <br>NÃO | <br>NÃO SE APLICA | <br>NÃO APURADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/08/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb e aprovado pelo Comandante-Geral, publicado no BG 137, de 23/07/20. O projeto consta na relação de projetos estratégicos publicados desde o BG n.º 195/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRM. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição do MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO por falta de reports por parte do gerente atual, que não efetuou nenhum report.

REPORT DO GERENTE: Em 07/04/2022, a ex-gerente de projeto, MAJ. Isa Paula Correa Guimaraes, fez seu último report no GPWeb informando que o projeto básico havia sido corrigido e encaminhado para licitação. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto atrasado por falta de reports, porém em estado avançado de execução.

STATUS: o projeto apresenta o status ATRASADO.



53.13%

**PROJETO:**

PARALISADO

**Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro Militar - Vila Planalto**

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais. |
| <b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b> | 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais                 |
| <b>SETOR RESPONSÁVEL</b>      | COMAP                                                               |
| <b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>    | CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA                                     |
| <b>PROCESSO SEI</b>           | 00053-00092407/2017-41                                              |

| ETAPAS                                           | ATIVIDADES                                       | STATUS     | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira | 1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira | CONCLUÍDA  | 1/5/2016       | 12/19/2017      |
| PB - Projeto Básico                              | PB - Projeto Básico                              | CONCLUÍDA  | 12/26/2017     | 11/16/2018      |
| Processo Licitatório                             | Processo Licitatório                             | CONCLUÍDA  | 6/12/2019      | 4/6/2020        |
| Execução da Obra                                 | Publicação da Comissão Executora de Contrato     | CONCLUÍDA  | 4/27/2020      | 4/28/2020       |
|                                                  | Emissão da Ordem de Serviço Inicial              | CONCLUÍDA  | 4/28/2020      | 4/30/2020       |
|                                                  | Alvará de Construção                             | CONCLUÍDA  | 5/8/2020       | 5/8/2020        |
|                                                  | Execução dos Serviços                            | PARALIZADA | 6/9/2020       | 10/3/2025       |
|                                                  | Mobilização da Empresa                           | CONCLUÍDA  | 6/29/2020      | 6/29/2020       |
|                                                  | Desmobilização                                   | A INICIAR  | 10/3/2025      | 11/17/2025      |
| Execução dos Serviços                            | 1ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 6/9/2020       | 7/8/2020        |
|                                                  | 2ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 7/8/2020       | 8/6/2020        |
|                                                  | 3ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 8/6/2020       | 9/4/2020        |
|                                                  | 4ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 9/4/2020       | 10/7/2020       |
|                                                  | 5ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 11/7/2020      | 12/7/2020       |
|                                                  | 6ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 12/7/2020      | 1/8/2021        |
|                                                  | 7ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 1/8/2021       | 2/8/2021        |
|                                                  | 8ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 2/8/2021       | 3/11/2021       |
|                                                  | 9ª Medição                                       | CONCLUÍDA  | 3/11/2021      | 4/12/2021       |
|                                                  | 10ª Medição                                      | CONCLUÍDA  | 4/12/2021      | 5/13/2021       |
|                                                  | 11ª Medição                                      | CONCLUÍDA  | 5/13/2021      | 6/14/2021       |
|                                                  | 12ª Medição                                      | CONCLUÍDA  | 6/14/2021      | 7/14/2021       |
|                                                  | 13ª Medição                                      | CONCLUÍDA  | 7/14/2021      | 8/12/2021       |
|                                                  | 14ª Medição                                      | CONCLUÍDA  | 8/12/2021      | 9/14/2021       |
|                                                  | 15ª Medição                                      | CONCLUÍDA  | 9/14/2021      | 10/15/2021      |
|                                                  | 16ª Medição                                      | CONCLUÍDA  | 10/15/2021     | 11/17/2021      |



| ETAPAS                                 | ATIVIDADES                             | STATUS       | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Execução dos Serviços                  | 17ª Medição                            | CONCLUÍDA    | 11/17/2021     | 12/17/2021      |
|                                        | 18ª Medição                            | PARALIZADA   | 12/17/2024     | 1/17/2025       |
|                                        | 19ª Medição                            | A INICIAR    | 1/17/2025      | 2/20/2025       |
|                                        | 20ª Medição                            | A INICIAR    | 2/20/2025      | 3/24/2025       |
|                                        | 21ª Medição                            | A INICIAR    | 3/24/2025      | 4/25/2025       |
|                                        | 22ª Medição                            | A INICIAR    | 4/25/2025      | 5/29/2025       |
|                                        | 23ª Medição                            | A INICIAR    | 5/29/2025      | 7/1/2025        |
|                                        | 24ª Medição                            | A INICIAR    | 7/1/2025       | 7/31/2025       |
|                                        | 25ª Medição                            | A INICIAR    | 7/31/2025      | 9/2/2025        |
|                                        | 26ª Medição                            | A INICIAR    | 9/2/2025       | 10/3/2025       |
| Desembolso Físico Financeiro           | Desembolso Físico Financeiro           | EM ANDAMENTO | 6/9/2020       | 11/17/2025      |
| 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira | - PARF                                 | ATRASADA     | 7/27/2020      | 3/12/2022       |
|                                        | - Previsão Orçamentária                | ATRASADA     | 7/27/2020      | 3/12/2022       |
| Início de projetos                     | 1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira | ATRASADA     | 7/27/2020      | 3/12/2022       |
| - PARF                                 | Início de projetos                     | ATRASADA     | 7/27/2020      | 3/12/2022       |
| Recebimento                            | Recebimento Definitivo                 | A INICIAR    | 11/17/2025     | 3/25/2026       |
|                                        | Recebimento Provisório                 | A INICIAR    | 11/17/2025     | 12/18/2025      |
| Processo de Habite-se                  | Processo de Habite-se                  | A INICIAR    | 11/17/2025     | 1/20/2026       |



80.00%  
(7/4/2023)

| ITEM           | STATUS |
|----------------|--------|
| Existe Gerente | ✓      |
| Existe EAP     | ✓      |
| Custo estimado | ✓      |

| ITEM                | STATUS |
|---------------------|--------|
| Existe TAP          | ✓      |
| PLASE publicado     | —      |
| Reports atualizados | ✗      |



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



04/07/2023

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Projeto "Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 084, de 6 de maio de 2020, com entrega para 2021 conforme os BGs 195, de 16 de outubro de 2020 e 228, de 8 de dezembro de 2020 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília". O projeto está relacionado à iniciativa 1.5 do PLANES.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira nomeado por meio do BG n.º 111/2023 em substituição da MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Aprovação de TAP publicada no BG 084, de 6 de maio de 2020, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado conforme cronograma e o último report.

**REPORT DO GERENTE:** Último Report da gerente anterior data de 14/02/2023 que Informa que a obra encontrasse paralisada por abandono da empresa diante da recusa de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro pelo CBMDF.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** A obra encontra-se paralisada em função das tentativas frustradas de reequilíbrio orçamentário.

Status do projeto: ATRASADO.
