



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

PLANES 2017-2024
OUTUBRO DE 2023

SEGEF



1 INTRODUÇÃO

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do Estado-Maior-Geral (SEGEP) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações a execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da SEGEP/EMG, como uma ferramenta de apoio para fornecimento de subsídios aos ajustes necessários à execução do Plano Estratégico, bem como para melhoria dos processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com gerenciamento de projetos, por intermédio dos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.



2 MAPA ESTRATÉGICO



O Mapa Estratégico é uma representação estruturada de forma resumida e visual do PLANES 2017-2024. Tem como principal objetivo criar um fluxo de entendimento de como atingir os objetivos nele descritos. Tendo como premissa a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), apresenta também a construção de nossa cadeia de valor em função das perspectivas do BSC, tendo como cliente a população do DF.





3 PROJETOS ESTRATÉGICOS


3.1 Projetos por Tema

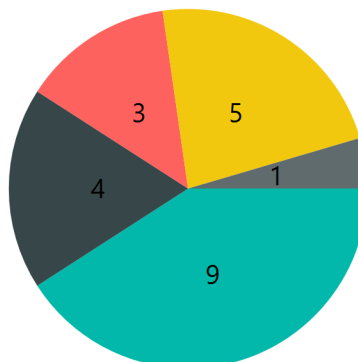

3.2 Projetos por Objetivos



3.3 Projetos por OBM's

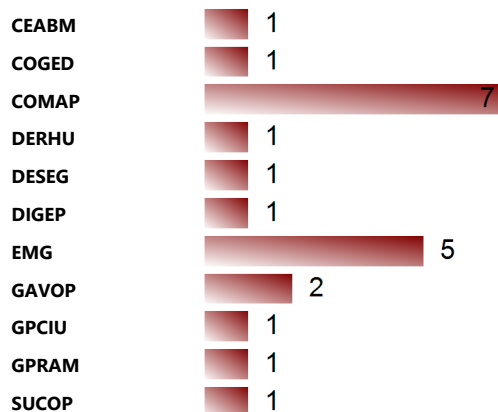




4 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os Projetos Estratégicos obtiveram uma execução total de 74.28%. O valor representa a média dos resultados obtidos na execução dos 22 projetos estratégicos. O painel abaixo expõe a realização até 2023, comparada as faixas de avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 80%). Os Projetos Estratégicos do CBMDF, para os anos 2017-2024 estão na faixa amarela, na medição realizada em 3 de Novembro de 2023.

A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está disposto no painel abaixo.

EXECUÇÃO DOS PROJETOS


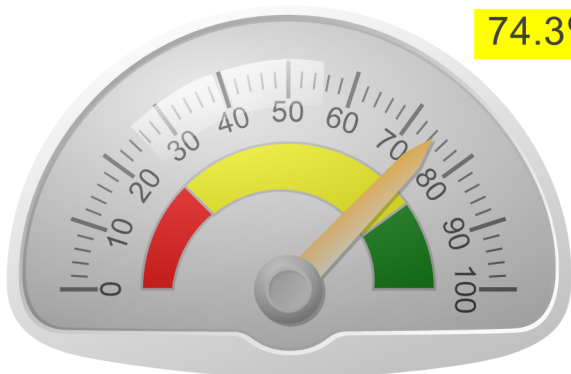


STATUS DOS PROJETOS		TOTAL
!	Atrasado	8
✓	Concluído	10
▶	Em andamento	1
	Paralisado	3
TOTAL		22




4.1 Desempenho dos Projetos Estratégicos por Setor



4.1.1 Apoio




4.1.2 Assessoramento



4.1.3 Direção Geral




4.1.4 Direção Setorial






4.1.5 Execução


GPCIU - 100.0%




GAVOP - 58.8%



GPRAM - 90.7%




SUCOP - 82.8%



4.1.7 Planejamento

EMG - 100.0%



4.2 Resultados dos Projetos Estratégicos

Os resultados referentes a cada projeto estratégico estão demonstrados na tabela abaixo.

PROJETO	OBM	ADESÃO À METODOLOGIA	STATUS DO PROJETO
Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate	GAVOP	80.00%	⚠ Atrasado (24.40%)
Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal	GPRAM	60.00%	⚠ Atrasado (90.69%)
Aquisição de um avião de transporte de tropa	GAVOP	80.00%	▶ Em andamento (93.19%)
Atualização do PLANES 2017-2024	EMG	100.00%	✓ Concluído (100.00%)
Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos	EMG	100.00%	✓ Concluído (100.00%)
Conscientização contra violência doméstica	COGED	100.00%	✓ Concluído (100.00%)
Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente	COMAP	80.00%	⚠ Atrasado (31.82%)
Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia	COMAP	80.00%	⚠ Atrasado (89.27%)



Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães	COMAP	80.00%		Paralisado (68.21%)
Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede	COMAP	80.00%	!	Atrasado (0.00%)
Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM	COMAP	80.00%		Paralisado (47.68%)
Criação da Fundação 193	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	CEABM	75.00%	!	Atrasado (0.00%)
Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implementar a Política de Saúde	DERHU	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Implementar a Política de Segurança contra Incêndio	DESEG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Publicação da Portaria da PTTC	EMG	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação	DIGEP	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Realizar eventos técnico-científicos	GPCIU	100.00%	✓	Concluído (100.00%)
Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências	SUCOP	60.00%	!	Atrasado (82.82%)
Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - Gama	COMAP	80.00%	!	Atrasado (52.89%)
Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro Militar - Vila Planalto	COMAP	80.00%		Paralisado (53.13%)



5 DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a SEGEP /EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 22 projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 completa-se este ciclo estratégico e o percentual máximo atingível é 100% dos projetos realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a data de início e término.



5.1 Detalhamento dos Projetos Estratégicos



24.40%

PROJETO:

ATRASADO

Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	GAVOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb EDUARDO
PROCESSO SEI	00053-00082852/2019-64

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
DOD	DOD	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
ETP	ETP	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
PAM	PAM	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
Plano de negócios	Plano de negócios	CONCLUÍDA	8/3/2022	8/3/2022
Pesquisa de preços	Pesquisa de preços	CONCLUÍDA	10/3/2022	10/3/2022
Termo de Referência	Termo de Referência	CONCLUÍDA	11/29/2022	11/29/2022
Intrusão processual pela SULIC	Intrusão processual pela SULIC	ATRASADA	1/30/2023	1/30/2023
Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	ATRASADA	2/6/2023	2/6/2023
Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI	Retorno a SULIC para encerramento do processo de planejamento e abertura do processo licitatório da fase externa para a COPLI	ATRASADA	2/13/2023	2/13/2023
Elaboração da minuta de edital pelo pregoeiro, encaminhando para ASJUR	Elaboração da minuta de edital pelo pregoeiro, encaminhando para ASJUR	ATRASADA	4/13/2023	4/13/2023
Avaliação da minuta de edital pela ASJUR para encaminhamento a Procuradoria Geral do DF	Avaliação da minuta de edital pela ASJUR para encaminhamento a Procuradoria Geral do DF	ATRASADA	4/27/2023	4/27/2023
Análise da PGDF	Análise da PGDF	ATRASADA	7/24/2023	7/24/2023
Despacho do Comando Geral e encaminhamento a COPLI para prosseguimento	Despacho do Comando Geral e encaminhamento a COPLI para prosseguimento	ATRASADA	7/31/2023	7/31/2023
Elaboração do edital pelo pregoeiro	Elaboração do edital pelo pregoeiro	ATRASADA	8/7/2023	8/7/2023
Envio do extrato de publicação do aviso de abertura de licitação	Envio do extrato de publicação do aviso de abertura de licitação	ATRASADA	8/21/2023	8/21/2023
Abertura do certame	Abertura do certame	ATRASADA	9/21/2023	9/21/2023
Adjudicação e homologação do Pregão	Adjudicação e homologação do Pregão	ATRASADA	9/26/2023	9/26/2023
Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	ATRASADA	9/28/2023	9/28/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	ATRASADA	10/10/2023	10/10/2023
Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	ATRASADA	10/24/2023	10/24/2023
Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	A INICIAR	11/7/2023	11/7/2023
Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	A INICIAR	11/14/2023	11/14/2023
Nomeação da comissão executora de contrato	Nomeação da comissão executora de contrato	A INICIAR	11/16/2023	11/16/2023
Adoção dos atos necessários para a abertura de carta de crédito internacional (ou para a antecipação de pagamento pelo CBMDF, mediante a apresentação de de garantia de pagamento)	Adoção dos atos necessários para a abertura de carta de crédito internacional (ou para a antecipação de pagamento pelo CBMDF, mediante a apresentação de de garantia de pagamento)	A INICIAR	12/14/2023	12/14/2023
Entrega do equipamento/material/equipamento	Entrega do equipamento/material/equipamento	A INICIAR	12/14/2024	12/16/2024

ADESÃO À METODOLOGIA


80.00%
(10/10/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo o referido Projeto passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 095/2020 e foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Eduardo Furquim Freire da Silva.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente, que não efetuou nenhum report.

REPORT DO GERENTE: O gerente anterior efetuou seu último report em 29/11/2022 associado ao terno de referência.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



90.69%

PROJETO:**ATRASADO****Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	GPRAM
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Comb MARTINS DA SILVA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Compra de Correa laminada para abafador	DOD	CONCLUÍDA	3/8/2017	4/3/2017
	DFD	CONCLUÍDA	4/3/2017	6/20/2017
	PAM	CONCLUÍDA	6/20/2017	10/2/2017
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	3/8/2017	3/11/2017
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	3/11/2017	4/3/2017
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	4/3/2017	5/30/2017
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	5/30/2017	6/20/2017
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	6/20/2017	7/10/2017
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	7/10/2017	10/2/2017
Compra de Motosserra média	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Perfurador de Solo	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
DOD	Produção DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/5/2019
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2019	2/25/2019
Compra de Motopoda	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Soprador Kawashima	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Mochila de hidratação	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	4/23/2019
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2019	5/14/2019
Compra de Roupa de Apicultor	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Motosserra pequena	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Motosserra grande	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Roçadeira	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
Compra de Mangueira Mark3	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2019	2/25/2019
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2019	5/14/2019
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2019	6/3/2019
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2019	8/26/2019
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2020	2/5/2020
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2020	2/26/2020
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/25/2020	4/22/2020
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/23/2020	5/14/2020
Compra de Facção	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2020	2/26/2020
	DFD	CONCLUÍDA	2/25/2020	5/14/2020
	PAM	CONCLUÍDA	5/14/2020	8/26/2020
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/14/2020	6/3/2020
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	6/3/2020	8/26/2020
DOD	Produção de DOD	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/3/2021
	Tramitação DOD	CONCLUÍDA	2/5/2021	2/26/2021
Compra de GPS	DOD	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/26/2021
	DFD	CONCLUÍDA	2/26/2021	5/14/2021
	PAM	CONCLUÍDA	5/13/2021	8/23/2021
DFD	Produção de DFD	CONCLUÍDA	2/26/2021	4/26/2021
	Tramitação DFD	CONCLUÍDA	4/26/2021	5/14/2021
PAM	Produção de PAM	CONCLUÍDA	5/13/2021	6/2/2021
	Tramitação PAM	CONCLUÍDA	5/31/2021	8/23/2021
EPIs Florestal	EPIs Florestal	EM ANDAMENTO	9/12/2022	12/31/2024
PAM - DIMAT	PAM - DIMAT	CONCLUÍDA	9/21/2023	9/21/2023
Abertura de Edital - DICOA	Abertura de Edital - DICOA	CONCLUÍDA	9/21/2023	9/21/2023
Seleção da Melhor Proposta - DICOA	Seleção da Melhor Proposta - DICOA	ATRASADA	9/21/2023	9/29/2023



ADESÃO À METODOLOGIA

 60.00% (10/10/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✗
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal, inserido no PLANES 2017-2024 e foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 18/06/2022, foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Comb. Neil Martins da Silva.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em andamento conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report ainda remete a 15/06/2023, sem mais atualizações.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, além de estar em conformidade com sua EAP e cronograma. Contudo, não há atualizações por parte do gerente de projeto.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



93.19%

PROJETO:

EM ANDAMENTO

Aquisição de um avião de transporte de tropa

OBJETIVO ESTRATÉGICO	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI's
SETOR RESPONSÁVEL	GAVOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Pimentel
PROCESSO SEI	00053-00036529/2019-19

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Plano de Negócio	Plano de Negócio	CONCLUÍDA	5/14/2020	5/14/2020
Termo de Referência	Termo de Referência	CONCLUÍDA	10/27/2020	10/27/2020
Termo de Conferência	Termo de Conferência	CONCLUÍDA	6/29/2021	6/29/2021
Acordo de Cooperação Técnica	Acordo de Cooperação Técnica	CONCLUÍDA	12/2/2021	12/2/2021
Pesquisa de Preços	Pesquisa de Preços	CONCLUÍDA	3/29/2022	3/30/2022
PAM	PAM	CONCLUÍDA	4/4/2022	4/4/2022
Declaração de Orçamento	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	6/10/2022	6/10/2022
Publicação do Edital	Publicação do Edital	CONCLUÍDA	8/31/2022	8/31/2022
Abertura do certame	Abertura do certame	CONCLUÍDA	9/1/2022	3/31/2023
Inserção do código PARF 2023 pelo EMG	Inserção do código PARF 2023 pelo EMG	CONCLUÍDA	2/6/2023	2/6/2023
Prazo de 30 dias de publicidade do edital (licitação internacional)	Prazo de 30 dias de publicidade do edital (licitação internacional)	CONCLUÍDA	2/22/2023	3/24/2023
Adjudicação e homologação do Pregão	Adjudicação e homologação do Pregão	CONCLUÍDA	3/24/2023	3/31/2023
Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	Publicidade final dos autos (adjudicação e homologação)	CONCLUÍDA	4/3/2023	4/7/2023
Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	Elaboração da Ata de Registro de Preços e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Beneficiária da ARP)	CONCLUÍDA	4/10/2023	4/21/2023
Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	Elaboração, pelo Setor Demandante, da requisição de objeto registrado em ARP	CONCLUÍDA	4/24/2023	5/4/2023
Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	Processamento do pedido de aquisição de objeto registrado em ARP	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	Elaboração do instrumento de contrato e colhimento da assinatura das partes (CBMDF x Contratante)	CONCLUÍDA	7/14/2023	7/25/2023
Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	Encaminhamento a DIOFI para pronunciamento orçamentário	CONCLUÍDA	7/21/2023	7/25/2023
Nomeação da comissão executora de contrato	Nomeação da comissão executora de contrato	CONCLUÍDA	7/26/2023	7/28/2023
Entrega do equipamento/material/equipamento	Entrega do equipamento/material/equipamento		11/1/2024	11/27/2024



ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (10/11/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✗
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✓
✓ SIM		✗ NÃO		— NÃO SE APLICA		! NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de um avião de transporte de tropa , inserido no PLANES 2017-2024 e não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo o referido Projeto passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 195/2020 e foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Noberto Magno Marins Pimentel.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. Contudo, o projeto encontra-se com status ATRASADO em conformidade com suas tarefas e cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 11/09/2023 o gerente reporta o pagamento da 1ª parcela, restando 17 meses para a entrega do bem.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Atualização do PLANES 2017-2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.03 Definir política e diretrizes da gestão estratégica
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	1º TEN QOBM/Comb DA CÃ,MARA LINHARES
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Diagnóstico estratégico externo e interno	Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários	CONCLUÍDA	3/3/2022	9/10/2022
	Elaboração de Matriz SWOT Cruzada	CONCLUÍDA	10/7/2022	10/7/2022
	Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários - COMOP	CONCLUÍDA	10/7/2022	1/13/2023
Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários	Organização e compilação das matrizes SWOTs elaboradas no CBMDF	CONCLUÍDA	3/3/2022	3/9/2022
	Elaboração do questionário digital de atualização do PLANES 2017-2024	CONCLUÍDA	3/12/2022	4/18/2022
	Elaboração e identificação de todas as seções e unidades do CBMDF onde o questionário será respondido	CONCLUÍDA	4/19/2022	5/24/2022
	Distribuição do processo para resposta do Questionário Digital	CONCLUÍDA	5/27/2022	7/8/2022
	Tabulação e consolidação dos dados	CONCLUÍDA	7/25/2022	9/10/2022
Levantamento das oportunidades, ameaças externas e forças e fraquezas internas construção de cenários - COMOP	Organização e compilação das matrizes SWOTs elaboradas no CBMDF	CONCLUÍDA	10/7/2022	1/13/2023
Atualização do PLANES	Proposta de ações para Retirar e/ou substituir iniciativas obsoletas	CONCLUÍDA	3/11/2023	3/13/2023
	Validar da 12ª Reunião de Governança	CONCLUÍDA	3/15/2023	3/15/2023
	Realizar as alterações no documento word do PLANES	CONCLUÍDA	3/23/2023	3/23/2023
Publicação da Atualização	Elaboração de Minuta da Nota de Boletim e Envio ao Gabinete	CONCLUÍDA	3/23/2023	4/6/2023
	Publicação em BG	CONCLUÍDA	4/12/2023	4/26/2023



ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(1/4/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO
----------	----------	--------------------	------------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

18/04/2023

Atualização publicada no Boletim Geral 073, de 18 de abril de 2023.

Foi feito um questionário com todas as seções do CBMDF o que possibilitou a detecção das iniciativas obsoletas presentes no planejamento estratégico. Aliado a isso, verificou-se quais as iniciativas estratégicas que não possuíam nenhum projeto estratégico, o que também a tornava obsoleta. Após essa etapa, foi realizada a validação das sugestões do PLANES 2017-2024 pela SEGEF na 12ª Reunião de Governança. Em seguida, foi enviada a versão final para publicação



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	04. Consolidar a governança corporativa.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o desenvolvimento corporativo
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos nos cursos de formação, especialização e preparatório para oficiais da Corporação	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAO adm	CONCLUÍDA	7/25/2017	8/16/2018
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CHO	CONCLUÍDA	3/22/2018	4/27/2018
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAEO	CONCLUÍDA	6/20/2018	4/17/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CFO	CONCLUÍDA	2/3/2020	4/14/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos para o CAO combatente	CONCLUÍDA	12/10/2020	9/6/2021
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CPO	CONCLUÍDA	3/23/2022	3/21/2023
Elaboração de Videoaulas	Elaboração de videoaulas de Gerenciamento de Projetos	CONCLUÍDA	4/1/2018	12/10/2020
	Elaboração de videoaulas de Gestão de Riscos	CONCLUÍDA	2/1/2021	6/30/2021
	Elaboração de videoaula de Gestão de Processos	CONCLUÍDA	3/1/2021	3/12/2021
	Elaboração e publicação de videoaulas a respeito das boas práticas de Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/20/2021	12/19/2022
	Elaboração de videoaulas de Estratégia	CONCLUÍDA	6/21/2021	7/9/2021

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (5/16/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



16/05/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o desenvolvimento corporativo

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de capacitação os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos deve continuar de forma ininterrupta, assim o presente projeto se transforma em processos testados e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Somente por meio de constantes esforços de capacitação nos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios será possível implementar na cultura organizacional do CBMDF os conceitos, legislações e boas práticas relacionadas aos temas estratégicos, conferindo aos nossos militares habilidades e capacidades para atuarem na Administração Pública, instrumentalizando-os para o atual contexto desse segmento, considerando a estrutura do CBMDF e, principalmente, os atores envolvidos no processo de Gestão e Governança.

Status do projeto: concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Conscientização contra violência doméstica

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	COGED
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb CRISTIANE
PROCESSO SEI	N/A

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar (GAEPH)	POP sobre atendimento a mulheres vítimas de violência	CONCLUÍDA	2/1/2021	5/31/2021
	I Ciclo de Palestras de APH - Violência Doméstica	CONCLUÍDA	5/24/2023	5/24/2023
Centro de Comunicação Social - CECOM	Divulgação de vídeo institucional nas redes sociais	CONCLUÍDA	2/6/2023	2/28/2023
Corregedoria - COGED	Palestra sobre os aspectos legais da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e as consequências correcionais	CONCLUÍDA	5/15/2023	5/15/2023
	Palestra sobre os aspectos sócio-culturais da violência doméstica	CONCLUÍDA	5/15/2023	5/15/2023
Centro de Assistência Bombeiro Militar - CEABM	Palestra sobre os aspectos psicossociais da violência doméstica: impactos e possibilidades de intervenção	CONCLUÍDA	5/15/2023	5/15/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (5/17/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	—	Reports atualizados	✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



01/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Conscientização contra violência doméstica, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.04: Implementar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. Cristiane Fernandes Simões, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas foram concluídas por meio de eventos relevantes e efetivos no combate à violência doméstica cumprindo os prazos estabelecidos no cronograma. Essas atividades relacionadas ao combate da violência doméstica se tornarão uma rotina no CBMDF, assim o tema não está exaurido pela conclusão deste projeto que foi um esforço temporário para a criação de uma cultura voltada ao combate da violência doméstica.

Status do projeto: Concluído.



31.82%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm GOMES DA SILVA
PROCESSO SEI	00053-00023776/2020-99

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Cessão do terreno para construção da unidade	Solicitação aos órgãos do GDF	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/17/2020
	Trâmite processual no GDF	CONCLUÍDA	3/17/2020	8/31/2020
	Incorporação do terreno à carga do CBMDF	ATRASADA	8/31/2020	9/30/2020
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	3/3/2020	3/3/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	3/3/2020	5/12/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	5/27/2020	8/4/2021
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	4/9/2020	4/25/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	4/25/2020	5/10/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/24/2020
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	4/10/2020	11/22/2020
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	4/11/2020	11/25/2020
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	4/10/2020	5/9/2020
	Nova proposta	CONCLUÍDA	5/10/2020	5/31/2020
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	5/31/2020	7/1/2020
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	7/16/2020	7/17/2020
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	7/17/2020	8/1/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	8/1/2020	8/5/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	4/9/2020	5/24/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
2 - LV - Levantamentos	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	4/11/2020	4/25/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	3/26/2021	7/25/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	CONCLUÍDA	4/11/2020	9/16/2020
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	9/16/2020	3/4/2021
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	3/4/2021	3/5/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	4/11/2020	11/25/2021
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	4/11/2020	8/20/2020
	Atendimento	CONCLUÍDA	8/20/2020	9/16/2020
Projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura	CONCLUÍDA	4/17/2020	5/16/2020
	Designação da Comissão Executora do Contrato	CONCLUÍDA	5/17/2020	6/13/2020
	Aprovação dos projetos	ATRASADA	6/14/2020	4/27/2021
	Fornecimento do laudo de sondagem geotécnica do terreno	ATRASADA	4/30/2021	8/16/2021
	Entrega dos projetos finais de arquitetura, engenharia e orçamento	ATRASADA	8/17/2021	12/14/2021
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	6/2/2020	10/30/2021
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	6/2/2020	10/31/2021
	- Documentação Cadastral o imóvel	ATRASADA	6/12/2020	1/26/2022
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	3/3/2020	8/4/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	ATRASADA	6/2/2020	1/26/2022
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	9/16/2020	9/19/2020
	Atendimento	CONCLUÍDA	9/19/2020	3/4/2021
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	ATRASADA	11/27/2020	4/18/2021
	6.3 - SEGETH / CAP	ATRASADA	4/7/2021	10/19/2021
	COMAER/CINDACTA	ATRASADA	5/28/2021	5/28/2021
	6.4 - NOVACAP	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.5 - CEB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
	6.6 - CAESB	ATRASADA	6/27/2021	11/25/2021
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	Pavimentação	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/26/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/26/2021	7/18/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	9/25/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	4/28/2021	9/26/2021
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	11/27/2020	11/25/2021
	INC - Incêndio	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	9/26/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	4/28/2021	1/12/2022
	EST - Estrutura	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	FND - Fundações	ATRASADA	7/28/2021	10/17/2021
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	9/1/2021	10/10/2021
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	10/11/2021	11/25/2021
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	10/12/2021	11/25/2021
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	10/13/2021	11/25/2021
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	10/24/2021	11/14/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	4/28/2021	11/7/2021
	Estrutura Metálica	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/17/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Memoriais	ATRASADA	11/10/2021	11/17/2021
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	4/28/2021	11/17/2021
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	4/28/2021	10/27/2021
	ELE - Sistema Elétrico	ATRASADA	7/31/2021	1/12/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	ATRASADA	11/27/2020	11/18/2021
	ACE - Acessibilidade	ATRASADA	4/28/2021	11/25/2021
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	5/26/2021	8/25/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	8/25/2021	11/25/2021
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022
	SPDA	ATRASADA	7/1/2021	11/25/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	PARALIZADA	7/1/2021	9/30/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	7/7/2021	11/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	9/30/2021	11/25/2021
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	7/10/2021	8/10/2021
	Pagamento	ATRASADA	8/10/2021	9/9/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	ATRASADA	9/9/2021	9/14/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	5/9/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/9/2021	7/18/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/18/2021	7/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/8/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/8/2021	8/8/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	PARALIZADA	4/28/2021	5/23/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	5/23/2021	7/24/2021
	Detalhamento	ATRASADA	7/24/2021	8/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	8/13/2021	8/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	8/28/2021	9/11/2021
	Memoriais	ATRASADA	9/11/2021	9/26/2021
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	4/28/2021	9/25/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	4/28/2021	8/19/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	7/28/2021	9/26/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/28/2021	8/4/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/4/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/8/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/8/2021	9/25/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/25/2021	10/3/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/3/2021	10/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	ATRASADA	5/26/2021	7/25/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	7/25/2021	8/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Quantitativos	ATRASADA	8/15/2021	8/25/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	ATRASADA	11/27/2020	9/22/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/16/2021
	Detalhamentos	ATRASADA	9/22/2021	10/10/2021
	Quantitativos	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	Memorial Descritivo	ATRASADA	10/24/2021	10/31/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	10/31/2021	11/18/2021
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/25/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	PARALIZADA	8/12/2021	9/25/2021
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	4/28/2021	7/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	7/25/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/6/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/6/2021	10/24/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/24/2021	10/27/2021
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	ATRASADA	9/1/2021	2/11/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	2/12/2022	2/13/2022
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	2/13/2022	8/6/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	7/28/2021	8/25/2021
	Quantitativo	ATRASADA	8/25/2021	9/12/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	9/12/2021	9/26/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	4/28/2021	7/11/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/11/2021	8/25/2021
	Detalhamento	ATRASADA	8/25/2021	9/25/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	9/25/2021	10/10/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/10/2021	10/24/2021
	Memoriais	ATRASADA	10/24/2021	11/7/2021
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	2/24/2021	1/19/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Caderno de especificações	ATRASADA	11/18/2021	1/19/2022
	Quantitativo	ATRASADA	11/18/2021	1/19/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	7/31/2021	8/19/2021
	Lançamento do sistema	ATRASADA	8/12/2021	9/25/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	9/25/2021	11/29/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/29/2021	12/13/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/13/2021	12/28/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/28/2021	1/5/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/5/2022	1/12/2022
Plano de Recursos	Captação	ATRASADA	12/17/2021	3/15/2022
	Contrapartida	ATRASADA	3/18/2022	3/29/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	2/11/2022	5/9/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	2/12/2022	3/14/2022
	Projeto Básico	ATRASADA	3/14/2022	3/19/2022
	Projeto Básico - Aprovação	ATRASADA	3/16/2022	3/16/2022
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	ATRASADA	4/1/2022	7/16/2022
	Edital de Licitação publicado	ATRASADA	7/17/2022	7/26/2022
	Divulgação do edital de Licitação	ATRASADA	7/29/2022	8/29/2022
	Habilitação dos Licitantes	ATRASADA	8/30/2022	9/29/2022
	Julgamento da proposta	ATRASADA	9/30/2022	10/16/2022
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	ATRASADA	10/17/2022	10/24/2022
	Contratação da empresa executora da obra	ATRASADA	10/25/2022	11/15/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	ATRASADA	4/5/2022	4/5/2022
	Edital	ATRASADA	4/9/2022	4/9/2022
	Definição da modalidade de licitação	ATRASADA	4/13/2022	4/13/2022
	Aprovação do setor jurídico	ATRASADA	5/1/2022	5/1/2022
	Edital - Publicação	ATRASADA	5/11/2022	5/11/2022
	Julgamento das propostas	ATRASADA	6/11/2022	6/11/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	ATRASADA	6/13/2022	6/13/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	ATRASADA	6/21/2022	6/21/2022
	Comissão Executora - Publicação	ATRASADA	7/1/2022	7/2/2022
	Ordem de serviço inicial	ATRASADA	7/3/2022	7/3/2022
Execução da obra	Serviços complementares	ATRASADA	7/13/2022	7/13/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	7/13/2022	7/13/2023
	Serviços preliminares	ATRASADA	7/13/2022	3/12/2023
	Fundações e estruturas	ATRASADA	7/13/2022	2/10/2023
	Impermeabilizações	ATRASADA	10/12/2022	5/12/2023
	Arquitetura e elementos de urbanismo	ATRASADA	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	ATRASADA	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	ATRASADA	10/12/2022	7/13/2023
	Instalações mecânicas e de utilidades	ATRASADA	1/10/2023	6/12/2023
	Proteção contra incêndio e pânico	ATRASADA	1/10/2023	6/12/2023
	Equipamentos	ATRASADA	4/27/2023	7/13/2023
Licenças Prévias	Licença ambiental	ATRASADA	11/18/2022	12/16/2022
	Licença edilícia	ATRASADA	12/17/2022	1/15/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	ATRASADA	7/13/2023	8/12/2023
	Recebimento definitivo	ATRASADA	8/12/2023	9/12/2023
	Habite-se	ATRASADA	9/13/2023	11/13/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (10/10/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023

Dados de Oficialização do Projeto: Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG N.º 098/20. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial conforme BG n.º 111/2023.

Dados do Gerente Atual: Publicado em BG N.º 228/20 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva em substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes.

Dados de Execução do Projeto: TAP aprovado e publicada no BG N.º 098/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado em conformidade com suas tarefas e cronograma.

Report do Gerente: Último report em 02/08/2023 o gerente de projeto fez seu último report no GPWeb onde é informado a conclusão da tarefa "Trâmite processual no GDF" entre outros.

Análise do Supervisor: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, novos reports foram realizados no GPWeb.

Status do Projeto: ATRASADO no GPWeb.



89.27%

PROJETO:**ATRASADO****Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda
PROCESSO SEI	00053-00047244/2019-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/3/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/3/2018	7/12/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	7/27/2018	10/4/2019
1 - EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/3/2018	10/4/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/2/2018	3/27/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/9/2018	6/25/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/10/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/24/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	6/10/2018	1/22/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	6/11/2018	1/25/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	6/10/2018	7/9/2018
	Nova proposta	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/31/2018
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	7/31/2018	8/31/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	9/15/2018	9/16/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	9/16/2018	10/1/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/9/2018	7/24/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	6/11/2018	6/25/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/26/2019	9/24/2019
	2.3 - Concessionárias	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	6/11/2018	10/20/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/20/2018	11/16/2018
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/30/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/31/2019
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	8/12/2018	3/27/2020
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	11/16/2018	11/19/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	11/19/2018	5/4/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/27/2019	6/18/2019
	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	6/7/2019	12/19/2019
	COMAER/CINDACTA	CONCLUÍDA	7/28/2019	9/6/2019
	CEB	CONCLUÍDA	5/22/2020	7/3/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/25/2020
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	6/28/2019	3/13/2020
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	9/27/2019	12/17/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	11/1/2019	12/10/2019
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/11/2019	1/25/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	12/12/2019	1/25/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	12/13/2019	1/25/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/14/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	CONCLUÍDA	6/11/2018	11/16/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	11/16/2018	5/4/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	5/4/2019	5/5/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	Pavimentação	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/25/2019
	SAN - Instalações Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	10/19/2019
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	9/27/2019	11/26/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/26/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	11/25/2019
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	Estrutura Metálica	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/6/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/27/2019
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/17/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/17/2019	12/31/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	1/10/2020	1/17/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/18/2020
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	PAI - Paisagismo	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
	Comunicação Visual	CONCLUÍDA	10/25/2019	1/25/2020
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/24/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/15/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	10/15/2019	10/25/2019
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
INC - Incêndio	SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	1/25/2020
SPDA	Dimensionamento SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	11/30/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	9/6/2019	1/25/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	11/30/2019	1/25/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	9/9/2019	10/10/2019
	Pagamento	CONCLUÍDA	10/10/2019	11/9/2019
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	11/9/2019	11/14/2019
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/23/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/23/2019	9/23/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/23/2019	10/13/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	10/13/2019	10/28/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/28/2019	11/11/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	11/11/2019	11/26/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/4/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	10/4/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/8/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/8/2019	11/25/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/3/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/17/2019
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/17/2020
	SON - Sonorização e CFTV	CONCLUÍDA	6/28/2019	12/27/2019
	ELE -Sistema Elétrico	CONCLUÍDA	9/30/2019	3/13/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/9/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	10/8/2019
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	1/27/2019	11/22/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	11/22/2019	12/10/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/31/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	12/31/2019	1/18/2020
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/1/2019	4/12/2020
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	4/13/2020	4/14/2020
	Acompanhamento do processo	CONCLUÍDA	4/14/2020	10/5/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/25/2019
	Quantitativo	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/12/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	11/12/2019	11/26/2019
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/10/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/10/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/7/2020
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	1/29/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	1/29/2020	2/12/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	2/12/2020	2/27/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	2/27/2020	3/6/2020
	Memoriais	CONCLUÍDA	3/6/2020	3/13/2020
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	4/13/2020	5/13/2020
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/13/2020	5/18/2020
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/8/2020
	Edital	CONCLUÍDA	6/8/2020	7/10/2020
	Aprovação do setor jurídico	CONCLUÍDA	6/25/2020	7/9/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Definição da modalidade de licitação	CONCLUÍDA	6/25/2020	6/25/2020
	Edital - Publicação	CONCLUÍDA	7/15/2020	7/15/2020
	Adjudicação do vencedor da licitação	CONCLUÍDA	8/15/2020	8/17/2020
	Julgamento das propostas	CONCLUÍDA	8/15/2020	8/17/2020
Aprovação de projeto na CEB	Aprovação de projeto na CEB	CONCLUÍDA	7/22/2020	7/22/2020
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	8/20/2020	8/20/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	8/30/2020	8/31/2020
	Alvará de Construção - Emissão	CONCLUÍDA	9/1/2020	9/1/2020
	Ordem de serviço inicial	CONCLUÍDA	9/3/2020	9/3/2020
Execução da obra	Serviços preliminares	CONCLUÍDA	9/6/2020	5/6/2021
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	9/11/2020	9/11/2021
	Fundações e estruturas	ATRASADA	9/11/2020	4/11/2021
	Arquitetura e elementos de urbanismo	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações mecânicas e de utilidades	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Proteção contra incêndio e pânico	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Equipamentos	ATRASADA	6/26/2021	9/11/2021
	Impermeabilizações	ATRASADA	1/6/2023	4/17/2023
	Instalações elétricas e eletrônicas	ATRASADA	6/2/2023	8/31/2023
	Instalações hidráulicas e sanitárias	ATRASADA	6/15/2023	8/31/2023
	Serviços complementares	ATRASADA	6/16/2023	9/22/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	ATRASADA	9/26/2023	11/10/2023
	Recebimento definitivo	ATRASADA	10/17/2023	11/17/2023
	Habite-se	A INICIAR	11/21/2023	1/31/2024

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (10/11/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✗
 SIM	 NÃO		 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



11/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20. Este projeto encontra-se em acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva em substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 137/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado em conformidade com suas tarefas e cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 26/07/2023 informado sobre o andamento das "Instalações elétricas e eletrônicas".

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e de acompanhamento especial.

STATUS DO PROJETO: ATRASADO no GPWeb.



68.21%

PROJETO:

PARALISADO

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda
PROCESSO SEI	00053-00094716/2019-17

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início dos trabalhos	Início dos trabalhos	CONCLUÍDA	8/10/2017	11/15/2019
Projeto Legal	Análise e Cumprimento de Exigências - CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	7/20/2018
	Emissão de ART pelo COMAP	CONCLUÍDA	5/25/2018	6/4/2018
	Emitir ART para pagamento pelo CBMDF	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/23/2018
	Enviar ART e Projeto Legal aprovado para receber Carimbo - CAP	CONCLUÍDA	7/17/2018	7/24/2018
	ANVISA/VISA	CONCLUÍDA	4/30/2019	4/30/2019
Levantamento Preliminar	Cadastro protocolo CAP	CONCLUÍDA	10/31/2017	3/20/2018
Contratação de Sondagem	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM	CONCLUÍDA	1/11/2018	10/31/2018
FASE I - ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO	1) Projeto executivo	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/14/2018
	3) MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	7/19/2018	7/27/2018
	2) CET - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	8/13/2018	8/31/2018
FASE II - PROJETOS DE ENGENHARIA	1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	CONCLUÍDA	7/18/2018	8/15/2018
	2) ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	8/15/2018	9/3/2018
	4) ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	8) INC - Incêndio	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	3) RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	5) INF - Infraestruturas	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
	6) EST - Estrutural	CONCLUÍDA	9/10/2018	10/1/2018
	7) FND - Fundações	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/8/2018
FASE III - ORÇAMENTO	1) Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	8/1/2018	11/15/2018
	2) Orçamento	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/10/2018
	3) Curva ABC	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
	4) BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE III - ORÇAMENTO	5) CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	10/22/2018	7/26/2019
1) HID - Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias	Projeto HID	CONCLUÍDA	7/18/2018	7/31/2018
	Projeto SAN	CONCLUÍDA	7/30/2018	8/7/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/7/2018	8/15/2018
2) ELE - Instalações Elétricas	Projeto ELE	CONCLUÍDA	8/15/2018	8/28/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
8) INC - Incêndio	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/28/2018	8/28/2018
4) ARC - Ar Condicionado	Projeto ARC	CONCLUÍDA	8/28/2018	9/3/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	8/30/2018	8/31/2018
3) RDL - Rede de Dados Lógicos	Projeto RDL	CONCLUÍDA	9/3/2018	9/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/5/2018
5) INF - Infraestruturas	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/6/2018
	Projeto INF	CONCLUÍDA	9/5/2018	9/10/2018
6) EST - Estrutural	Projeto EST	CONCLUÍDA	9/10/2018	9/28/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	9/27/2018	9/28/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	9/27/2018	10/1/2018
2) Orçamento	- CPU	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/1/2018
	- Planilha (Analítico Sintético)	CONCLUÍDA	10/10/2018	10/10/2018
7) FND - Fundações	Projeto FND	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
	MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
	MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	10/5/2018	10/8/2018
FASE IV - LICITAÇÃO	PES - Envio	CONCLUÍDA	8/13/2019	9/4/2019
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/5/2019	9/8/2019
	Aval da SELOF/EMG	CONCLUÍDA	9/9/2019	9/10/2019
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	9/11/2019	9/22/2019
	Edital - Juntada de documentação	CONCLUÍDA	10/23/2019	11/5/2019
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	11/6/2019	1/29/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
FASE IV - LICITAÇÃO	Edital - Aprovação da assessoria jurídica	CONCLUÍDA	1/30/2020	2/5/2020
	Distribuição de autos - COPLI	CONCLUÍDA	2/6/2020	3/5/2020
	Edital RDC nº 05/2020 - Publicação DODF/DOU	CONCLUÍDA	3/6/2020	4/5/2020
	Publicação - Adjudicação da empresa contratada	CONCLUÍDA	4/6/2020	4/16/2020
	Nota de Empenho	CONCLUÍDA	4/17/2020	4/22/2020
	Contrato - formalização	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/28/2020
FASE V - RITO CONTRATUAL PRELIMINAR	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	5/7/2020	5/7/2020
	Termo de responsabilidade do executor	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Ordem de Serviço - Emissão	CONCLUÍDA	5/25/2020	5/25/2020
	Emissão do Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/28/2020	6/20/2020
FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA	1ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	7/16/2020
	2ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	3ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	4ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	5ª medição	CONCLUÍDA	5/20/2020	5/20/2020
	6ª medição	CONCLUÍDA	12/1/2020	12/30/2020
	7ª medição	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/28/2021
	8ª medição	CONCLUÍDA	6/14/2021	6/30/2021
	9ª Medição	PARALIZADA	2/1/2022	3/1/2022
	10ª Medição	PARALIZADA	1/23/2023	1/23/2023
	11ª Medição	PARALIZADA	2/1/2023	2/2/2023
	12ª Medição	PARALIZADA	3/1/2023	3/3/2023
	Expiração de prazo de execução	CONCLUÍDA	7/19/2023	7/20/2023
	Levantamento de remanescente de obra	ATRASADA	7/19/2023	9/15/2023
FASE VII - RECEBIMENTO DA OBRA	Recebimento provisório	ATRASADA	2/27/2021	3/15/2024
	Recebimento definitivo	A INICIAR	3/15/2024	4/10/2024
	Habite-se	A INICIAR	1/7/2027	1/7/2027
Reunião - retomada da obra	Reunião - retomada da obra	CONCLUÍDA	7/28/2023	7/29/2023
Pedido e plano de retomada	Pedido e plano de retomada	ATRASADA	7/29/2023	8/3/2023



ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (7/5/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição ao MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie com a nomeação publicada no BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do ex gerente, que não efetuou nenhum report. Contudo, Aguardando análise jurídica quanto à minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2020, conforme documento 72438046, processo SEI 00053-00117765/2021-50. Novo cronograma aprovado pela comissão, aguardando o cálculo do reajuste.

REPORT DO GERENTE: Em 20/10/2021, a ex-gerente de projeto, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi retomado e se encontra em atraso, porém em estado bem avançado de execução. Tão logo cesse o motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 5,21% restante da execução.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



0.00%

PROJETO:

ATRASADO

Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
EP - Estudos Preliminares	Inclusão no Plano de Obras	ATRASADA	6/1/2023	6/7/2023
	Inclusão no PARF	ATRASADA	6/7/2023	6/15/2023
	Programa de Necessidades	ATRASADA	6/15/2023	7/13/2023
ARQ - Arquitetura	Anteprojeto	ATRASADA	7/13/2023	8/10/2023
	Projeto Básico/Legal	ATRASADA	8/10/2023	11/7/2023
	Projeto Executivo	A INICIAR	11/7/2023	1/5/2024
LV - Levantamentos	Documentação do Imóvel	ATRASADA	7/13/2023	7/20/2023
	Levantamento Arquitetônico	ATRASADA	7/13/2023	7/27/2023
	TOP - Topografia	ATRASADA	7/27/2023	8/10/2023
	SDG - Sondagem	A INICIAR	11/7/2023	11/22/2023
EST - Estrutura	Lançamento	A INICIAR	11/7/2023	1/5/2024
	Detalhamento	A INICIAR	1/5/2024	3/4/2024
ARC - Ar Condicionado	ARC - Ar Condicionado	A INICIAR	1/5/2024	2/2/2024
ELE - Elétrica	ELE - Elétrica	A INICIAR	1/5/2024	4/2/2024
FND - Fundação	FND - Fundação	A INICIAR	1/5/2024	3/4/2024
HID - Instalações Hidrossanitária	HID - Instalações Hidrossanitária	A INICIAR	1/5/2024	4/2/2024
INF - Infraestrutura	INF - Infraestrutura	A INICIAR	1/5/2024	3/18/2024
IMP - Impermeabilização	IMP - Impermeabilização	A INICIAR	3/18/2024	4/16/2024
CAB - Cabeamento Estruturado	CAB - Cabeamento Estruturado	A INICIAR	4/2/2024	4/30/2024
SON - Sonorização	SON - Sonorização	A INICIAR	4/30/2024	5/15/2024
PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	PDA - Proteção contra Descarga Atmosférica	A INICIAR	5/15/2024	6/13/2024
INC - Incêndio	INC - Incêndio	A INICIAR	6/13/2024	7/11/2024
Compatibilização	Compatibilização	A INICIAR	7/11/2024	8/8/2024
PLO - Planilha Orçamentária	PLO - Planilha Orçamentária	A INICIAR	7/11/2024	9/5/2024
SEI - Processo da Licitação	SEI - Processo da Licitação	A INICIAR	9/5/2024	5/23/2025



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra - CEC	Medição 01	A INICIAR	5/23/2025	6/23/2025
	Medição 02	A INICIAR	6/23/2025	7/21/2025
	Medição 03	A INICIAR	7/21/2025	8/18/2025
	Medição 04	A INICIAR	8/18/2025	9/15/2025
	Medição 05	A INICIAR	9/15/2025	10/13/2025
	Medição 06	A INICIAR	10/13/2025	11/10/2025
	Medição 07	A INICIAR	11/10/2025	12/8/2025
	Medição 08	A INICIAR	12/8/2025	1/7/2026
	Medição 09	A INICIAR	1/7/2026	2/4/2026
	Medição 10	A INICIAR	2/4/2026	3/5/2026
	Medição 11	A INICIAR	3/5/2026	4/2/2026
	Medição 12	A INICIAR	4/2/2026	5/4/2026
	Medição 13	A INICIAR	5/4/2026	6/1/2026
	Medição 14	A INICIAR	6/1/2026	6/30/2026
	Medição 15	A INICIAR	6/30/2026	7/28/2026
	Medição 16	A INICIAR	7/28/2026	8/25/2026
	Medição 17	A INICIAR	8/25/2026	9/23/2026
	Medição 18	A INICIAR	9/23/2026	10/22/2026
	Medição 19	A INICIAR	10/22/2026	11/20/2026
	Medição 20	A INICIAR	11/20/2026	12/18/2026



80.00%
(10/10/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



10/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 07/07/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira em substituição a MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR embora se considerar o cronograma estipulado em sua EAP deveria estar EM ATRASO.

REPORT DO GERENTE: O gerente anterior e atual gerente não efetuaram nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



47.68%

PROJETO:

PARALISADO

Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm da Silva Barbosa Miranda
PROCESSO SEI	00053-00067499/2017-21

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Projetos	Estudos sondagem e topografia do terreno	CONCLUÍDA	9/1/2012	10/31/2012
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	6/18/2014	12/8/2016
	Pedido de Execução de Serviços (PES)- Envio	CONCLUÍDA	4/7/2017	4/10/2017
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	9/14/2017	9/14/2017
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Processo Licitatório	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	9/15/2017	6/27/2019
	Edital de Licitação RDC 01/2019 - Publicação	CONCLUÍDA	6/28/2019	6/28/2019
	Republicação de Edital RDC 01/2019	CONCLUÍDA	10/3/2019	10/3/2019
	Fracasso de Licitação	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	1/9/2020	1/9/2020
	Edital RDC 01/2019 - Nova abertura	CONCLUÍDA	1/21/2020	1/21/2020
	Ata de sessão pública	CONCLUÍDA	2/11/2020	2/11/2020
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/5/2020	3/5/2020
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020
	Comissão Executora - Designação	CONCLUÍDA	4/1/2020	4/1/2020
Execução da Obra	Emissão de Ordem de Serviço	CONCLUÍDA	4/20/2020	4/22/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/22/2020	4/22/2020
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CONCLUÍDA	6/19/2020	7/13/2020
	SERVIÇOS PRELIMINARES	EM ANDAMENTO	7/22/2020	2/29/2024
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	EM ANDAMENTO	8/21/2020	11/30/2023
	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	EM ANDAMENTO	9/23/2020	2/29/2024
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	EM ANDAMENTO	10/27/2020	1/31/2024
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	EM ANDAMENTO	12/10/2020	2/29/2024
	GARAGEM A	EM ANDAMENTO	1/1/2021	1/31/2024



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra	GARAGEM B	EM ANDAMENTO	2/1/2021	1/31/2024
	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ATRASADA	3/1/2021	2/29/2024
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	EM ANDAMENTO	4/1/2021	2/29/2024
	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	EM ANDAMENTO	5/1/2021	2/29/2024
	EQUIPAMENTOS	ATRASADA	10/1/2021	2/29/2024
Projetos complementares de engenharia	Projeto elétrico	CONCLUÍDA	6/14/2020	7/24/2020
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	3/1/2024	4/19/2024
	Definitivo	A INICIAR	3/26/2024	6/26/2025
	Habite-se	A INICIAR	6/27/2024	8/30/2024

ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (7/4/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✗
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

04/07/2023

Dados de Oficialização do Projeto: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

Dados do Gerente Atual: 2º Ten. QOBM/Compl. Rafael Rodrigues Martins de Barros publicado no BG N.º 111/2023 em substituição à MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

Dados de Execução do Projeto: Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto encontra-se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 00053-00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA para reinício, para tanto deve ser concluída a análise dos pedidos de aditivos.

Report do Gerente: A gerente do projeto fez seu último report por parte do Gerente foi realizado em 13/02/2023 em que informa que a obra segue paralisada desde 13/04/2021.

Análise do Supervisor: Projeto paralizado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão logo sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.

Status do Projeto: O projeto apresenta o status PARALISADO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Criação da Fundação 193

OBJETIVO ESTRATÉGICO	03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	03.01 Implantar a fundação de apoio ao CBMDF
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb JEANN
PROCESSO SEI	00053-00055486/2022-76

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Realização de Benchmarking com corporações que implementaram fundações similares	Pesquisa dos CBMs que possuem fundações similares	CONCLUÍDA	3/10/2022	3/24/2022
	Captação de informações sobre a criação e funcionamento dessas fundações	CONCLUÍDA	3/25/2022	4/22/2022
	Visita técnica a locais de referência	CONCLUÍDA	4/25/2022	5/16/2022
Definição do melhor modelo para o CBMDF	Definição do melhor modelo para o CBMDF	CONCLUÍDA	5/17/2022	6/21/2022
Criação de proposta de formalização da Fundação de apoio ao CBMDF	Criação de proposta de formalização da Fundação de apoio ao CBMDF	CONCLUÍDA	6/22/2022	8/24/2022
Formalização da criação de Fundação de apoio ao CBMDF	Formalização da criação de Fundação de apoio ao CBMDF	CONCLUÍDA	8/25/2022	9/30/2022
Lançamento oficial da Fundação de apoio ao CBMDF	Lançamento oficial da Fundação de apoio ao CBMDF	CONCLUÍDA	10/3/2022	12/6/2022

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (4/26/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		✓	Reports atualizados		✓
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA		 NÃO APURADO		

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Criação da Fundação 193 inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 03.01. Implantar a fundação de apoio ao CBMDF.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRM. PTTC Jeann Wilson Aguiar Cavalcante, nomeado por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Como todas as atividades constantes na EAP foram executadas, o projeto encontra-se concluído, sem ressalvas.

Status do projeto: concluído.



0.00%

PROJETO:

ATRASADO

Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho
SETOR RESPONSÁVEL	CEABM
GERENTE RESPONSÁVEL	1º TEN QOBM/Compl DAYSYANE
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Constituição de Comissão para realização dos trabalhos	Constituição de Comissão para realização dos trabalhos	ATRASADA	5/8/2023	5/26/2023
Estudo das normas e regulamentos relacionados à qualidade de vida no trabalho	Estudo das normas e regulamentos relacionados à qualidade de vida no trabalho	ATRASADA	5/29/2023	6/9/2023
Desenvolvimento de Minuta de Política de QVT com base nos normativos	Desenvolvimento de Minuta de Política de QVT com base nos normativos	ATRASADA	6/7/2023	6/30/2023
Aprovação e publicação da Política de QVT pelas autoridades competentes	Aprovação e publicação da Política de QVT pelas autoridades competentes	ATRASADA	7/3/2023	7/14/2023
Compilação dos dados das ações/atividades existentes sobre QVT	Compilação dos dados das ações/atividades existentes sobre QVT	ATRASADA	7/17/2023	9/1/2023
Desenvolvimento de Minuta de Programa de QVT	Desenvolvimento de Minuta de Programa de QVT	ATRASADA	9/4/2023	10/6/2023
Aprovação e publicação do Programa de QVT	Aprovação e publicação do Programa de QVT	ATRASADA	10/9/2023	10/27/2023

ADESÃO À METODOLOGIA


75.00%
(10/10/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral dentro do GPWEB em 08/05/2023. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Julia Fagundes Queiroz Schirmer.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente, que não efetuou nenhuma informação complementar.

REPORT DO GERENTE: O gerente atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em atraso.

STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ATRASO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO	05. Aperfeiçoar a gestão
INICIATIVA ESTRATÉGICA	05.02 Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Publicação do PLANES 2017-2024 no Boletim Geral	Publicação do PLANES 2017-2024 no Boletim Geral	CONCLUÍDA	4/1/2017	5/2/2017
Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos nos cursos de formação, especialização e preparatório para oficiais da Corporação	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAO adm	CONCLUÍDA	7/25/2017	8/16/2018
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CHO	CONCLUÍDA	3/22/2018	4/29/2018
	Elaboração de videoaulas de Gerenciamento de Projetos	CONCLUÍDA	4/1/2018	12/10/2020
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CAEO	CONCLUÍDA	6/20/2018	4/17/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CFO	CONCLUÍDA	2/3/2020	4/14/2023
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos para o CAO combatente	CONCLUÍDA	12/10/2020	9/6/2021
	Elaboração de videoaulas de Gestão de Riscos	CONCLUÍDA	2/1/2021	6/30/2021
	Elaboração de videoaula de Gestão de Processos	CONCLUÍDA	3/1/2021	3/12/2021
	Elaboração e publicação de videoaulas a respeito das boas práticas de Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/20/2021	12/19/2022
	Elaboração de videoaulas de Estratégia	CONCLUÍDA	6/21/2021	7/10/2021
	Divulgação das Boas Práticas de Governança e Gestão de Riscos no CPO	CONCLUÍDA	3/23/2022	3/21/2023
Implantação da Governança no CBMDF	Publicação da Portaria de Criação do Comitê Interno de Governança	CONCLUÍDA	5/1/2019	5/29/2019
	Atualizações da Portaria de Criação do Comitê Interno de Governança	CONCLUÍDA	5/28/2019	7/31/2020
	Realização das reuniões do Comitê Interno de Governança	CONCLUÍDA	2/3/2020	4/28/2023
Divulgação das boas Práticas de Governança e Gestão do site do CBMDF	Publicação das atas das reuniões de Gestão de Riscos e Governança em BG e no Site do CBMDF	CONCLUÍDA	7/5/2019	4/20/2023
	Produzir a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	4/30/2021	5/5/2021
	Enviar para a DITIC a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/6/2021	5/7/2021
	Publicar no SITE a estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	5/8/2021	5/14/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Divulgação das boas Práticas de Governança e Gestão do site do CBMDF	Fazer upload de documentos na estrutura da ABA Governança e Gestão	CONCLUÍDA	7/1/2021	7/13/2021
Realização de palestras e publicação de livro a respeito das boas práticas de governança e Gestão de Riscos	Capacitação em gerenciamento de projetos conforme as boas práticas do PMBOK para o Estado-Maior-Geral (EMG)	CONCLUÍDA	3/9/2020	3/12/2020
	Publicação de um livro institucional com boas práticas de Governança e Gestão	CONCLUÍDA	3/3/2021	7/13/2021
	Boas Práticas de Gestão de Riscos no CBMDF - Palestra CGDF	CONCLUÍDA	5/11/2021	6/9/2021
	Gestão de Riscos Corporativos - 1º Simpósio de Prevenção à Fraude e à Corrupção - SSPDF	CONCLUÍDA	7/5/2021	8/31/2021
	Boas práticas de gestão de riscos implementadas no Corpo de Bombeiros Militar - Fundação Hemocentro	CONCLUÍDA	7/16/2021	8/18/2021
	Webinar de Boas Práticas sobre Empreendedorismo Social e Inovação da LIGABOM - Palestra 1 - CBMDF	CONCLUÍDA	1/31/2022	2/21/2022
	Palestras de capacitação em BI para CBMBA	CONCLUÍDA	4/3/2023	4/6/2023
Implantação da Gestão de Riscos no CBMDF	Publicação da Política de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	6/12/2019	7/31/2019
	Publicação da portaria de Criação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	6/12/2019	7/31/2019
	Atualização da portaria de Criação do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	7/9/2019	8/25/2020
	Atualização da Política de Gestão de Riscos do CBMDF	CONCLUÍDA	7/10/2019	12/10/2021
	Realização das reuniões do Comitê de Gestão de Riscos	CONCLUÍDA	9/2/2019	4/19/2023
	Implantação da GR no DEALF	CONCLUÍDA	9/12/2019	12/30/2019
	Implantação da GR no DESEG	CONCLUÍDA	3/8/2021	8/6/2021
	Implantação da GR na DITIC	CONCLUÍDA	8/23/2021	12/31/2021
	Implantação da GR no DERHU	CONCLUÍDA	2/4/2022	12/28/2022
	Implantação da GR no DEPCT	CONCLUÍDA	1/19/2023	4/19/2023

ADESÃO À METODOLOGIA


100.00%
(5/2/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



02/05/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 5.2) Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do BG 048, de 10 de março de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa deve se tornar uma constante, assim o presente projeto se transforma em processos testados e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Para a efetiva implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa deve-se tornar uma constante a execução de processos relacionados ao aprimoramento da maturidade institucional no tema e solidificação na cultura organizacional da Corporação.

Status do projeto: concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementar a Política de Saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	DERHU
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Méd Friedman
PROCESSO SEI	00053-00066636/2022-77

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Confecção da política de Saúde	Identificação das áreas impactadas pela política	CONCLUÍDA	4/28/2022	5/25/2022
	Levantamento das melhores evidências em prevenção em Saúde	CONCLUÍDA	5/25/2022	6/14/2022
	Redação da minuta da política de Saúde	CONCLUÍDA	6/14/2022	6/28/2022
Publicação da política de Saúde	Aprovação da minuta	CONCLUÍDA	6/29/2022	7/28/2022
	Envio para publicação	CONCLUÍDA	7/29/2022	8/29/2022
Implementação de ações baseadas nas diretrizes da política de Saúde	Projeto piloto multidisciplinar de prevenção em saúde aos militares da ativa no 17ºGBM	CONCLUÍDA	8/30/2022	11/25/2022
	Produção do relatório do projeto piloto	CONCLUÍDA	11/28/2022	12/28/2022

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(8/22/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	—

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Implementar a Política de Segurança contra Incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
SETOR RESPONSÁVEL	DESEG
GERENTE RESPONSÁVEL	CEL QOBM/Comb ROGÉRIO DUTRA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Aprovação e Publicação	Análise da ASJUR	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Análise da Seleg	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Publicação	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
Resposta à demanda do Chefe do Departamento	DIEAP	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	DINVI	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	DIVIS	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
Validação das propostas	Apresentação	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Correção	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023
	Redação da Minuta	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/8/2023

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(6/14/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Publicação da Portaria da PTTC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo
SETOR RESPONSÁVEL	EMG
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Compl LEANDRO CHAVES
PROCESSO SEI	00053-00023582/2023-36

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Instituição do Grupo de Trabalho	Instituição do Grupo de Trabalho	CONCLUÍDA	1/31/2023	3/14/2023
Minuta da Portaria	Minuta da Portaria	CONCLUÍDA	2/1/2023	4/4/2023
Análise da SELEG/EMG	Análise da SELEG/EMG	CONCLUÍDA	4/5/2023	5/19/2023
Análise e aprovação da ASJUR	Análise e aprovação da ASJUR	CONCLUÍDA	5/22/2023	6/16/2023
Publicação da nova Portaria	Publicação da nova Portaria	CONCLUÍDA	6/19/2023	6/30/2023

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(7/5/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Publicação da Portaria da PTTC, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.02: Implementar a Política de Pessoal Inativo.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM Compl. Leandro Chaves da Silva Batista, nomeado por meio do BG 110, de 14 de junho de 2023

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto foi concluído dentro do prazo estabelecido no cronograma.

Status do projeto: concluído.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO	09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	09.01 Implementar a Política de Saúde
SETOR RESPONSÁVEL	DIGEP
GERENTE RESPONSÁVEL	MAJ QOBM/Comb Carolina de Lima Rick de Oliveira
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Definição do quantitativo de militares da área da saúde a serem convocados	Definição do quantitativo de militares da área da saúde a serem convocados	CONCLUÍDA	4/25/2023	4/28/2023
Publicação no DODF da convocação para entrega de documentos	Publicação no DODF da convocação para entrega de documentos	CONCLUÍDA	5/2/2023	5/5/2023
Inserção dos dados dos novos militares no GECOPE por meio do INOVA	Inserção dos dados dos novos militares no GECOPE por meio do INOVA	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/31/2023
Recebimento da documentação dos candidatos	Recebimento da documentação dos candidatos	CONCLUÍDA	5/8/2023	5/31/2023
Publicação em DODF da incorporação no CBMDF	Publicação em DODF da incorporação no CBMDF	CONCLUÍDA	6/1/2023	6/27/2023

ADESÃO À METODOLOGIA
100.00%
(7/5/2023)

ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
Custo estimado	—	Reports atualizados	✓

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO
-----	-----	---------------	-------------

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.01: Implementar a Política de Saúde.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM/Comb. Ana Carolina de Lima Rick de Oliveira, nomeada por meio do BG 111, de 14 de junho de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se em andamento, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: As etapas concluídas.

Status do projeto: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.



100.00%

PROJETO:

CONCLUÍDO

Realizar eventos técnico-científicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	10.03 Realizar eventos técnico-científicos
SETOR RESPONSÁVEL	GPCIU
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb Leal
PROCESSO SEI	N/A

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Palestra técnica com os concludentes do 9º Curso de Operações em Incêndio	Palestra técnica com os concludentes do 9º Curso de Operações em Incêndio	CONCLUÍDA	8/8/2022	8/8/2022
Palestra sobre incêndios em veículos e painéis fotovoltaicos	Palestra sobre incêndios em veículos e painéis fotovoltaicos	CONCLUÍDA	10/18/2022	10/18/2022
Seminário de prevenção e combate a incêndio urbano - estudos de caso	Seminário de prevenção e combate a incêndio urbano - estudos de caso	CONCLUÍDA	10/24/2022	10/24/2022
Seminário de combate a incêndio em veículos elétricos, veículos elétricos híbridos e painéis fotovoltaicos	Seminário de combate a incêndio em veículos elétricos, veículos elétricos híbridos e painéis fotovoltaicos	CONCLUÍDA	12/7/2022	12/7/2022
Estudo de caso - Incêndio na Boate Kiss	Estudo de caso - Incêndio na Boate Kiss	CONCLUÍDA	5/31/2023	5/31/2023

ADESÃO À METODOLOGIA

 100.00% (5/11/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		—	Reports atualizados		✓
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA  NÃO APURADO						

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/06/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar eventos técnico-científicos, por meio de sua publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 10.03: Realizar eventos técnico-científicos.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Paulo Fernando Leal de Holanda Cavalcanti, nomeado por meio do BG 048, de 10 de março de 2023.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report que trata da Palestra realizada no Auditório da ABMIL sobre a Investigação de incêndio da boate Kiss. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.

REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto conforme datas previstas no cronograma.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas foram concluídas no prazo estabelecido no cronograma. Este projeto não exauriu a necessidade de novos eventos na temática, ele foi apenas um esforço temporário para criar uma cultura de promoção a eventos relacionados à temática técnico-científica

Status do projeto: Concluído.



82.82%

PROJETO:**ATRASADO****Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas
SETOR RESPONSÁVEL	SUCOP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/Comb MUNIZ DA SILVA
PROCESSO SEI	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Estabelecer competências mínimas necessárias para o serviço de tele-atendimento e despacho	Definir competências	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/23/2018
	Definir perfil do atendente e do despachante	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/21/2018
	Estabelecer prioridades	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/16/2018
	Levantar das necessidades de atendimento e despacho	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/12/2018
Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.	Estabelecer um padrão de acesso à internet nas OBM's para perfeito funcionamento do SGO.	CONCLUÍDA	4/23/2018	5/23/2018
Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para a DINVI	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o COMOP	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GAEPH	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento e quais aplicativos serão carregados para o GPRAM	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
Instalar terminais embarcados nas VTRs operacionais	Avaliar se os equipamentos possuem sistema operacional apropriado e instalado para funcionamento	CONCLUÍDA	5/2/2018	7/20/2018
	Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Incorporar na carga do CBMDF os terminais	ATRASADA	5/9/2018	10/19/2018
	Levantamento dos equipamentos disponíveis junto ao COMOP	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/18/2018
	Verificar junto ao COMOP quais viaturas receberão os equipamentos	CONCLUÍDA	5/9/2018	5/18/2018



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Instalar terminais embarcados nas VTRs operacionais	Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação	ATRASADA	5/25/2018	12/20/2018
Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso institucional	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso da DINVI	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do COMOP	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GAEPH	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Avaliar se os equipamentos estão habilitados para uso do GPRAM	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
Avaliar junto ao COMOP a viabilidade e a forma de fixação dos equipamentos nas viaturas	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura da DINVI para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GAEPH para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do GPRAM para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
	Verificar a viabilidade de manter o equipamento conectado a viatura do COMOP para carga do Tablet	CONCLUÍDA	5/9/2018	6/29/2018
Revisar os protocolos de acionamento, atendimento e despacho de ocorrências	Levantar demandas com interessados	CONCLUÍDA	5/15/2018	6/4/2018
	Conhecer os protocolos em vigor	CONCLUÍDA	5/30/2018	5/30/2018
	Processar as mudanças necessárias	CONCLUÍDA	6/5/2018	6/19/2018
	Validar os novos protocolos	CONCLUÍDA	6/19/2018	7/23/2018
Aplicar a classificação de ocorrências operacionais	Validar no Alto Comando a Classificação Existente	CONCLUÍDA	5/15/2018	5/18/2018
	Alimentar o Sistema com as Classificações validadas	CONCLUÍDA	5/21/2018	5/25/2018
	Teste de programação	CONCLUÍDA	5/28/2018	8/21/2018
Aprovar projeto pedagógico de capacitação e avaliação periódica dos tele-atendentes e despachantes	Aprovar projeto pedagógico	CONCLUÍDA	5/23/2018	7/6/2018
	Definir instrução de comunicação	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/8/2018
	Definir instrução de telefonia	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/1/2018
	Definir instrução para atendimento 193	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/22/2018
	Definir instrução para o sistema Fênix	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/22/2018
	Definir instrução para Rádio Comunicador operacional	CONCLUÍDA	5/23/2018	6/29/2018
Levantar quais os meios necessários para que o equipamento se comunique com o sistema da Corporação	Prover os meios necessários para a comunicação do sistema	ATRASADA	5/25/2018	10/1/2018
	Efetuar os testes de conectividade	ATRASADA	10/1/2018	12/20/2018
	Entrega dos equipamentos 100% funcionais	ATRASADA	10/19/2018	10/19/2018
Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP	Implantar a gestão dos tele-atendentes e dos processos de atendimento e despacho, por meio de um órgão subordinado ao COMOP	CONCLUÍDA	8/21/2018	9/20/2018



ADESÃO À METODOLOGIA

 60.00% (10/10/2023)	ITEM		STATUS	ITEM		STATUS
	Existe Gerente		✓	Existe TAP		✓
	Existe EAP		✓	PLASE publicado		—
	Custo estimado		!	Reports atualizados		✗
✓ SIM		✗ NÃO		— NÃO SE APLICA		! NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084/18 e retirado do rol de projetos estratégicos a serem executados pelo BG 56, de 24 de março de 2021. Contudo o referido projeto foi reativado por meio de publicação em BG n.º 111/2022.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Igor Muniz da Silva em BG n.º 110/2023 em substituição ao TC QOBM/Comb. Abrahão Medeiros de Alencar.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Apesar do referido projeto ter sido reativado, o mesmo encontrasse com status EM ATRASO.

REPORT DO GERENTE: Falta de reports atualizados por parte do gerente.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Desde a troca de gerente, o referido projeto não sofreu atualizações.

STATUS DO PROJETO: Apesar do referido projeto ter sido reativado, o mesmo encontrasse com status EM ATRASO.



52.89%

PROJETO:**ATRASADO****Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - Gama**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	TEN CEL QOBM/RRm RISSEL
PROCESSO SEI	00053-00044902/2020-49

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	5/26/2020	1/9/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/26/2020	5/26/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/26/2020	8/4/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/26/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/29/2020	5/29/2020
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/29/2020	8/6/2021
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	8/19/2020	10/27/2021
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/29/2020	10/27/2021
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/25/2020	4/20/2022
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/30/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	7/2/2020	7/18/2020
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	7/18/2020	8/2/2020
	Correções As Built	CONCLUÍDA	8/2/2020	8/16/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	7/3/2020	2/14/2021
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	7/4/2020	2/17/2021
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/8/2020	8/16/2020
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	7/4/2020	7/18/2021
	2.2 - SDG - Sondagem	ATRASADA	6/18/2021	10/17/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/2/2020	8/16/2020
	2.1 - TOP - Topografia	ATRASADA	7/4/2020	7/18/2021
	2.3 - Concessionárias	ATRASADA	8/18/2021	11/17/2021
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/4/2020	2/17/2022
4 - EP - Estudo Preliminar	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	8/23/2020	9/23/2020
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	10/8/2020	10/9/2020
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	10/9/2020	10/24/2020
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/24/2020	10/28/2020
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/22/2022
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/25/2020	1/23/2022
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	9/4/2020	4/20/2022
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ATRASADA	2/19/2021	2/17/2022
	INC - Incêndio	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	INF - Infraestrutura	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	MEC - Instalações Mecânicas	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	HID - Intalações Hidráulicas e Sanitárias	ATRASADA	7/21/2021	12/19/2021
	ELE - Instalações Elétricas	ATRASADA	7/21/2021	4/6/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
7 - PE - Projeto Executivo	EST - Estrutura	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	FND - Fundações	ATRASADA	10/20/2021	1/9/2022
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	ATRASADA	11/24/2021	1/2/2022
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	ATRASADA	1/2/2022	1/16/2022
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	ATRASADA	1/3/2022	2/17/2022
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	ATRASADA	1/4/2022	2/17/2022
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	ATRASADA	1/5/2022	2/17/2022
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	ATRASADA	1/16/2022	2/6/2022
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	Pavimentação	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	ATRASADA	7/21/2021	12/18/2021
	SAN - Instalações Sanitárias	ATRASADA	7/21/2021	11/11/2021
	IMP - Impermeabilização	ATRASADA	10/20/2021	12/19/2021
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	ATRASADA	7/21/2021	2/17/2022
	ARC - Ar Condicionado	ATRASADA	7/21/2021	12/19/2021
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	ATRASADA	7/21/2021	1/30/2022
	Estrutura Metálica	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/3/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/3/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	1/2/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/2/2022	1/16/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/16/2022	1/30/2022
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/17/2021	11/17/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	1/9/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	1/9/2022	1/23/2022
	Memoriais	ATRASADA	2/2/2022	2/9/2022
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	ATRASADA	7/21/2021	2/9/2022
	SON - Sonorização e CFTV	ATRASADA	7/21/2021	1/19/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE - Instalações Elétricas	ELE -Sistema Elétrico	ATRASADA	10/23/2021	4/6/2022
6 - PL - Projeto Legal	6.5 - CEB	ATRASADA	9/19/2021	2/17/2022
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	SPDA	ATRASADA	9/23/2021	2/17/2022
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	10/2/2021	11/2/2021
	Pagamento	CONCLUÍDA	11/2/2021	12/2/2021
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	12/2/2021	12/7/2021
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	8/15/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	8/15/2021	10/16/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/16/2021	11/5/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	11/5/2021	11/20/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	11/20/2021	12/4/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/4/2021	12/19/2021
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/1/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/1/2021	10/10/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/31/2021	10/31/2021
FND - Fundações	Lançamento do sistema	ATRASADA	10/20/2021	10/27/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/27/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/1/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/1/2021	12/18/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/18/2021	12/26/2021
	Memoriais	ATRASADA	12/26/2021	1/9/2022
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	7/21/2021	8/18/2021
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	8/18/2021	10/10/2021
	Detalhamento	ATRASADA	10/10/2021	10/17/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	10/17/2021	10/31/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	10/31/2021	12/18/2021
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	2/19/2021	12/15/2021
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	10/23/2021	11/8/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ARQ - Arquitetura	Detalhamentos	CONCLUÍDA	12/15/2021	1/2/2022
	Quantitativos	CONCLUÍDA	1/2/2022	1/16/2022
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	1/16/2022	1/23/2022
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	1/23/2022	2/10/2022
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	2/19/2021	2/10/2022
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	7/21/2021	2/17/2022
	PAI - Paisagismo	ATRASADA	11/7/2021	11/17/2021
	Comunicação Visual	ATRASADA	11/17/2021	2/17/2022
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	ATRASADA	7/21/2021	10/17/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	10/17/2021	11/17/2021
	Detalhamento	ATRASADA	11/17/2021	12/18/2021
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	12/18/2021	12/29/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	12/29/2021	1/16/2022
	Memoriais	ATRASADA	1/16/2022	1/19/2022
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/24/2021	5/6/2022
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	5/7/2022	5/8/2022
	Acompanhamento do processo	ATRASADA	5/8/2022	10/29/2022
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	ATRASADA	10/20/2021	11/17/2021
	Quantitativo	ATRASADA	11/17/2021	12/5/2021
	Caderno de Especificações	ATRASADA	12/5/2021	12/19/2021
SPDA	Dimensionamento SPDA	ATRASADA	9/23/2021	12/23/2021
	Caderno de especificações	ATRASADA	9/29/2021	2/17/2022
	Quantitativo	ATRASADA	12/23/2021	2/17/2022
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	ATRASADA	5/19/2021	4/13/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	2/10/2022	4/13/2022
	Quantitativo	ATRASADA	2/10/2022	4/13/2022
ELE -Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	ATRASADA	10/23/2021	11/11/2021
	Lançamento do sistema	ATRASADA	11/4/2021	12/18/2021
	Dimensionamento do projeto	ATRASADA	12/18/2021	2/21/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
ELE -Sistema Elétrico	Detalhamento	ATRASADA	2/21/2022	3/7/2022
	Quantitativo do projeto	ATRASADA	3/7/2022	3/22/2022
	Caderno de especificações	ATRASADA	3/22/2022	3/30/2022
	Memoriais	ATRASADA	3/30/2022	4/6/2022
Emissão do alvará de construção	Emissão do alvará de construção	PARALIZADA	5/6/2022	8/1/2022
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	ATRASADA	5/7/2022	6/6/2022
	Projeto Básico	ATRASADA	6/6/2022	6/11/2022
	Projeto Básico - Aprovação	ATRASADA	6/8/2022	6/8/2022
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	ATRASADA	6/28/2022	6/28/2022
	Edital	ATRASADA	7/2/2022	7/2/2022
	Definição da modalidade de licitação	ATRASADA	7/6/2022	7/6/2022
	Aprovação do setor jurídico	ATRASADA	7/24/2022	7/24/2022
	Edital - Publicação	ATRASADA	8/3/2022	8/3/2022
	Julgamento das propostas	ATRASADA	9/3/2022	9/3/2022
	Adjudicação do vencedor da licitação	ATRASADA	9/5/2022	9/5/2022
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	ATRASADA	9/13/2022	9/13/2022
	Comissão Executora - Publicação	ATRASADA	9/23/2022	9/24/2022
	Alvará de Construção - Emissão	ATRASADA	9/25/2022	9/25/2022
	Ordem de serviço inicial	ATRASADA	9/27/2022	9/27/2022
Instalações Hidrossanitarias	Água Fria	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Água Quente	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Alimentação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Esgoto	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Pluvial - EPAMS	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Pluvial - PVC R	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ventilação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Cabeamento Estruturado e CFTV	Cabos e acessórios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Instalações Elétricas	Cabos e fios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Eletrocalhas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Eletrodutos e acessórios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Iluminação externa	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Luminarias	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Muro medição e muro QGBT	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Instalações Elétricas	Quadros elétricos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Subestação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Tomadas e interruptores	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Serviços preliminares	Adequação do edifício do SERHU	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Canterio de obras	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Locação de obra	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Equipamentos	CFTV	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Climatização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Elétrico	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fotovoltaico	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Rack e acessórios	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Sonorização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Execução da obra	Serviços preliminares	CONCLUÍDA	9/30/2022	5/30/2023
	Alvenaria e Revestimento	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Área externa - diversos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Áreas Molhadas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Bacia e Valeta	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Cabeamento Estruturado e CFTV	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Cobertura e Telhamento	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Demolição	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Diversos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Drenagem Pluvial	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Equipamentos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Estruturas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fachadas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Guarita	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Impermeabilização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Incêndio	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Instalações Elétricas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Instalações Hidrossanitárias	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Limpeza da obra	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Pavimentação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Pisos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da obra	Poço de treinamento	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Portas e Esquadrias	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Quadra Poliesportiva	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Sonorização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	SPDA	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Teto e forro	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Escadas e Rampas	Escada fachada frontal	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Escada fachada sul	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Rampa fachada frontal	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Estruturas	Academia	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ampliação da Garagem	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ampliação do Pavimento 1	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Cobertura Metálica - ampliação pavimento 1	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Depósito e garagem	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Ensaio Tecnológicos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Escadas e Rampas	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fachada frontal	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Fundação	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Garagem	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Laje Pavimento 1	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
	Reforço de pilares	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Guarita	Guarita	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Impermeabilização	Impermeabilização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Incêndio	Incendio	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Serviços auxiliares e administrativos	Serviços administrativos	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Sonorização	Sonorização	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
SPDA	Spda	ATRASADA	8/28/2023	8/28/2023
Recebimento da obra	Recebimento provisório	ATRASADA	10/5/2023	11/4/2023
	Recebimento definitivo	A INICIAR	2/4/2024	3/6/2024
	Habite-se	A INICIAR	3/6/2024	5/7/2024



ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (10/10/2023)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
✓ SIM	✗ NÃO	— NÃO SE APLICA	! NÃO APURADO	

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb e aprovado pelo Comandante-Geral, publicado no BG 137, de 23/07/20. O projeto consta na relação de projetos estratégicos publicados desde o BG n.º 195/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição do MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO por falta de reports por parte do gerente atual, que não efetuou nenhum report.

REPORT DO GERENTE: Em 07/04/2022, a ex-gerente de projeto, MAJ. Isa Paula Correa Guimaraes, fez seu último report no GPWeb informando que o projeto básico havia sido corrigido e encaminhado para licitação. O atual gerente não efetuou nenhum report.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto atrasado por falta de reports, porém em estado avançado de execução. STATUS: o projeto apresenta o status ATRASADO.



53.13%

PROJETO:

PARALISADO

Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro Militar - Vila Planalto

OBJETIVO ESTRATÉGICO	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
INICIATIVA ESTRATÉGICA	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
SETOR RESPONSÁVEL	COMAP
GERENTE RESPONSÁVEL	CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA
PROCESSO SEI	00053-00092407/2017-41

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1- EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	CONCLUÍDA	1/5/2016	12/19/2017
PB - Projeto Básico	PB - Projeto Básico	CONCLUÍDA	12/26/2017	11/16/2018
Processo Licitatório	Processo Licitatório	CONCLUÍDA	6/12/2019	4/6/2020
Execução da Obra	Publicação da Comissão Executora de Contrato	CONCLUÍDA	4/27/2020	4/28/2020
	Emissão da Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	4/28/2020	4/30/2020
	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	5/8/2020	5/8/2020
	Execução dos Serviços	PARALIZADA	6/9/2020	10/3/2025
	Mobilização da Empresa	CONCLUÍDA	6/29/2020	6/29/2020
	Desmobilização	A INICIAR	10/3/2025	11/17/2025
Execução dos Serviços	1ª Medição	CONCLUÍDA	6/9/2020	7/8/2020
	2ª Medição	CONCLUÍDA	7/8/2020	8/6/2020
	3ª Medição	CONCLUÍDA	8/6/2020	9/4/2020
	4ª Medição	CONCLUÍDA	9/4/2020	10/7/2020
	5ª Medição	CONCLUÍDA	11/7/2020	12/7/2020
	6ª Medição	CONCLUÍDA	12/7/2020	1/8/2021
	7ª Medição	CONCLUÍDA	1/8/2021	2/8/2021
	8ª Medição	CONCLUÍDA	2/8/2021	3/11/2021
	9ª Medição	CONCLUÍDA	3/11/2021	4/12/2021
	10ª Medição	CONCLUÍDA	4/12/2021	5/13/2021
	11ª Medição	CONCLUÍDA	5/13/2021	6/14/2021
	12ª Medição	CONCLUÍDA	6/14/2021	7/14/2021
	13ª Medição	CONCLUÍDA	7/14/2021	8/12/2021
	14ª Medição	CONCLUÍDA	8/12/2021	9/14/2021
	15ª Medição	CONCLUÍDA	9/14/2021	10/15/2021
	16ª Medição	CONCLUÍDA	10/15/2021	11/17/2021



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução dos Serviços	17ª Medição	CONCLUÍDA	11/17/2021	12/17/2021
	18ª Medição	PARALIZADA	12/17/2024	1/17/2025
	19ª Medição	A INICIAR	1/17/2025	2/20/2025
	20ª Medição	A INICIAR	2/20/2025	3/24/2025
	21ª Medição	A INICIAR	3/24/2025	4/25/2025
	22ª Medição	A INICIAR	4/25/2025	5/29/2025
	23ª Medição	A INICIAR	5/29/2025	7/1/2025
	24ª Medição	A INICIAR	7/1/2025	7/31/2025
	25ª Medição	A INICIAR	7/31/2025	9/2/2025
	26ª Medição	A INICIAR	9/2/2025	10/3/2025
Desembolso Físico Financeiro	Desembolso Físico Financeiro	EM ANDAMENTO	6/9/2020	11/17/2025
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	7/27/2020	3/12/2022
Recebimento	Recebimento Definitivo	A INICIAR	11/17/2025	3/25/2026
	Recebimento Provisório	A INICIAR	11/17/2025	12/18/2025
Processo de Habite-se	Processo de Habite-se	A INICIAR	11/17/2025	1/20/2026



80.00%
(7/4/2023)

ITEM	STATUS
Existe Gerente	✓
Existe EAP	✓
Custo estimado	✓

ITEM	STATUS
Existe TAP	✓
PLASE publicado	—
Reports atualizados	✗



SIM



NÃO



NÃO SE APLICA



NÃO APURADO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO



04/07/2023

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 084, de 6 de maio de 2020, com entrega para 2021 conforme os BGs 195, de 16 de outubro de 2020 e 228, de 8 de dezembro de 2020 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília". O projeto está relacionado à iniciativa 1.5 do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira nomeado por meio do BG n.º 111/2023 em substituição da MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação de TAP publicada no BG 084, de 6 de maio de 2020, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado conforme cronograma e o último report.

REPORT DO GERENTE: Último Report da gerente anterior data de 14/02/2023 que Informa que a obra encontrasse paralisada por abandono da empresa diante da recusa de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro pelo CBMDF.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: A obra encontra-se paralisada em função das tentativas frustradas de reequilíbrio orçamentário.

Status do projeto: ATRASADO.
